



农业农村投资项目管理平台 国家重大项目库 操作培训

<<<<<<

农业农村部工程建设服务中心 丁保祥 2026年4月 重庆
电话：(010) 59193982、15910852612 (微信同号)



▶ 目录

第一部分 平台概述

第二部分 建设单位操作

第三部分 省级主管部门操作



目录

第一部分 平台概述

1 功能概述

2 平台用户

3 业务流程


4 平台登录

01.功能概述


实现农业建设项目全生命周期管理



02.平台用户

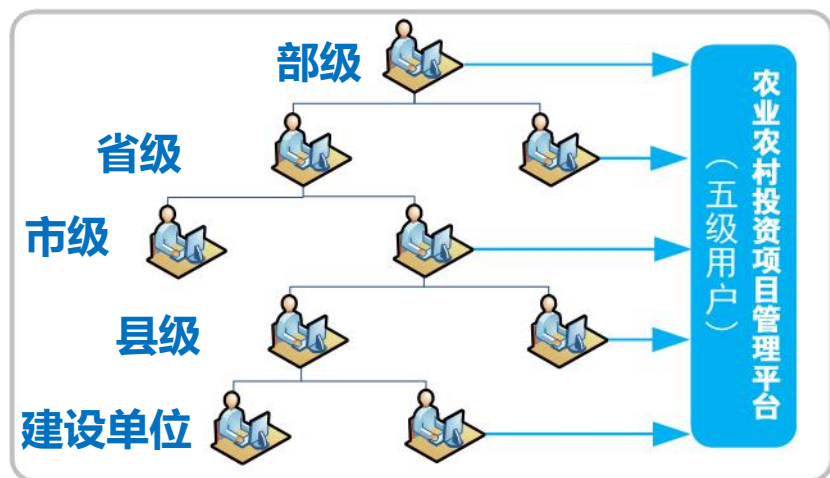

弹性的权限管理体系

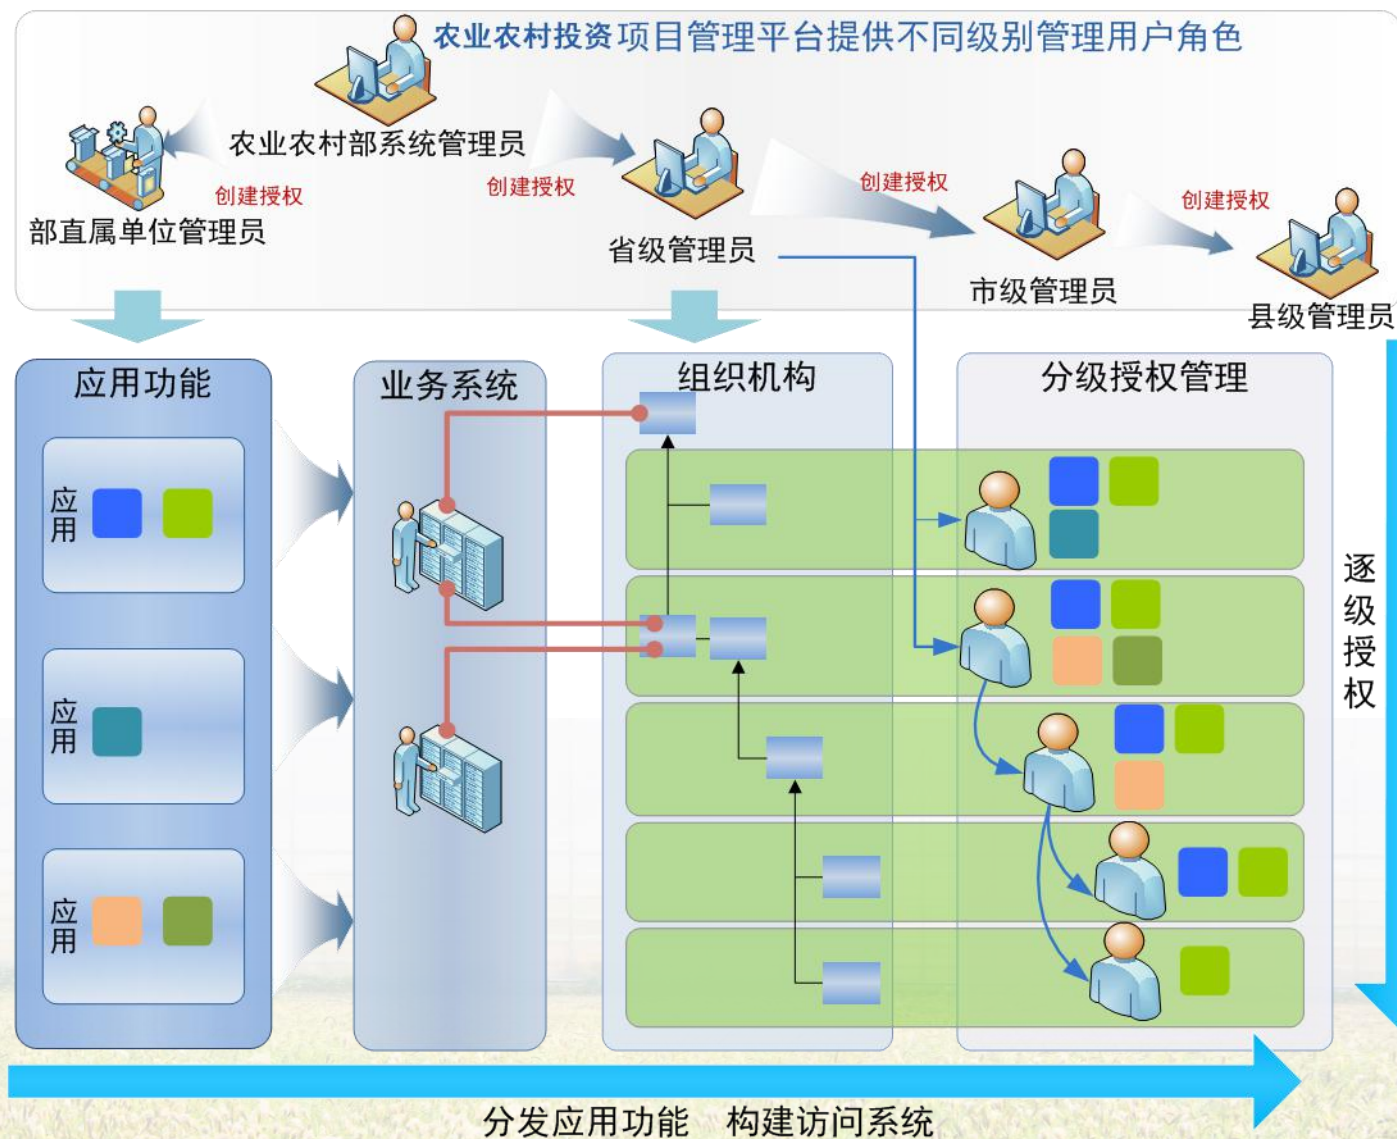


03.业务流程__省、市、县、建设单位各级用户功能说明



03.业务流程__平台项目管理业务流程



农业农村部

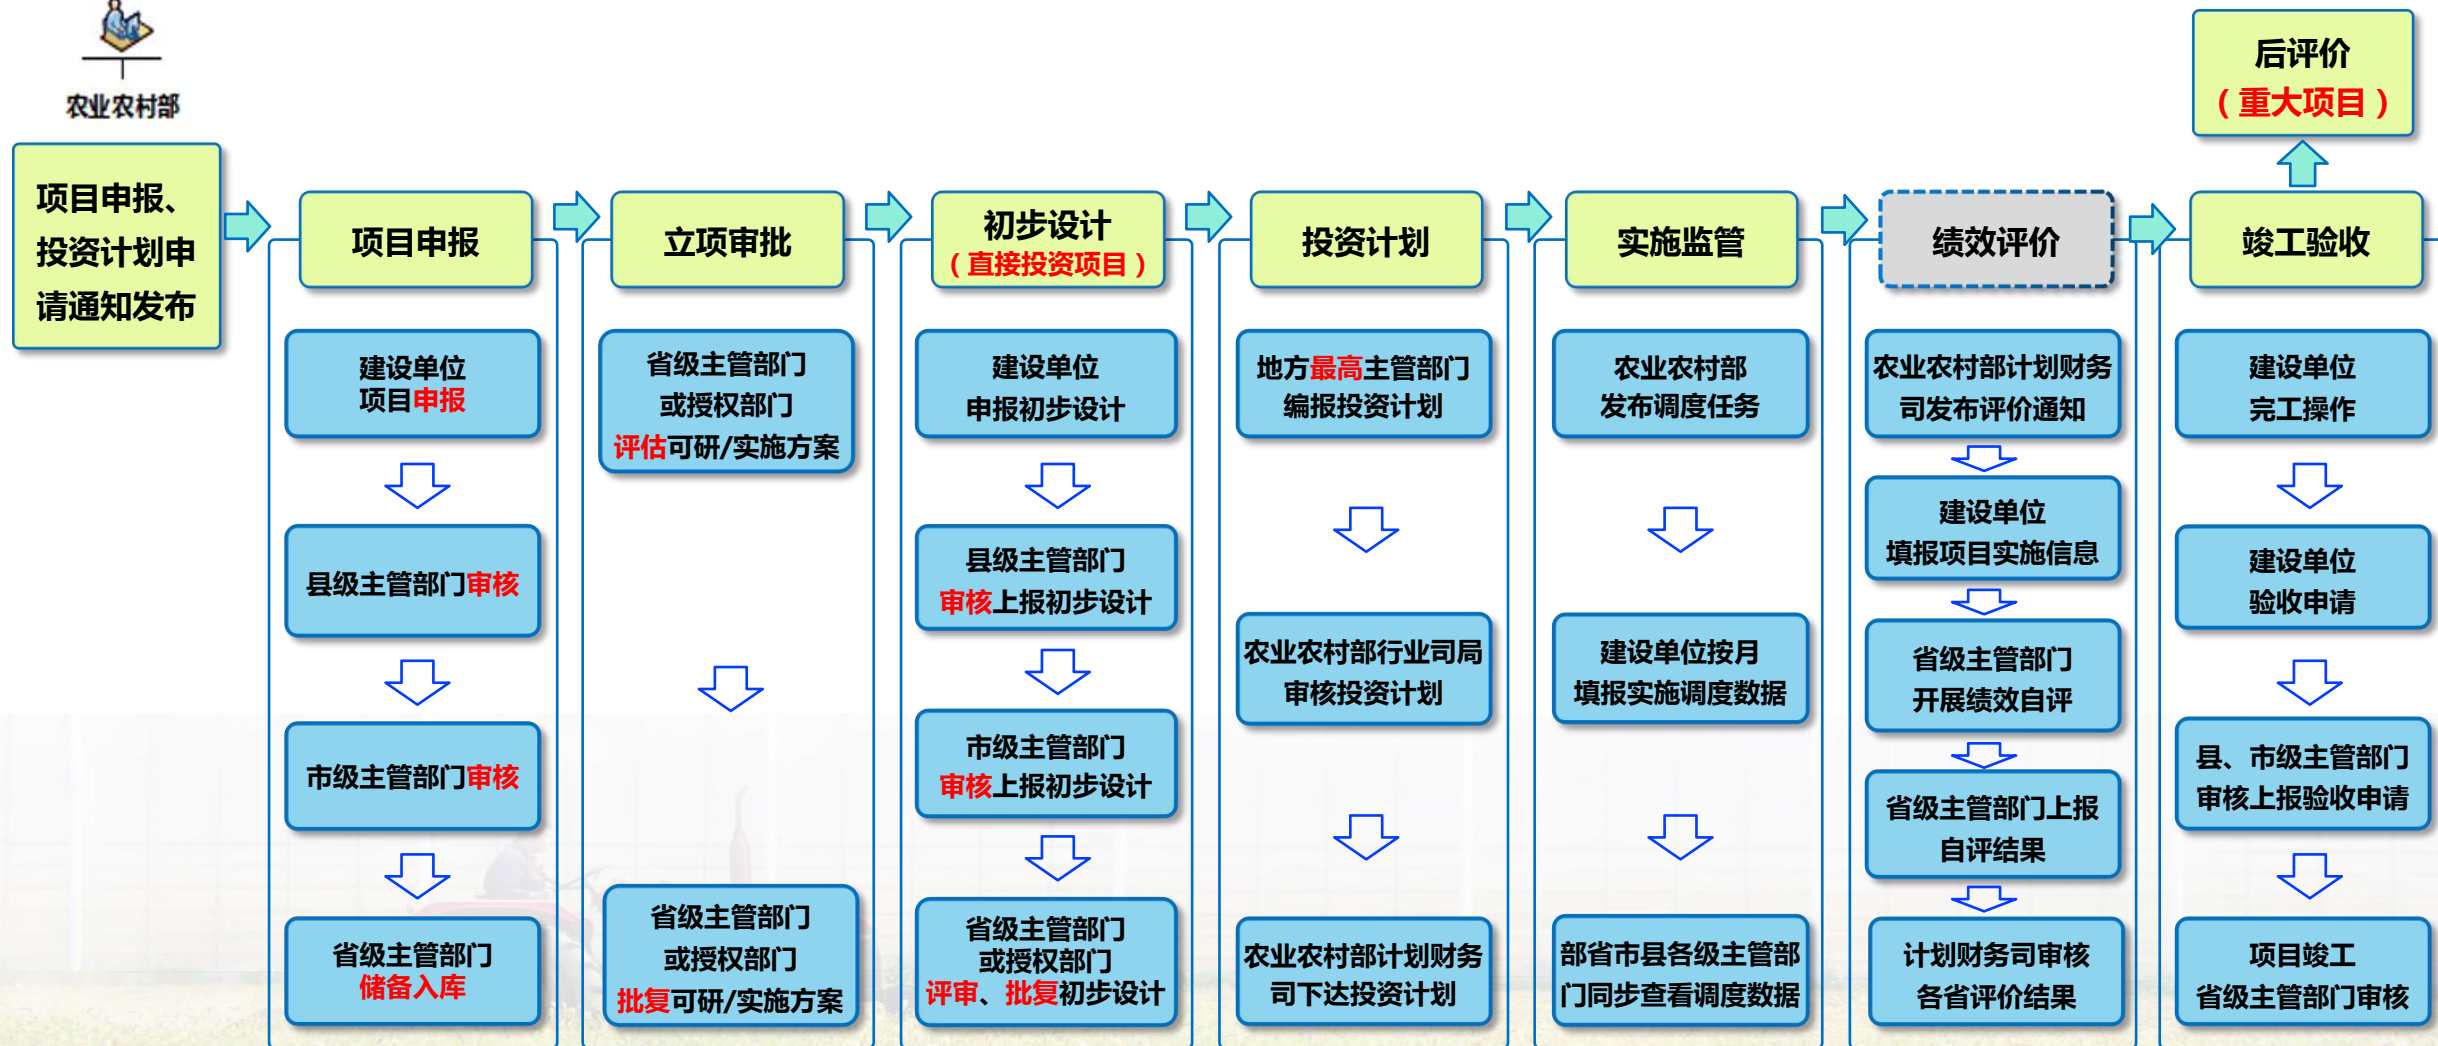

04.平台登录

平台登录网址：<https://acpmp.agri.cn>

用户登录方法

- 1.在登录页面中选择“**中央预算内投资**”，输入用户名和密码；
- 2.填入图形验证码后，点击登录。

说明：部、省、市、县主管部门用户、部直属单位均为平台预设账号用户，不可自行注册。



04.平台登录

在平台登录页面（<https://acpmp.agri.cn>），点击右下角的【找回密码】，输入登录账号、新密码及确认框密码后点击【发送】，填入预留平台的手机号收到的验证码，点击【验证】，新密码设置成功。返回平台登录页面，以新设置的密码登录平台。



04.平台登录_平台用户注册

登录网址：https://acpmp.agri.cn



欢迎使用农业农村投资项目管理平台！

请完善以下信息完成平台用户注册！

*登录账号: *单位名称:

*登录密码: *确认密码:

长度十位以上，需要包含大写字母+小写字母+数字+特殊符号。

*用户类型: *电子邮箱:

用户类型说明：开展项目申报及实施数据填报等...

*手机号: *图形验证码:

*短信验证码:

*所属地区:

详细地址


再次强调：部、省、市、县级主管部门用户是由平台自动分配，不允许自行注册；只允许项目建设单位、咨询设计单位、专家人员自行注册账号。

▶ 目录


第二部分 建设单位操作

- 1 建设单位任务
- 2 项目代码申请
- 3 项目申报
- 4 初步设计申报
- 5 项目实施调度
- 6 项目竣工验收
- 7 国家重大建设项目库

01 建设单位工作任务

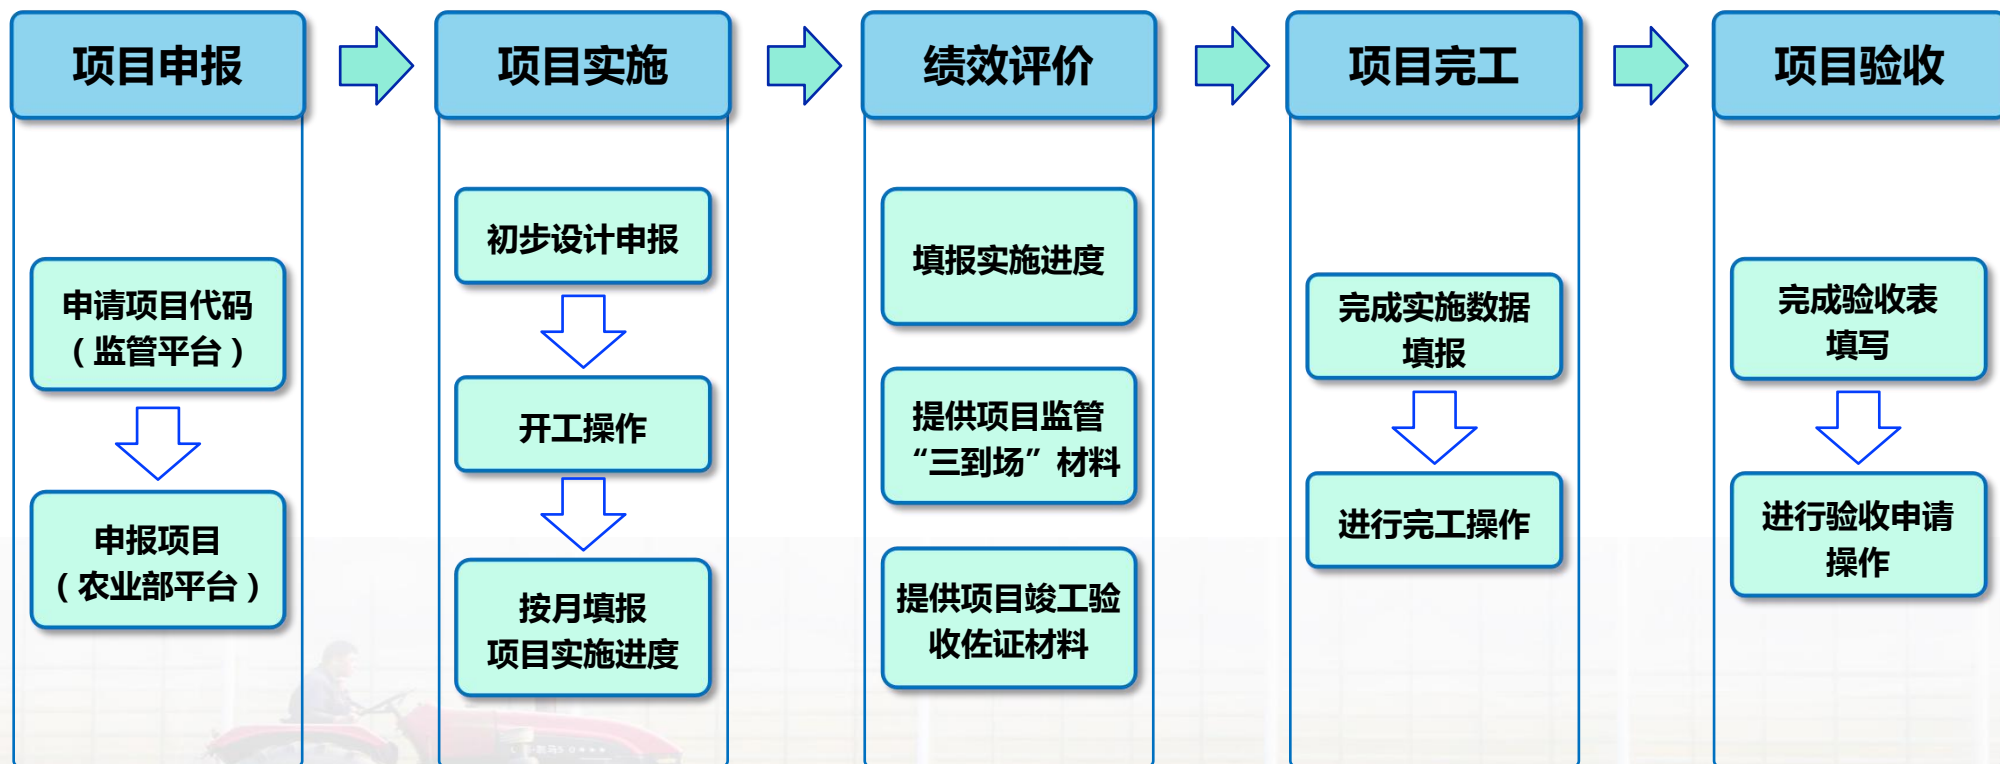

02 项目代码申请 (总体流程)

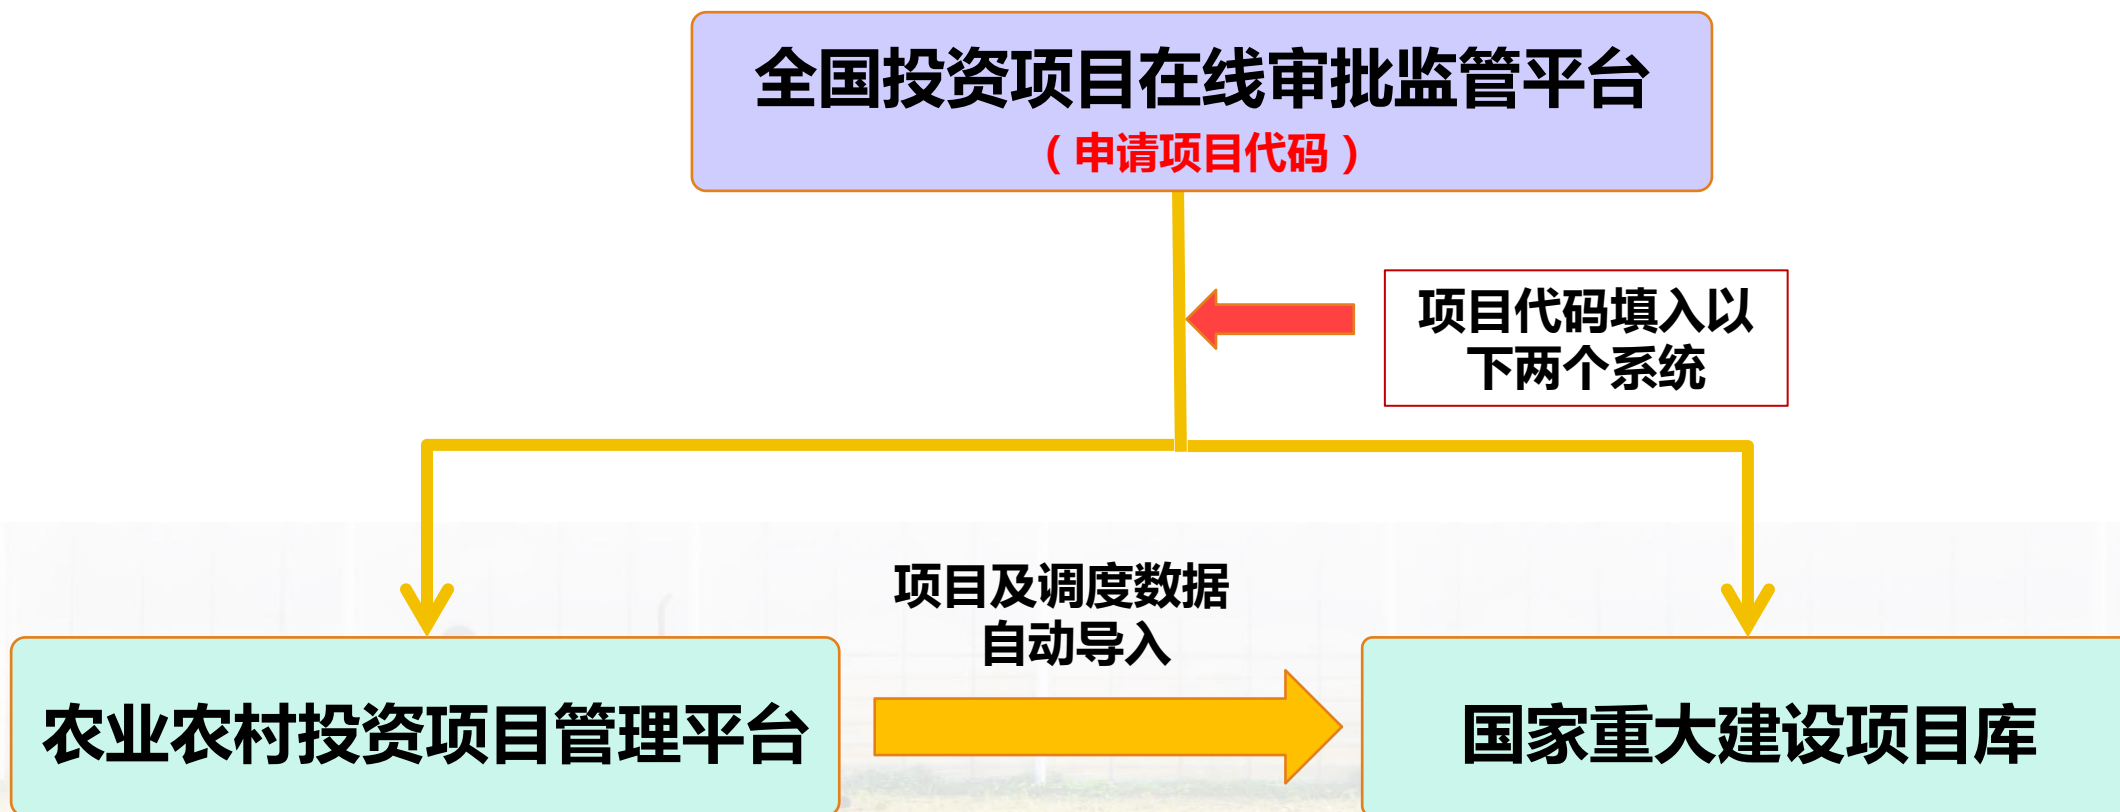

02 项目代码申请 (总体流程)



02 项目代码申请（用户注册）

平台登录网址：<http://www.tzxm.gov.cn>

建设单位申报农业建设项目，需使用单位统一社会信用代码，到【全国投资项目在线审批监管平台】注册用户进行项目代码申请。



02 项目代码申请 (用户注册)

填写注册信息



全国投资项目在线审批监管平台

请输入内容进行搜索



首页

平台动态

办事大厅

公示信息

中介服务 ▼

政策法规

下载专区

登录账号：

* 由字母、数字组成，长度为6-20个字符

登录密码：

* 必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符，长度为8-20个字符

确认密码：

* 再次输入登录密码

单位名称：

* 单位名称

证照类型：

统一社会信用代码

* 证照类型

证照编号：

* 证照编号

联系人姓名：

* 请填写联系人真实姓名，使用简体中文，长度为2-30个字符

电子邮箱：

* 请填写电子邮箱

手机号码：

* 该手机号将与账号绑定，用于登录、找回密码和接收平台消息提醒，请正确填写！

验证码：

图形验证码

2i bk

短信验证码

* 获取短信验证码

注册

02 项目代码申请 (选择申报项目类别)

平台登录网址：<http://www.tzxm.gov.cn>

登录平台，选择申报项目类别：

1. 打开“办事大厅/我要办事”；
2. “全国固定资产投资项目申报入口”中选择“中央项目”，点击“确定进入”。

The screenshot shows the homepage of the 'National Investment Project Online Approval and Supervision Platform'. The header features the national emblem, the platform name, a search bar, and a login/register button. The main navigation bar includes links to 'Home', 'Service Hall' (highlighted with a pink box), 'Related Business Systems', 'Policy Express', 'Publicity', and 'Engineering Consultancy Industry Management'. Below the navigation bar is a '我要办事' (I want to do business) button. The main content area has a large banner for '全国固定资产投资项目申报入口' (National Fixed Asset Investment Project Declaration Entrance). Under this banner, there is a dropdown menu for '您要申报:' (What you want to declare:) with '中央项目' (Central Project) selected (highlighted with a pink box), and a '确定进入' (Confirm Entry) button (also highlighted with a pink box). At the bottom, there are two buttons: '报告建设信息入口' (Report Construction Information Entrance) and '工程咨询单位备案通道' (Engineering Consultancy Unit Filing Channel).

全国投资项目在线审批监管平台

请输入关键词进行搜索

登录/注册

首页 办事大厅 相关业务系统 政策快递 公开公示 工程咨询行业管理

我要办事

全国固定资产投资项目申报入口

您要申报: 中央项目 确定进入

报告建设信息入口

工程咨询单位备案通道

02 项目代码申请 (选择申报项目类别)

右图中选择“申报审批类项目”后，点击“下一步”。
注：中央预算内投资项目属于审批类项目



全国投资项目在线审批监管平台

[首页](#)[办事大厅](#)[相关业务系统](#)[政策快递](#)[公开公示](#)[工程咨询行业管理](#)

投资项目一站式审批、

平台受理、在线办理、限时办结



登录/注册

搜索

申报入口

温馨提示

请确认：

- 1、您所申报的项目属于使用**政府预算资金**进行的新建、扩建、改建技术改造等固定资产投资建设活动，且最终审批机关为**国务院或国务院有关部门**。
- 2、若您的项目已获得项目代码，请点击“我的项目”继续办理。如果尚未获得项目代码，请选择申报类别后点击“下一步”继续申报。
- 3、若您所申报项目的审批机关为省、市、县级有关部门，请前往地方平台办理。

☒ **审批类项目** ☐ 核准类项目 ☐ 备案类项目

下一步

返回

02 项目代码申请 (选择项目审批单位)

首页 >> 办事大厅 >> 我要办事

固定资产投资项目审批

项目审批单位

温馨提示：若您明确所申报的项目目录，请选择下列项目审批单位，进入项目审批入口

外交部	国防部	发展改革委	教育部	科技部
国家民委	公安部	安全部	民政部	司法部
人力资源社会保障部	自然资源部	生态环境部	住房城乡建设部	交通运输部
农业农村部	商务部	文化和旅游部	卫生健康委员会	退役军人事务部
人民银行	审计署	国资委	海关总署	税务总局
国家广播电视总局	体育总局	统计局	国际发展合作署	医疗保障局
港澳办	侨办	台办	新闻办	新华社
社科院	工程院	发展研究中心	气象局	银保监会
行政学院	信访局	粮食和物资储备局	能源局	国防科工局
移民管理局	林草局	铁路局	民航局	邮政局
中医药局	煤矿安监局	外汇局	地震局	知识产权局

右图中项目申报审批单位选择“农业农村部”。

02 项目代码申请 (选择项目类型)

[首页](#) >> [办事大厅](#) >> 我要办事

农业：长江经济带农业面源污染治理

开始申报

农业：长江生物多样性保护工程项目

开始申报

农业：动植物保护能力提升工程

开始申报

农业：农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程

开始申报

农业：农村人居环境整治

开始申报

农业：农垦公用基础设施建设项目

开始申报

农业：全国沿海渔港建设工程项目

开始申报

农业：生猪规模化养殖场建设补助项目

开始申报

农业：现代化海洋牧场建设综合试点项目

开始申报

农业：畜禽粪污资源化利用整县推进项目

开始申报

农业：重点流域农业面源污染治理

开始申报

农业：草原防火基础设施项目

开始申报

农业：高标准农田建设项目

开始申报

农业：农垦社会公益性基础设施项目

开始申报

02 项目代码申请 (开始申报)

此页直接点击[开始申报]，
（“办事指南”相关内容
可后续再做详细了解）

国家现代农业示范区高标准农田建设项目

一、审核备阶段（项目建议书）

实施主体	审批事项	操作
农业部	政府出资的投资项目审批项目建议书（农业部）	办事指南

.....

四、开工、竣工阶段

实施主体	审批事项	操作
环境保护行政主管部门	建设项目（不含核与辐射设施建设项目）竣工环境保护验收审批	办事指南
海洋行政主管部门	海洋工程建设项目环保设施竣工验收（仅涉海项目，需要办理此事项）	办事指南
海洋行政主管部门	填海竣工验收（仅涉海项目，需要办理此事项）	办事指南
交通运输主管部门	通航安全核查	办事指南
水行政主管部门	生产建设项目水土保持设施验收审批	办事指南

☒ 我已认真阅读《国家现代农业示范区高标准农田建设项目》办事指南，并同意遵照以上指南办理项目。

开始申报

重新选择

02 项目代码申请 (第一步: 填写项目信息)

1.填写项目信息	2.填写项目(法人)单位信息	3.填写项目(申报)单位信息	4.填写项目办理情况	5.提交
项目目录:	国家现代农业示范区高标准农田建设项目		选择	
			* 请选择审批目录	
审批单位:	农业部			* 如: 国家发展改革委员会
项目名称:	河北省唐山市高标准农田项目			* 请填写项目名称, 如: *****项目
项目属性:	其他项目		▼	* ? 请选择项目属性
项目阶段:	审核备阶段(可行性研究报告)		▼	请选择项目阶段
建设性质:	新建		▼	*
建设地点:	河北省:唐山市_滦县		选择	
			* 选择项目所在地, 可以跨地域选择项目所在地	
国标行业:	其他农业		选择	* 按照国家统计局发布的国民经济行业分类进行填写, 填写到分类的最后一级
所属行业:	农业		选择	* 选择到分类的最后一级
所属产业结构调整指导目录:	农林业:中低产田综合治理与稳产高产基本农田建设		选择	*
拟开工时间(年):	2019			* 精确到年, 如: 2015
拟建成时间(年):	2020			* 精确到年, 如: 2015
建设规模及内容:	建设高标准农田2000亩			* 填写主要建设规模及内容

02 项目代码申请 (第二步：填写项目(法人)单位信息)

1.填写项目信息

2.填写项目(法人)单位信息

3.填写项目(申报)单位信息

4.填写项目办理情况

5.提交

☒ 本项目法人单位已确定 ☐ 本项目未确定法人单位

项目(法人)单位：

* 项目所属的(法人)单位

证照类型：

统一社会信用代码

*

证照号码：

*

联系人：

姓名

手机号码

电子邮箱

[新增](#) ☐ 接收平台办理进展提醒信息 *

备注：

新增

保存


返回上一步

保存并下一步

注意：带*项为必填项

02 项目代码申请 (第三步：填写项目(申报)单位信息)

注意：第2、3两步均填写项目法人单位信息



项目(申报)单位：

选择

* 申报单位可由法人单位中选择，或直接填写

证照类型：

*

证照号码：

*

联系人：

新增

☐ 接收平台办理进展提醒信息 *

备注：

保存

返回上一步

保存并下一步

02 项目代码申请 (第四步：填写项目办理情况)

1.填写项目信息

2.填写项目(法人)单位信息

3.填写项目(申报)单位信息

4.填写项目办理情况

5.提交

审核备阶段 (可行性研究报告)

指南	实施主体/主管部门	审批（评估）事项	我要办	我已办	情况说明
	国土资源主管部门	建设项目用地预审(不涉及新增用地，在已批准的建设用地范围内进行改扩建的项目，可以不进行用地预审)	 选择办理部门	 上传办理信息	 填写内容
	城乡规划主管部门	省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府城乡规划行政主管部门核发的选址意见书（仅指以划拨方式提供国有土地使用权的项目）	 选择办理部门	 上传办理信息	 填写内容
	海洋行政主管部门	用海预审（仅涉海项目，需要办理此事项）	 选择办理部门	 上传办理信息	 填写内容
	交通运输主管部门	航道通航条件影响评价	 选择办理部门	 上传办理信息	 填写内容
	农业部	政府出资的投资项目审批可行性研究报告（农业部）	 选择办理部门	 上传办理信息	 填写内容



【我要办】

中央

农业部

国家现代农业示范区高标准农田建设项目审批可行性研究报告










第四步：填写项目办理
情况 (此处直接下一步)

02 项目代码申请 (第五步：确认提交)



项目名称	XXX 高标准农田项目
项目目录	国家现代农业示范区高标准农田建设项目

项目办理情况

实施主体			审批事项
农业部			政府出资的投资项目审批可行性研究报告（农业部）
序号	办理状态	地区	审批事项
1	我要办	中央	国家现代农业示范区高标准农田建设项目审批可行性研究报告

验证码	nkng
-----	---------------------------

- ☒ 我已认真阅读办事指南，并将遵照以上指南办理相关手续。
- ☒ 我承诺申报信息与项目真实情况一致，符合国家有关法律法规和产业政策。如信息不实或违反有关规定，自愿接受不良后果并承担相应责任。
- ☒ 我承诺按照国家的法律法规办理项目审批和开工建设相关手续，如有违反自愿将相关记录纳入国家统一信用体系。

上一步 确认提交 打印

第五步
确认提交

02 项目代码申请 (获得代码)



全国投资项目在线审批监管平台

请输入内容进行搜索

[首页](#)[平台动态](#)[办事大厅](#)[公示信息](#)[中介服务](#)[政策法规](#)[下载专区](#)

[首页](#) >> [办事大厅](#) >> [我的项目](#)

项目名称/项目代码：

项目阶段：

查询



用户名：

我的项目

工程咨询单位备案

账号管理

项目名称 (项目类型) 【项目代码】	项目阶段	操作	
项目名称：河北省唐山市高标准农田项目 (审批)	未提交	项目编辑	项目删除
项目名称：农业建设项目管理平台建设项目 (审批) 项目代码：2017-000012-65-01-001962 申报时间：2017/10/20	报建阶段	项目撤销 项目修改 我要办/我已办 情况说明	查询进度 建设信息填报

登记单

审核结果告知单

共 1 页 2条 记录 [首页](#) [上一页](#) [1](#) [下一页](#) [末页](#) 转到第 页 [跳转](#)


五个工作日内，可取得项目代码；

项目代码格式：XXXX-XXXXXX-XX-XX-XXXXXX

02 项目代码申请 (注意事项)

- ◆ 项目建设地点需明确。
- ◆ 需填写项目总投资、中央投资、地方配套资金、企业自有资金、银行贷款等资金来源金额。
- ◆ 建设规模及内容不可过于简单，要包含具体建设内容及工程量、仪器设备购置数量等。
- ◆ 申报单位与项目法人单位信息须相同，均填写项目法人单位信息。
- ◆ 申请页面中必须选择：中央项目、审批类项目。
- ◆ 项目审批单位必须选择：农业农村部。

03 项目申报__ (操作流程)

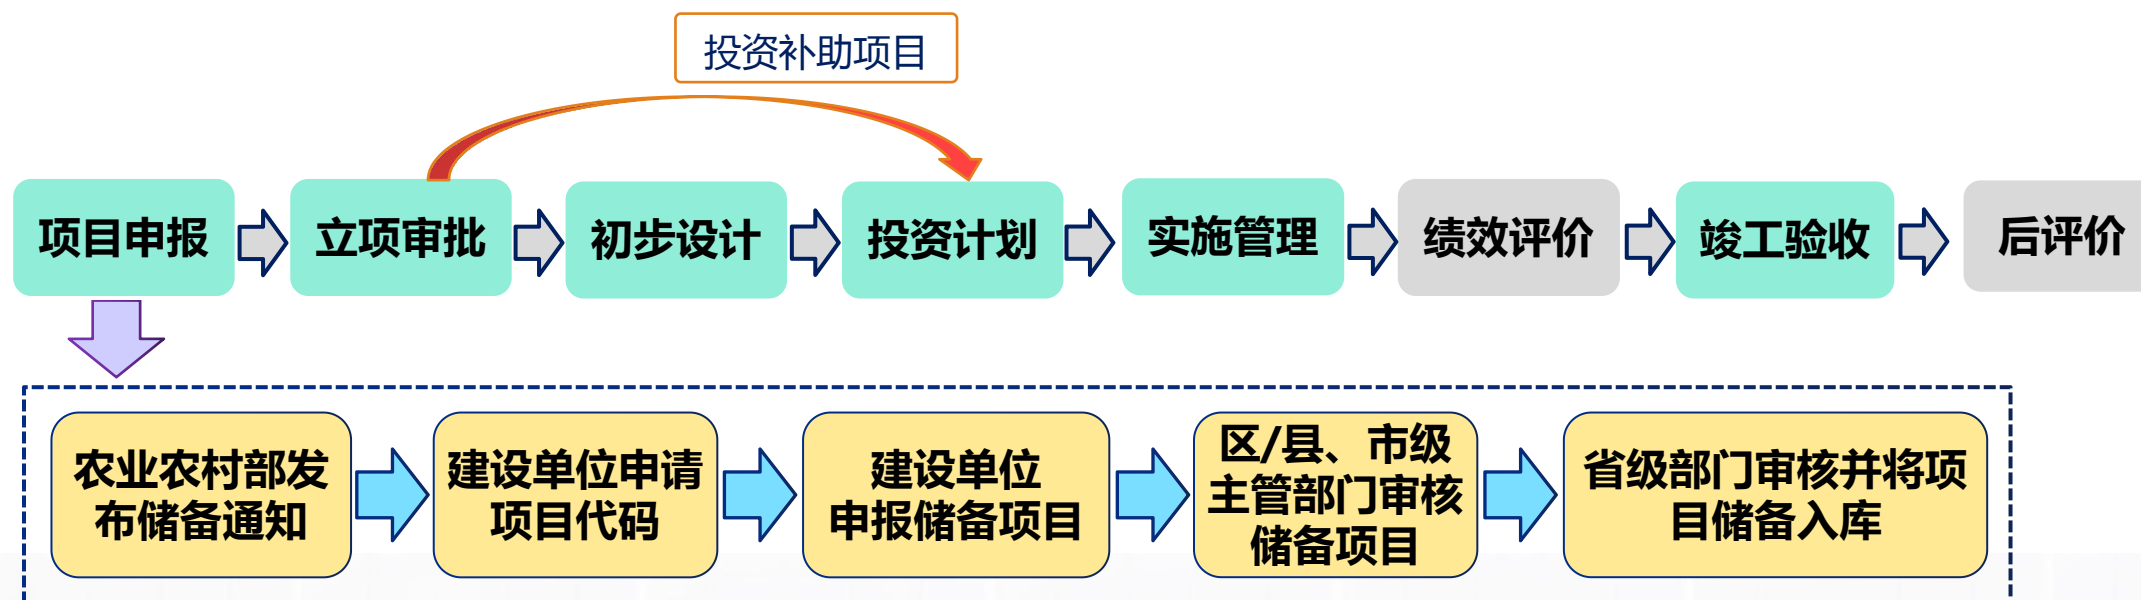

03 项目申报__（建设单位操作要点）

一、总体要求

农业农村部安排的中央预算内投资农业建设项目，须通过农业农村投资项目管理平台完成入库储备、批复立项及投资计划申报。

二、操作要点

步骤1. 建设单位通过“**全国投资项目在线审批监管平台**”申请取得项目代码。

步骤2. 在农业农村投资项目管理平台“储备管理”模块的“储备通知”中，选择项目类型对应的储备通知进行申报；

步骤3. 依次录入项目“基本信息”、“项目建设内容投资一览表”、“项目招标投标事项申请表”、“项目监督管理单位情况表”信息并逐一进行保存；

步骤4. 进行上报操作，告知上级管部门及时审核。

三、项目建设内容投资一览表填写注意事项

1.须按项目可研报告录入项目明细建设内容（内容名称、数量、金额）。

2.项目总投资及投资来源、三年流动计划中的：“中央投资、地方配套资金、企业自有资金、其他”四项资金来源中不允许有小数，建设内容明细中允许有小数。

03 项目申报_建设单位选择项目储备申报通知进行申报

首页

储备管理

统计查询

储备管理

储备通知

未上报

已上报

待完善

通知文号：

通知标题：

发布日期：

截止日期：

查询

重置

第一步：点“申报”按钮

序号	通知标题	通知文号	资金来源	发布时间	截止时间	阅读量	操作
1	2022-2025年病死畜禽无害化收...	无	基本建设资金	2021-07-26	2025-12-31	4084	申报
2	2022-2025年长江生物多样性保...	2022-2025年长江生物多样性保护工程项目储备指南	基本建设资金	2021-07-26	2025-12-31	5072	申报
3	2022-2025年畜禽粪污资源化利...	农计财便函〔2021〕271号	基本建设资金	2021-07-26	2025-12-31	11219	申报
4	2022-2025重点流域农业面源污...	农计财便函〔2021〕271号	基本建设资金	2021-07-26	2025-12-31	7121	申报
5	2022-2025年数字农业农村建设...	农计财便函〔2021〕271号	基本建设资金	2021-07-26	2025-12-31	17953	申报

操作路径：【储备管理】》【储备通知】》【申报】

03 项目申报_建设单位填报储备项目

54 · 59

申报储备项目

20200907储备通知

序号	项目类型	操作
1	动物防疫技术支撑能力建设-陆生	申报储备
2	动物疫病预防控制能力建设-水生	申报储备
3	兽药质量监察能力建设	申报储备
4	动物防疫技术支撑能力建设-水生	申报储备
5	动物疫病预防控制能力建设-陆生	申报储备
6	动物卫生监督能力建设	申报储备
7	动物疫病监测预警能力建设-水生	申报储备
8	动物疫病监测预警能力建设-陆生	申报储备

第二步

选择要申报的项目类型：点击项目类型右侧“申报储备”按钮

操作路径：【储备管理】》【储备通知】》【申报储备】

03 项目申报_建设单位填报储备项目

54 · 59

基本建设资金填报



第三步

保存

项目名称	2020 年度藁城区中央预算内投资高标准农田建设项目		
储备通知名称	20200927储备通知		
专项名称	农业生产发展专项(2020)	项目名称	中央预算内投资高标准农田建设项目
单项名称	中央预算内投资高标准农田建设		
填表人:	河北省石家庄市藁城区农业农村局	填报日期:	2020-09-27

注意：平台首先会自动生成项目名称，如名称不适合，保存后可以重新修改项目名称；保存后，继续填写后续报表信息。

操作路径：【储备管理】》【储备通知】》【申报】》【申报储备】》【保存】

03 项目申报_建设单位填写基本信息表

基本建设资金填报 54 · 51

第四步

1. 基本信息 2. 建设内容 3. 招标投标 4. 监督管理

保存 上报

项目名称	2021年度藁城区中央预算内投资高标准农田建设项目			* 项目代码	[请填写项目代码]		
储备通知名称	20200927储备通知						
专项名称	农业生产发展专项(2020)			项目名称	中央预算内投资高标准农田建设项目		
单项名称	中央预算内投资高标准农田建设						
* 建设单位	河北省石家庄市藁城区农业农村局			* 建设性质	请选择		
* 项目建设地点	藁城区						
* 详细建设地点	[请填写详细建设地点]						
* 建设年限	1 年						
* 主要建设内容及规模	[请填写主要建设内容及规模] 字数控制600字以内						
已输入 0 字, 不可超过600字							
法定代表人							
* 姓名	用户填报			通讯地址	用户填报		
* 手机号	用户填报			电子邮箱	用户填报		
* 上传附件:	浏览上传			可研报告或实施方案(草案)			

注意：一是项目基本信息须完整录入；二是必须上传项目可研报告或实施方案全套电子版；三是项目代码须真实；四是每张报表必须进行保存操作。 **操作路径：**【储备管理】》【储备通知】》【申报】》【保存】

03 项目申报_农业建设项目主要建设内容说明

农业建设项目主要建设内容

- **(1) 农业建筑安装工程。**包括科研用房、实验用房、温室、网室、畜禽圈舍、库房、加工车间等房屋建筑、渔港、畜禽粪污及废弃物处理设施等。
- **(2) 农业田间工程。**主要包括土地整治、排灌设施、机耕道路、晒场、种植圃、田间供电、围栏、防护林网、养殖池塘等。
- **(3) 农机具和仪器设备购置。**主要包括各类农业机械、仪器设备、专用车船购置或建造等。
- **(4) 其他**
- 一个农业建设项目建设内容可以是上前三项内容的组合。

03 项目申报_建设单位填写项目建设内容投资一览表

54 · 57

基本建设资金填报

1.基本信息 2.建设内容 3.招标投标 4.监督管理

保存 上报

项目建设内容投资一览表

一	项目代码							
二	项目名称	2021年度藁城区中央预算内投资高标准农田建设项目						
三	申报单位							
四	申报文件	()						
五	建设性质							
六	建设单位							
七	建设年限							
八	建设地点							
九	详细建设地点							
十	主要建设内容及规模							
十一	* 建设内容	建设形式	规模(数量)	单位	单价(元)	投资估算(万元)		
(1)	建安工程				0	0		添加
1	用户填报	请选择	用户填报	请选择	0	0	①	删除
(2)	田间工程				0	0		添加
1	用户填报	请选择	用户填报	请选择	0	0	①	删除
(3)	仪器设备购置				0	0		添加
1	用户填报		用户填报	请选择	0	0	①	删除
(4)	其他				0	0		添加
4	用户填报		用户填报	请选择	0	0	①	删除

根据可研报告或实施方案内容填写《项目投资内容一览表》！！接下图...

操作路径：【储备管理】》【储备通知】》【申报】

03 项目申报_建设单位填写项目建设内容投资一览表

基本建设资金填报

接上图

十二	工程建设其他费	0.00 万元				添加	
1	建设单位管理费	0 万元				删除	
2	可研编制费	0 万元				删除	
3	招标代理费	0 万元				删除	
4	监管费	0 万元				删除	
十三	预备费	0 万元					
十四	总投资	0	以上数据汇总得	0.00 万元			
十五	资金来源	* 中央预算内投资	0 万元				
		* 地方配套投资/垦区自筹	0 万元				
		自有资金	0 万元				
		其他资金	0 万元				
十六	三年滚动计划	资金来源					
		总投资	中央预算内投资	地方政府投资	项目单位自筹资金	其他资金	
总计							
第一年		0	0	0	0	0	
第二年		0	0	0	0	0	
第三年		0	0	0	0	0	
备注	用户填报						

- 1.根据可研报告或实施方案内容填写《项目投资内容一览表》！！资金来源和三年滚动计划投资额不允许填小数！
- 2.三年滚动计划即建设单位可提出在最长三年时间内，每年希望中央主管部门安排的投资额，可申请一年、两年，最长不超过三年将项目投资安排完，通常申请在一年至两年内安排完项目投资。

操作路径：【储备管理】》【储备通知】》【申报】

03 项目申报_建设单位填写项目招标投标事项申请表

54 · 57

基本建设资金填报

1.基本信息

2.建设内容

3.招标投标

4.监督管理

保存

上报

项目招标投标事项申请表

	招标范围	招标组织形式	招标方式
设计	无	无	无
建安工程	无	无	无
监理	无	无	无
主要设备	无	无	无
重要材料	无	无	无
其他	无	无	无

根据可研或实施方案中的招标方案章节内容填写！！招标方案应符合国家招投标法、政府采购法等规定。操作路径：【储备管理】》【储备通知】》【申报】

03 项目申报_建设单位填写项目监督管理单位情况表

54 · 31

基本建设资金填报

1.基本信息2.建设内容3.招标投标4.监督管理

保存上报

补充所有信息后可上报至上级单位审核

项目监督管理单位情况表

建设单位名称			
项目负责人信息			
* 姓名	* 职务	* 手机号	其他
用户填报	用户填报	用户填报	用户填报
日常监管直接责任单位信息为（项目填报单位上级主管部门）			
* 单位名称	* 监管负责人姓名	* 监管负责人职务	* 监管负责人手机号
河北省石家庄市农业农村局	用户填报	用户填报	用户填报

注意：（1）日常监管直接责任单位不能为项目法人单位！区/县项目日常监管直接责任单位为区/县农业农村局，省厅直属单位项目日常监管直接责任单位为省厅相关行业处室。（2）四张报表信息无误后再上报。

操作路径：【储备管理】》【储备通知】》【申报】

03 项目申报_建设单位用户填报、查看未上报的储备项目

安徽省田特特种
龟鳖有限公司

常见问题

退出登录

农业农村投资项目管理平台 项目库管理模块

首页

储备管理

统计查询

储备管理

储备通知

未上报

已上报

待完善

本级申报

上级退回

通知文号：通知标题：项目类型：项目名称：

查询

重置

序号	项目名称	项目类型	项目单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	通知标题	通知文号	操作
1	2022年无为县高标准...	中央预算内投资高标准...	安徽蓝田特种龟鳖有限...	5525	5525	2022-2...	农计财...	上报 编辑 删除

注:在“未上报”菜单中,可查看未上报的项目或继续填写项目信息;也可上报或删除项目。

操作路径:【储备管理】》【未上报】》【本级申报】

03 项目申报_建设单位查看已上报的储备项目

农业农村投资项目管理平台 项目库管理模块

首页 **储备管理** 统计查询

储备管理
储备通知
未上报
已上报
待完善

通知文号: 通知标题: 项目类型:

项目状态:

本级申报

序号	项目名称	项目类型	项目单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	批复总
1	2022年无为县高标准...	中央预算内投资高标准...	安徽蓝田特种龟鳖有限...	6360	4240	

临西县2019年中央预算内高标准农田建设项目进度查询

常见问题 退出登录

储备报告

储备申报
临西县农业技术推广中心

储备审核
河北省邢台市临西县农业农村局

储备审核
河北省邢台市农业农村局

储备审核
河北省农业农村厅

查询 重置

河1

号	审批类型	操作
	直接投资类	进度查询

注:在“已上报”菜单可查看已上报的项目信息,打开“进度查询”可查看项目在平台中相关程序办理进度情况。至此,建设单位储备项目申报操作介绍完毕!

操作路径:【储备管理】》【已上报】》【本级申报】

03 项目申报_注意事项

项目申报注意事项

①

- 1.要按时在平台中完成储备申报、入库储备、立项批复。
- 2.可研报告或实施方案等相关附件要上传平台。
- 3.填报储备项目信息前，要在国家发展改革委在线监管平台申请项目代码并填入农业农村投资项目管理平台。
- 4.项目法人、日常监管单位名称，项目法人代表、日常监管单位责任人姓名和手机号必须填写，且项目法人代表和项目日常监管责任人、项目法人代表和项目责任人不能为同一人。
- 5.续下投资项目不用重新申报。
- 6.软建设：与项目建设管理配套的相关制度办法；
- 7.解决的问题：从可研/实施方案相关章节摘抄；

②

- 8.民间资本参与情况：选“民间资本未参与”；
- 9.项目建设内容需填写明细情况。
- 10.项目资金来源（中央资金、地方配套资金、自筹资金等）必需正确填写，且不允许有小数。
- 11.项目名称必需规范有辨识度，并与项目申报公文名称一致，如**省**区/县**年***建设项目。
- 12.根据项目申报指南选择正确的项目类型。
- 13.我部下达投资计划后，项目计划如需调整的，应及时与部里主管司局沟通报备，并及时在平台中录入批复调换的项目。

04 初步设计申报_初步设计申报审核流程

初步设计申报审批流程

初设申请

初设评审

初设批复

一、初设申请

- 1.建设单位填报初步设计信息；
- 2.区/县主管部门审核上报地市主管部门；
- 3.地市主管部门审核上报省级主管部门。


二、初设评审

省级主管部门或具有初设批复权限的主管部门评审初步设计。

三、初设批复

省级主管部门或具有初设批复权限的主管部门批复初步设计。

04 初步设计申报_初步设计申报审核流程

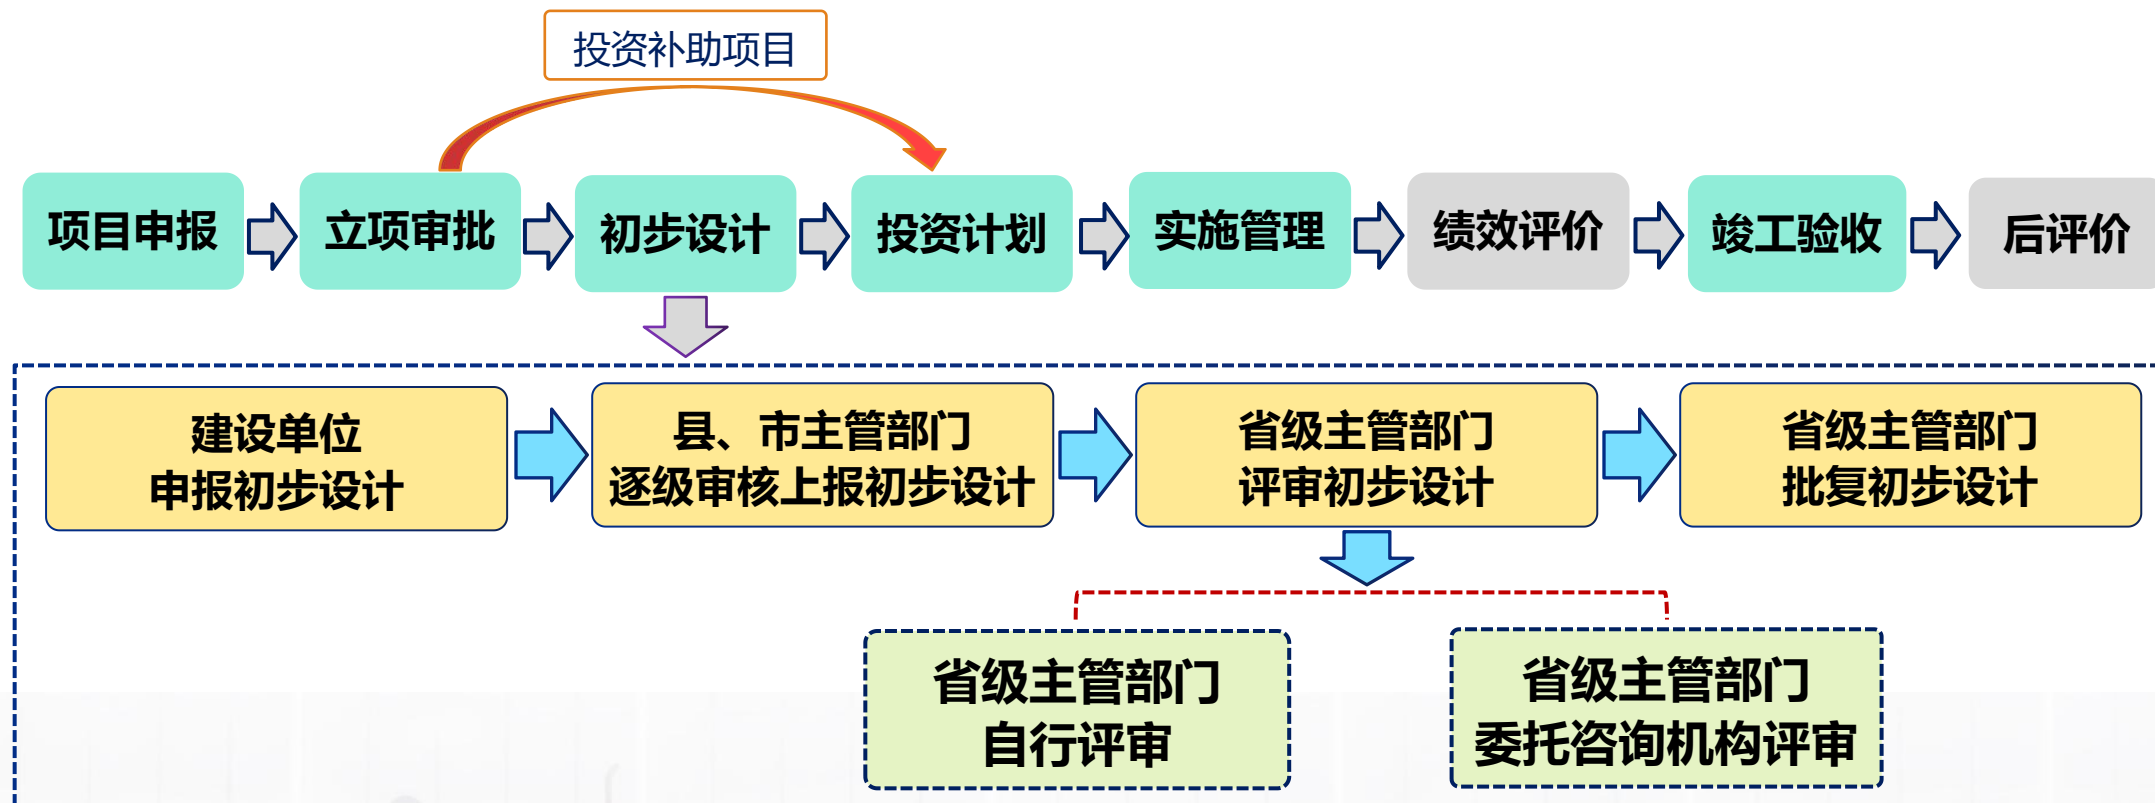

说明：平台中项目初步设计由批复主管部门进行评审和批复，投资补助类项目不需要做初步设计。

如果省级计财处委托行业处室或市级农业农村主管部门批复项目，则系统自动将项目初步设计评审和批复分配给省级主管部门行业处室或市级农业农村主管部门来完成！

04 初步设计申报_建设单位申报初设

农业农村投资项目管理平台 建设项目管理系统

河北省农林科学院旱作农业研究所 常见问题 退出登录

首页 投资计划 初步设计 项目实施 竣工验收 监督管理 统计查询

初设申报

待上报 已上报

项目类型: 项目名称: 项目主管单位:

查询 重置

全部 批量委托

序号	☐	项目名称	项目类型	发送单位	总投资	中央投资	状态	操作
1	☐	国家土壤质量深州观测实...	农业科技创新能力条件建设项目	河北省农业农村厅	1519.00	1259	项目开工	初设申报

项目在平台中完成立项批复操作后，即可在初步设计模块中填报初步设计。

上图中，点击项目名称右侧“初设申报”按钮，打开初设申报填写页面，详情见下页。

请注意：按现行管理办法规定，直接投资项目才需要填报初步设计，投资补助项目不需要进行初步设计！但2026年通知要求所有中央预算内投资项目均需要进行初步设计。

操作路径：【建设项目】》【初步设计】》【初设申报】

04 初步设计申报_建设单位申报初设

1.基本信息				2.仪器工具	3.总体概算	4.编制单位	保存 提交评审 退返	
项目名称	北碚区长江生物多样性保护工程建设项目			申报编码	2021-500109-016223			
申报文号	1			申报文件名称	1			
申报年份	--			申报指南名称	2021年长江生物多样性保护工程建设项目申报指南			
投资方向	长江生物多样性保护工程建设项目			行业方向	农业绿色发展			
项目类型	渔政执法能力建设			品种类型	--			
建设单位	重庆市北碚区农村委员会							
项目建设地点	重庆市->北碚区							
详细建设地点	重庆市北碚区缙云大道6号							
建设年限	1年			批复建设年限	自投资计划下达之日起1年			
建设内容	采购执法快艇1艘							
建设性质	新建			建设单位是否属于农垦系统	否			
立项年度	2021							
填表人:	重庆市北碚区农业农村委员会			填报日期:	2021-09-10			
上传附件:	选择文件 保存							

在上图中，建设单位在《基本信息》中上传初步设计文件电子版，然后依次填写和保存《仪器工具》《总体概算》和《编制单位》三张表。操作路径：【建设项目】》【初步设计】》【初设申报】

04 初步设计申报_建设单位申报初设

1.基本信息2.仪器工具3.总体概算4.编制单位

保存初设申报

项目仪器及工器具填写表/申报表

序号	名称	申报情况				备注	操作
		功能、参数及规格	数量(台/套)	单价(元)	投资(万元)		
总计			70.00	6128000.00	1208.00		
一	实验室仪器设备		65.00	3368000.00	932.00		添加
1	蒸渗仪	水分溶质运移研	10	500000	500.00	含地下	删除
2	土壤呼吸长期站	长期自动监测土	1	500000	50.00	定位监	删除
3	降水降尘采集站	自动采集保存监	1	110000	11.00	自动监	删除
4	叶面积仪	叶片面积测量	1	230000	23.00	台式	删除
5	农业气象站	监测气象环境参	1	160000	16.00	高精度	删除

在上图中，依次填写和保存《仪器工具》《总体概算》和《编制单位》三张表，信息审核无误后，点击页面右上角“初设申报”按钮，完成上报操作。操作路径：【建设项目】》【初步设计】》【初设申报】

04 初步设计申报_建设单位申报初设

《仪器工具》表应先于《概算申请表》填写！《概算申请表》需读取仪器设备投资额。

初设基本信息申报表

项目名称:	XXX黄河鲤种质资源场建设项目	项目编码:	2016-A2151-150822-C0702-003
项目类型:	水产种质资源场	建设单位:	XXX水产科技有限公司
主管单位:	XXX业厅	详细建设地点:	XXX省XX市XXX县
申报文件:	《关于报送2019年XXX项目可行性研究报告的函》	申报文号:	内农牧计字[2019]16号
建设年限:	2019年6月-2020年9月（这里要明确到具体年份，从某年到某年）		

1、填写《初设基本信息申报表》

XXX建设项目农机具及仪器设备申报表

序号	名称	申报情况	数量 (台/套)	单价 (元)	投资 (万元)	备注
		功能、参数及规格				
总计			5		1149	
一	实验室仪器设备		5		1149	
1	热带作物生物信息学服务系统	主要用于热带作物生物信息学数据分析。本地KVM迅速切换视频切换系统。管理登陆节点采用2U机架式服务器，双CPU，2.4GHz*2，64GB内存，1TB*3硬盘。高性能计算刀片服务器，双CPU，2.4GHz*2，128GB内存，120GB硬盘。支持20片的刀箱。胖节点服务器1台，并行和发布存储系统各1套，IPMI、管理网路，计算网络1套，配套管理应用软件等。	1	23900000	239	
3	激光捕获显微分离系统	用于单细胞分离、染色体显微切割及分离、细胞及生物材料的显微穿孔，细胞融合、常规显微观察及显微照相。研究级全电动倒置荧光显微镜，采用ICCS光学系统。切割及样品收集组件，355nm紫外固态脉冲激光光源，脉冲能量： $\geq 100 \mu J$ 。软件及图像采集系统，双数码相机采集。显微切割专用电脑工作站，6核处理器，1000GB硬盘，6GB内存，24寸液晶显示器等。	1	29000000	290	
	...					
二	农机具		0		0	
1					0	
三	工艺设备		0		0	
1					0	
四	其它		0		0	
1					0	

2、填写《仪器工具》

04 初步设计申报_建设单位申报初设

3、填写《初步设计概算申请表》 4、编制单位表（略）

初步设计

项目实施

竣工验收

监督管理

统计查询

1.基本信息

2.仪器工具

3.总体概算

4.编制单位

保存


初设申报

初步设计总概算申请表

序号	工程或费用名称	单位	工程量	指标(元)	概算(万元)	备注	操作
总投资					1519.00		
一	建筑安装工程费用				251.00		添加
1	抗旱棚				197.00		添加 删除
(1)	建筑工程	座	1	1970000	197.00		删除
(2)	装饰工程	请选择			0.00		删除
(3)	给排水工程	请选择			0.00		删除
(4)	消防喷淋工程	请选择			0.00		删除
(5)	通风空调工程	请选择			0.00		删除
(6)	采暖工程	请选择			0.00		删除
(7)	电气工程	请选择			0.00		删除

序号	工程或费用名称	单位	工程里	指标(元)	申报概算(万元)	备注
二	田间工程费用				80.33	
1	网围栏	米	4000.00	50.03	20.01	
2	低压线路、防水线	米	4000.00	38.25	15.30	
3	变压器	台(套)	1.00	50000.00	5.00	
4	维修渠道	米	3000.00	100.00	30.00	
5	道路硬化	平方米	2000.00	50.08	10.02	
三	仪器及工器具购置费用				28.70	
四	工程建设其他费用				33.20	
1	建设单位管理费				7.40	
2	项目前期工作咨询费				3.00	
3	工程勘察费				3.00	
4	工程设计费				3.50	
5	环境影响评价报告编制费				5.00	
6	招标代理费				2.30	
7	招投标交易服务费				0.80	
8	工程监理费				2.60	
9	施工图审查费				0.60	
10	建设项目宗地勘测费				5.00	
五	预备费				20.73	
1	基本预备费				20.73	
六	资金来源	总投资			465.00	
		中央预算内投资			465.00	
		地方配套投资			0.00	
		自有资金			0.00	
		其他资金			0.00	
七	建设规模及主要建设内容	一、改建池塘总用地面积：400亩；包括1. 亲鱼池：100亩；2. 后备亲鱼池：60亩；3. 保种池：50亩；4. 隔离检疫池：10亩；5. 苗种培育池：180亩；新建产卵池200平方米，新建实验管理用房200平方米，新建孵化车间1000平方米。二、田间工程：主要包括：网围栏4000米；道路硬化2000平方米；渠道维修3000米；变压器1台及低压线路，防水线4000米三、仪器购置 共70台（批、套、台）				

05 项目实施调度_主要流程

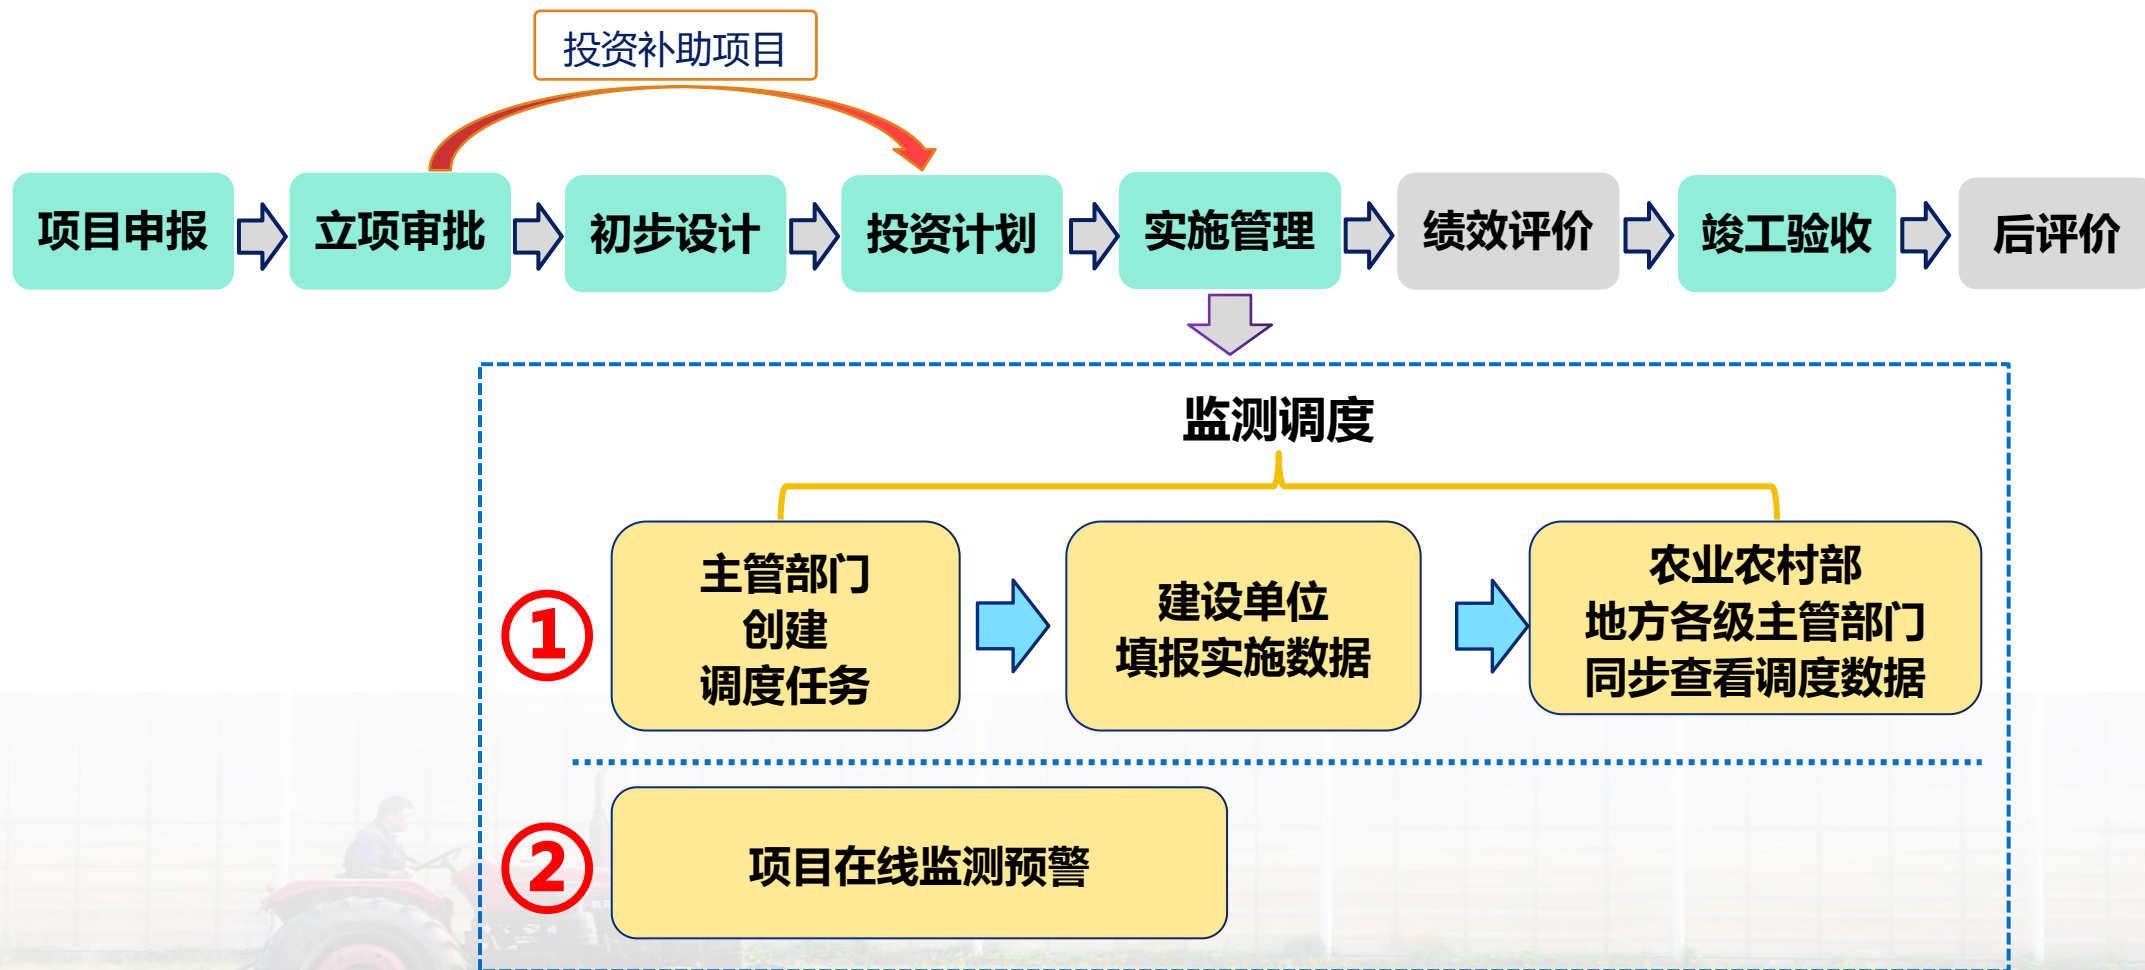

05 实施调度数据报送

建设单位报送实施调度数据

实施调度数据必须使用申报项目的账号才能填报！

首页

初步设计

项目实施

竣工验收

监督管理

统计查询

基建项目

未开工

在建

完工

待验收

已验收

项目类型: 请选择项目类型

项目名称: 项目名称

项目主管单位: 项目主管单位

查询

全部 / 农业农村部 / 华中农业大学

点击“数据填报”按钮填完项目实施管理报表后, 应再回到此页面点击“上报”按钮, 上报本月调度数据!

序号	项目名称	项目类型	发送单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	项目状态	项目信息	进度查询
1	农业农村部马铃薯生物学与生物技术重点实...	专业性/区域性...	农业农村部发展...	1483	1483	完工	数据填报 上报	进度查询
2	蛋制品加工技术集成科研基地建设项目	专业性农业科学...	农业农村部发展...	1400	1400	完工	数据填报 上报	进度查询
3	农业农村部长江中下游农业装备重点实验室...	专业性/区域性...	农业农村部发展...	1679	1679	完工	数据填报 上报	进度查询
4	农业部油菜遗传育种重点实验室建设项目	专业性/区域性...	湖北省农业农村厅	1429	1429	完工	数据填报 上报	进度查询

操作路径：【建设项目】》【项目实施】》点项目名称右侧【数据填报】

1.在上图中，点击项目名称右侧的“数据填报”按钮，进入项目实施调度数据填报页面。

2.填写完实施调度数据后，务必返回此页面，点击“上报”按钮，将实施调度数据上报主管部门。

05 实施调度数据报送——建设单位报送实施调度数据（项目开工操作）

农业农村投资项目管理平台

建设项目管理系统

登出

河北省石家庄市藁...

首页

初步设计

项目实施

竣工验收

监督管理

统计查询

项目信息

项目开工

报建手续

招标管理

合同管理

完成内容

资金管理

建设进度

计划执行

项目完工

项目开工说明

一、点击项目开工按钮

（一）单纯土建安装工程类项目。对需办理施工许可证的项目，取得施工许可证后即可点击项目开工按钮；对不需办理施工许可证的项目，施工合同签订后，即可点击项目开工按钮。

（二）单纯仪器设备采购类项目。签订货物采购合同后，即可点击项目开工按钮。（建设内容为仪器设备、农机具等购置内容的项目）。

（三）综合性项目。含有土建安装工程和仪器设备采购类项目，按上述两项原则，有一项满足开工条件的，即可点击项目开工按钮。

二、完成后续报表填写

（一）点击项目开工按钮后，系统记录项目开工。

（二）项目开工后，要完成报建手续、招标管理、合同管理、完成内容、资金管理、建设进度、计划执行、项目管理等报表填写。其中，完成内容报表、资金管理报表、建设进度报表和计划执行报表要按照项目实施进度，定期更新数据。

（三）项目填报的数据，将会受到上级主管部门的实时调度和统计查询，也会作为项目重点监管、项目现场检查的筛选条件，既要及时更新，也要如实填报。

☒ 我已认真阅读上述说明。

项目开工

操作路径：【建设项目】》【项目实施】》【数据填报】

说明：当项目实际开工时，在项目实施页面中，点按“项目开工”按钮填写开工时间，如开工时间填写有误，建设单位还可以修改。如项目实际已开工，平台中一直未进行开工操作，须尽快进行开工操作。

05 实施调度数据报送——建设单位报送实施调度数据

首页

可研批复

初步设计

投资计划

项目实施

竣工验收

监督管理

统计查询

绩效管理

项目信息

项目开工

报建手续

招标管理

合同管理

完成内容

资金管理

建设进度

计划执行

报建手续

项目编号	2020-130100-007181	主管部门	河北省石家庄市农业农村局	
项目名称	2020年度河北省石家庄市植物有害生物防控能力	建设单位	河北省石家庄市农业农村局	
	填报内容	审批（查）单位	审批（查）文件文号	
1	施工图设计阶段			
2	土地所有证或租地协议			
3	土地规划许可证			
4	工程规划许可证			
5	消防、环保等相关手续			
6	工程施工许可证			
7	其他			

完成开工操作后的项目，实施管理页面如右图所示，可进行项目报建手续、招标管理、合同管理、完成内容、资金管理、建设进度、计划执行等内容的填报。在项目完工并进行完工操作后，须到竣工验收模块进行验收申请操作。

05 实施调度数据报送——建设单位报送实施调度数据（招标管理）

项目信息

项目开工

报建手续

招标管理

合同管理

完成情况

资金管理

建设进度

计划执行

项目管理

文件管理

项目完工

附件上传

招标管理

每招一次标，点击一次“添加”按钮，录入本次招标信息。

添加

保存

填报日期	2022-06-13		
项目编号	2021-130000-013438	主管部门	河北省农业农村厅
项目名称	国家土壤质量深州观测实验站建设项目	建设单位	河北省农林科学院旱作农业研究所

1	招标类别	建安工程	招标文件名称	国家土壤质量深州观测实验站建设项目（-
	招标内容(规模及数量)	抗旱棚 1	招标额度(万元)	196.9
	招标(采购组织形式)	社会代理	招标(采购)方式	公开招标
	邀请招标批准部门	河北省财政厅采购办	代理单位名称	河北天坤招标代理有限公司
	代理单位资质		投标人数量	3
	中标单位名称	河北新征程建筑工程有限公司	中标单位资质	建筑工程施工总承包叁级资质和钢结构工程
	中标金额(万元)	196.79	合同金额(万元)	196.79
	开标时间	2021-11-24	备注	

操作路径：【建设项目】》【项目实施】》【数据填报】（填报项目历次招标信息）

05 实施调度数据报送——建设单位报送实施调度数据（合同管理）

项目信息	合同管理										保存	
项目开工								填报日期:	2022-06-13			
报建手续	项目编号		2021-1300000-013438			主管部门		河北省农业农村厅				
招标管理	项目名称		国家土壤质量深州观测实验站建设项目			建设单位		河北省农林科学院旱作农业研究所				
合同管理	序号	合同类别	合同名称	甲方	乙方	丙方	合同范围	合同期限	签订时间	合同金额（万元）	备注（该招未招未达要求需说明建设内容）	添加
完成情况	1	招	工程施	河	衡		新建		2021	57.80		删除
资金管理	2	招	仪器购	河	河		购置		2021	104		删除
建设进度	3	招	仪器购	河	沈		购置		2021	142.14		删除
计划执行	4	招	仪器购	河	石		购置		2021	79.3		删除
项目管理	5	招	仪器购	河	石		购置		2021	103.56		删除
文件管理	6	招	仪器购	河	西		购置		2021	495.20		删除
项目完工												
附件上传												

操作路径：【建设项目】》【项目实施】》【数据填报】（录入项目全部合同信息）

注：每签订一份合同，点击页面中的“添加”按钮，新增合同信息。

05 实施调度数据报送

建设单位报送实施调度数据（建设内容完成情况对照表）

项目信息	完成内容										保存
项目开工	填报日期	2022-06-13									
报建手续	项目名称	国家土壤质量深州观测实验站建设项目								单位:万元	
招标管理	1、建设内容和资金	可研批复			初设批复		实际完成		备注	操作	
合同管理	(一)建安(土建)工程	规模或数量	单位	投资估算	规模或数量	投资概算	规模或数量	资金支出		添加	
完成情况	小计			39.00		39.00		0.00			
资金管理	样品库(含样品柜)	1	个	15.00							
建设进度	样品室	60	平方米	24.00	85平方米	39.00					
计划执行	(二)田间工程	规模或数量	单位	投资估算	规模或数量	投资概算	规模或数量	资金支出		添加	
项目管理	小计										
文件管理	蒸渗仪	10.00	台(套)	500.00	10套	500.00					
项目完工	灌溉设备改造	1	台(套)	4.00	1套	4.00					
附件上传											

操作路径：【建设项目】》【项目实施】》【数据填报】

注：录入项目批复建设内容和项目实际完成建设内容对照情况信息。

05 实施调度数据报送——建设单位报送实施调度数据（计划执行情况表）

项目信息							
项目开工							
报建手续	投资计划与执行情况表						
招标管理							
合同管理							
完成情况							
资金管理							
建设进度							
计划执行							
项目管理							
文件管理							
项目完工							
附件上传							

投资计划名称	下达年度	项目名称	投资来源	下达金额	到位情况	完成情况
基础能力建设等2021年中央预算内投资补助地方农业项目任务清单（投资计划）和绩效目标的通知	2021	国家土壤质量深州观测实验站建设项目	中央投资	1259	1259	834.0
			地方配套	260	0	0
			自筹资金	0	0	0
			其他	0	0	0

观测实验站建设项目	上年度结转资金	0	上年度结转资金完成情况	0
-----------	---------	---	-------------	---

保存

操作路径：【建设项目】》【项目实施】》【数据填报】

注：1.按项目各年度投资计划下达情况逐项填写计划下达资金到位情况、完成情况和支付情况。

2.《计划执行情况表》非常重要，请务必填写！平台统计项目资金到位、完成情况数据均来自本表！

05 实施调度数据报送——建设单位报送实施调度数据（资金管理情况表）

项目信息	资金管理										保存
项目开工	项目名称	国家土壤质量深州观测实验站建设项目				申报编码	2021-130000-013438				
报建手续	申报主管单位	河北省农业农村厅				建设单位	河北省农林科学院旱作农业研究所				
招标管理	可研批复总投资		可研批复中央资金		可研批复地方资金		可研批复自有资金		可研批复其他资金		
合同管理	初设批复总投资		初设批复中央资金		初设批复地方资金		初设批复自有资金		初设批复其他资金		
完成情况	到位总投资	1259	到位中央资金	1259	到位地方资金	0	到位自有资金	0	到位其他资金	0	
资金管理	支付总投资	834.64	中央资金支付	834.64	地方资金支付	0	自有资金支付	0	其他资金支付	0	
建设进度	已签合同应付未付资金										
计划执行	支付总投资	建设内容			可研批复金额	支付金额		备注		操作	
项目管理	总计				1519.00	835.52				—	
文件管理	一	建安工程费用			39	40.46				—	
项目完工	二	田间工程费用			643	137.75				—	
附件上传	三	仪器设备购置费			781	652.40				—	
	四	其他费用			0	请输入金额				—	

操作路径：【建设项目】》【项目实施】》【数据填报】

注：《资金管理情况表》中的到位资金、支付资金从《计划执行表》中自动读取，故需先填写《计划执行表》。

05 实施调度数据报送

建设单位报送实施调度数据（建设进度表）

项目总体形象进度、存在问题及原因、进度滞后情况等内容务必填写完整，需将项目未开工原因填入“存在问题及主要原因”中。

项目信息

项目开工

报建手续

招标管理

合同管理

完成情况

资金管理

建设进度

计划执行

项目管理

文件管理

项目完工

附件上传

建设进度

填报日期2022-06-13

项目编号2021-130000-013438

主管部门河北省农业农村厅

项目名称国家土壤质量滦州观测实验站建设项目

建设单位河北省农林科学院旱作农业研究所

建设期限2021年7月1日-2021年12月31日

批复时间

批复文号

可研报告2021-06-02

初步设计2021-09-10

建设内容

开工（采购）日期

完工（到账）日期

形象进度描述

操作

一、建安工程

添加

建样品室及维修屋顶

2021-12-10

样品室已签订合同，付首付款；已破土动工。

删除

二、田间工程

添加

总体形象进度描述

报建阶段

工程、设计

预算执行率为55%，其中中央财政经费执行率为66.51%，项目处于建设阶段。

存在问题及主要原因

解决方案

进度滞后情况

保存

05 实施调度数据报送——建设单位报送实施调度数据（项目管理情况表）

项目信息	项目管理				保存
项目开工	项目名称: 国家土壤质量深州观测实验站建设项目				
报建手续	1.设计	初步设计编制单位:	河北中哲工程设计有限公司	资质	乙级
招标管理		设计范围和内容的完整性:			完整
合同管理		初步设计对可研批复的调整是否符合规定:			符合规定
完成情况	2.施工承包	土建工程单位:		资质	
资金管理		田间工程单位:		资质	
建设进度		设备安装单位:		资质	
计划执行		有无工程肢解发包、装包、违法发包问题:			
项目管理	3.建设质量	建筑工程验收评定结果:			
文件管理		田间工程验收评定结果:			
项目完工		设备安装验收结果:			
附件上传		竣工图完成情况:			

操作路径：【建设项目】》【项目实施】》【数据填报】（说明项目实施管理情况）

05 实施调度数据报送——建设单位报送实施调度数据（文件管理情况表）

项目信息	文件管理					保存
项目开工	项目名称：国家土壤质量深州观测实验站建设项目					
报建手续	文件类型		管理情况	文件类型		管理情况
招标管理	项目前期产生的资料	项目立项申请报告		执行阶段产生的资料	隐蔽工程验收记录	
合同管理		项目建议书或可研报告	有		建材、仪器设备质量、试验记录	
完成情况		项目立项批准文件	有		设备安装施工记录	
资金管理		初设图纸及概算	有		工程质量事故报告及处理记录	
建设进度		初设批复文件	有		分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表	
计划执行		施工图及预算		(其他)施工日记		
项目管理		施工图批复文件		竣工图		
文件管理		有关决议、领导讲话、会议记录		施工单位报送甲方的竣工验收申请报告		
项目完工		征用土地、拆迁、补偿等文件		初验报告		
附件上传		工程地质（水文、气象）勘察报告		初验会议文件、会议决定		
			竣工阶段产生的资料			

操作路径：【建设项目】》【项目实施】》【数据填报】（说明项目档案管理情况）

05 实施调度数据报送——建设单位报送实施调度数据（项目完工操作）

农业农村投资项目管理平台

建设项目管理系统

登出

河北省石家庄市藁

申报指南可研报告初步设计投资计划项目实施竣工验收监督管理统计查询

项目信息

项目开工

报建手续

招标管理

合同管理

完成内容

资金管理

建设进度

计划执行

项目管理

文件管理

项目完工

项目完工说明

一、点击项目完工按钮

点击项目完工按钮前，请确认报建手续、招标管理、合同管理、完成内容、资金管理、建设进度、计划执行、项目管理等报表是否填写完整。如填写完整，请按下述原则点击项目完工按钮：

（一）单纯土建安装工程类项目。完成四方验收后，即可点击项目完工按钮。

（二）单纯仪器设备采购类项目。到货验收后，即可点击项目完工按钮。

（三）综合性项目。含有土建安装工程和仪器设备采购类项目，按上述两项原则，全部满足项目完工条件的，即可点击项目完工按钮。

二、完成后续报表填写

（一）点击项目完工按钮后，系统记录项目完工。上述报表数据将不能更改。

（二）项目完工后，项目进入竣工验收申请阶段，需要完善竣工验收申请阶段报表的填写。

（三）项目竣工验收申请提交后，上级主管部门将会依据项目竣工验收权限，组织开展竣工验收工作。

☒我已认真阅读上述说明。

项目完工

说明：项目完工时，务必保证填写完实施管理中所有报表后，点击图中“项目完工”按钮录入完工时间，进行项目完工操作。完工时间录入有误还可以修改。

05 实施调度与监测相关问题

调度信息报送注意事项

①

- 1、建设单位须在每月25日前完成当月调度数据上报，零进度也需要填报（直接点上报按钮），有的单位长期未在平台中更新上报项目实施数据。
- 2、建设单位实施调度数据表要填全，包括：项目报建手续、招标管理、合同管理、完成内容、资金管理、建设进度、计划执行七张表，常有建设单位未填写计划执行表，导致项目调度年度的资金支出为零。
- 3、对于已验收项目，在平台中完成了竣工验收信息填报和验收操作后，不用再填报调度数据。

②

- 4、建设单位完成实施调度数据填写后，应及时点“上报”按钮，对填写的数据进行确认，常有建设单位填写调度数据后不按上报按钮，系统将在该项目后显示“未上报”字样。
- 5、每月27日前，省级主管部门对项目单位填报信息的及时性、完整性和合理性进行审核，重点审核项目资金到位情况、资金完成情况、项目建设进度及存在的问题等。
- 6、省级主管部门应督促建设单位加快推进预警项目建设进度。

05 调度监测_问题项目预警

监测结果预警应用

①

1、计划财务司根据平台月度监测情况，对未按时开工、资金支付率低、资金长期闲置、超批复建设年限未完工等问题进行预警（黄色、橙色、红色），并以短信形式告知项目单位责任人和项目日常监管单位责任人。

2、计划财务司根据平台季度监测情况，对项目开工率、资金支付率等指标，分别按项目类型、项目管理部门进行综合排序在全国范围内予以通报。

②

3、对于黄色预警超过3个月未完成整改的项目，升级为橙色预警，省级农业农村主管部门应当开展现场督导，督促建设单位限期整改。对于橙色预警超过3个月仍未完成整改的项目，升级为红色预警，计划财务司、各相关司局应当约谈省级农业农村主管部门，省级农业农村主管部门应当根据约谈要求和项目具体问题，采取调整或撤销项目、暂缓安排后续投资、一定期限内停止安排新建设农业建设项目等措施。

4、项目调度数据填报率等将被列为2023年绩效考评扣分内容。

06 项目竣工验收（验收申请）__验收流程

项目竣工验收流程

验收申请



验收审核

一、验收申请

建设单位进行先进行完工操作，再进行验收申请操作。


二、验收申请审核

区/县、地/市主管部门逐级审核建设单位验收申请。

三、验收审核

省、自治区、直辖市、计划单列市、直属垦区主管部门进行验收批复审核。

06 项目竣工验收（验收申请）__验收流程

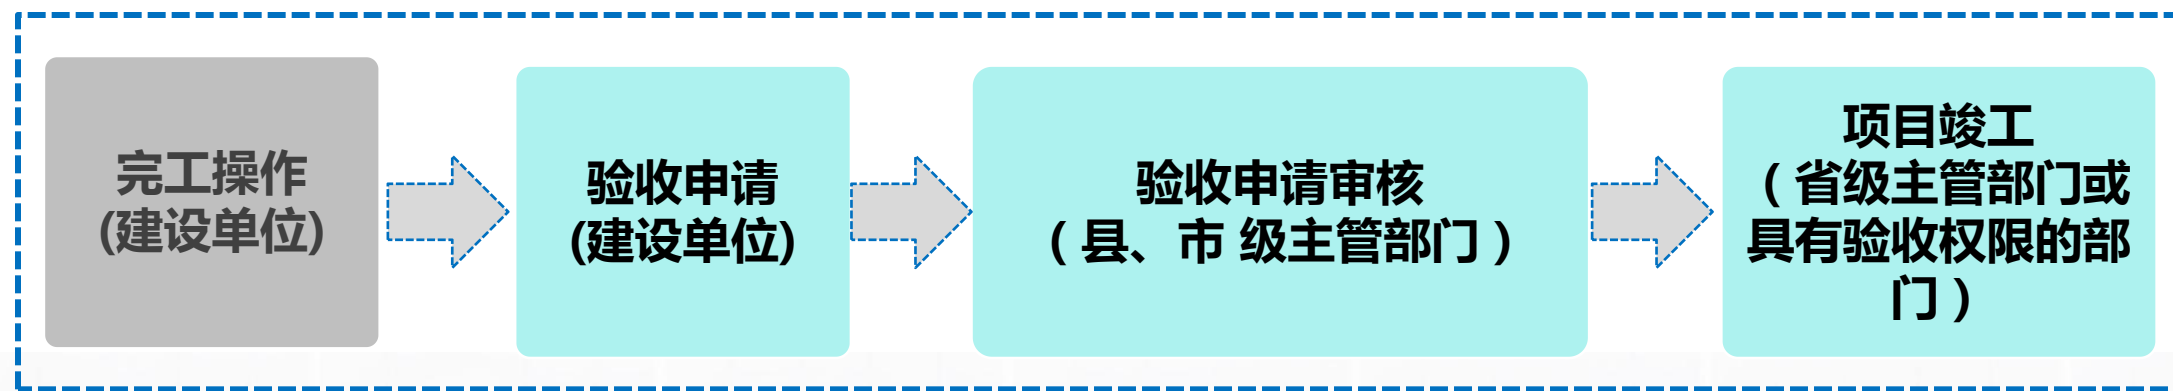

06 项目竣工验收（验收申请）

农业农村投资项目管理平台 建设项目管理系统

河北省农林科学院旱作农业研究所

常见问题

退出登录

首页

投资计划

初步设计

项目实施

竣工验收

监督管理

统计查询

验收申请

待申请

已申请

项目类型：

项目名称：

项目主管单位：

查询

重置

全部

序号	☐	项目名称	项目类型	发送单位	总投资	中央投资	状态	操作
1	☐	国家土壤质量深州观测实验站建...	农业科技创新能力条件建设项目	--	1519.00	1259	项目完工	验收申报

操作路径：【建设项目】》【竣工验收】》【验收申请】》【验收申报】

06 项目竣工验收（验收申请）

说明：建设单位在右图所示页面中，依次填写《项目基本信息表》、《基本情况》、《内容完成》、《管理情况》、《资金使用》、《文件管理》等报表后，点击“验收申请”按钮，将项目验收申请上报主管部门。

1.基本信息				2.基本情况		3.内容完成		4.管理情况		5.资金使用		6.文件管理		保存		验收申请	
项目名称	国家土壤质量深州观测实验站建设项目						申报编码	2021-130000-013438									
申报文号	农计财便函[2020]230号						申报文件名称	农业农村部计划财务司关于做好2021年中央预算内投资部分农业建设项目前期工作的通知									
申报年份	--						申报指南名称	2021年农业科技创新能力条件建设项目申报指南									
投资方向	农业行业基础能力建设						行业方向	藏粮于地藏粮于技									
项目类型	农业科学观测实验站						品种类型	--									
建设单位	河北省农林科学院旱作农业研究所																
项目建设地点	河北省																
详细建设地点	河北省衡水市深州市护驾迟镇护驾迟村北，衡水市桃城区河北省农林科学院旱作农业研究所																
建设年限	2年						批复建设年限	自投资计划下达之日起1年									
建设内容	该项目为国家土壤质量深州观测实验站改扩建项目，在河北省衡水市深州护驾迟，占地122亩。主要建设内容为仪器设备购置、农用及交通设备购置、田间建筑工程建设，包括改建土壤与植株样品保存柜、样品室及其配套建设、日光温室遮阳与保温系统改建、根系观测室排水系统改建、田间低压灌溉增加计量设施改造400米及7井增加自动计量检测设备、新建蒸渗仪10台、新建700平方米抗旱棚等，及其他建设。																
建设性质	改扩建						建设单位是否属于农垦系统	否									
立项年度	2021																
填报人：	河北省农林科学院旱作农业研究所						填报日期：	2020-09-07									
上传附件：	选择文件 保存																

操作路径：【建设项目】》【竣工验收】》【验收申请】

06 项目竣工验收（验收申请）

农业建设项目（初步/竣工）验收表

项目名称：_____

建设单位名称：_____

建设项目省级主管部门：_____

验收组织单位（公章）：_____

填报时间：_____年____月____日

竣工验收表封面

一、项目基本情况表

建设项目名称：

建设单位：

建设单位法定代表人：

电话：

建设单位联系地址：

邮编：

项目立项审批文号、时间：

初步设计审批部门、文号、时间：

是否组织初验：

项目初验时间：

建设单位申请竣工验收时间：

竣工验收日期：

竣工验收组织单位：

联系人：

电话：

（初步/竣工）验收组组长：

单位：

职务：

电话：

1、项目基本情况

06 项目竣工验收（验收申请）

二、建设内容完成情况	
批复建设地点：	实际建设地点：
批复建设期限：	实际建设期限：
初步设计（或可研）批复的建设内容及规模：	
完成的建设内容及规模：	
未完成的建设内容及规模：	
重大变更：	
非重大变更：	
履行基本建设程序情况：	
（初步/竣工）验收组评价：	
专家签字：	

2、建设内容完成情况表

06 项目竣工验收（验收申请）

三、建设项目管理情况	
初步设计	初步设计单位： 资质：
	设计范围和内容是否完整：
	设计是否规范：
	初步设计对可研批复的调整是否符合规定：
施工图设计	施工图设计单位： 资质：
	设计范围和内容是否完整：
	设计是否规范：
	施工图设计对初步设计批复的调整是否符合规定：
施工承包	土建工程单位： 资质：
	田间工程单位： 资质：
	设备安装单位： 资质：
	有无工程肢解发包、转包、违法发包问题：
建设质量	建筑工程验收评定结果：
	田间工程验收评定结果：
	设备安装与运行验收评定结果：
	竣工图完成情况：
	土建工程质量备案情况：
	土建工程是否符合规划报建程序：
	工程有无重大质量问题：

法人责任制	项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）：	
合同制	应签而未签订合同情况：	
	合同文本规范情况：	
	合同执行情况：	
招投标制	招投标制执行情况：	
监理制	监理单位：	资质：
	监理范围：	
	监理内容：	
执行法规	环保：	消防：
	劳动安全卫生：	抗震设防：
	其他国家强制性法规执行情况：	
（初步/竣工）验收组评价：		
专家签字：		

3、项目建设管理情况表

06 项目竣工验收（验收申请）

4、资金使用情况表

四、资金使用情况		
立项批复情况	总投资：	中央投资： 地方配套： 自筹资金： 建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 其他：
初步设计批复	总计：	建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他：
资金到位情况	总计：	中央投资： 省财政： 地、县级财政： 自有资金： 其他（请注明）：
投资完成情况	总计：	建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他：
形成资产	固定资产：	其他资产： 核销支出：
竣工决算审计	类型	社会中介审计： 内部审计： 政府审计部门：
	单位	资质：
	委托审计内容是否规范：	
	审计结论是否规范：	
概算调整和审批程序是否符合规定：		
财务制度建立及会计行为规范情况：		
资金单独核算、专款专用情况：		
截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：		
(初步/竣工)验收组评价：		
专家签字：		

06 项目竣工验收（验收申请）

五、项目文件管理情况		
文件类型		管理情况
项目前期产生的资料	项目立项申请报告	
	项目建议书或可研报告	
	项目立项批准文件	
	有关决议、领导讲话、会议记录	
	征用土地、拆迁、补偿等文件	
	工程地质（水文、气象）勘察报告	
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件	
	向地方报建的批准文件	
	仪器设备采购合同及招投标文件	
	土建发包合同、协议、招投标文件	
	规划、消防、环保、劳动等部门审核文件	
执行阶段产生的资料	开工报告（大型项目）	
	工程测量定位记录	
	图纸会审、技术交底	
	施工组织设计等	
	基础处理、基础工程施工文件材料	
	设备试运转报告	
	隐蔽工程验收记录	
	建材、仪器设备质量、试验记录	
	设备安装施工纪录	
	工程质量事故报告及处理纪录	
	分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表	
	其他	

竣工阶段产生的资料	竣工图	
	施工单位报送甲方的竣工验收申请报告	
	工程结算及审核材料	
	初验报告	
	初验会议文件、会议决定	
	竣工决算	
	竣工决算审计报告	
	工程建设总结和工作报告	
其他	竣工项目验收申请报告	
(初步/竣工) 验收组对资料归档情况的评价:		
专家签字:		

5、项目文件管理情况表



7 国家重大建设项目库

(1) 项目库简介

(2) 用户注册

(3) 项目申报

(4) 调度报送

（1）国家重大建设项目库简介



网址：<https://kpp.ndrc.gov.cn>

国家重大建设项目库是国家发展改革委于2016年开发投入使用的建设项目管理系统。

1、目前，省级农业农村主管部门在重大建设项目库中尚无项目管理操作功能，日常不需要操作重大建设项目库。

2、2016至2018年项目调度数据报送，项目建设单位需同时填报重大建设项目库和农业农村投资项目管理平台。

3、2018年以后安排投资的项目，建设单位不用填报重大建设项目库，只需在农业农村投资项目管理平台中进行项目申报，然后由平台自动导入重大建设项目库，调度数据也是建设单位在平台中填写后自动导入重大建设项目库。

4、2016至2018年项目在重大项目库下发调度任务后，建设单位才可以录入调度数据，通常每月10日后的5个工作日，重大项目库生成新一期的调度任务。

(2) 用户注册



统一认证平台登录

账号密码登录

请输入用户名

用户名不能为空

请输入密码

密码不能为空

☒ 记住密码

登录

注册账户

登录遇到的问题



项目单位账号密码找回

(2) 用户注册

注册信息填报
完毕，点击
“提交注册”
即可

个人注册

法人注册

1

2

3

法人基本信息

经办人基本信息

注册完成

请选择法人单位类型

*

请输入法人单位名称

*

请输入统一社会信用代码

*

身份证

*

请输入法定代表人姓名

*

请输入法定代表人证件号码

*

请选择身份证有效期开始时间

*

请选择身份证有效期结束时间

*

☐ 长期有效

请输入用户名，英文开头

密码长度至少8位，必须同时包含大小写字母、数字、符号

再次输入您的密码

请输入您的手机号

请输入右侧验证码计算结果

5+4=?

点击右侧获取短信验证码

获取验证码

《法人注册指南》

☒ 我已阅读并同意《国家发展和改革委员会互联网统一认证平台用户服务协议》
《国家发展和改革委员会互联网统一认证平台用户隐私政策》

提交注册

注册并绑定经办人

(2) 项目申报



国家重大建设项目库

项目管理

计划管理

项目调度

意见反馈

账号绑定

通知公告 105

“中央预算内投资项目”操作指引

2026-02-10

“国家重大建设项目库培训材料

2026-02-10

技术支持

2026-02-10

重大项目库离线采集软件2025版

2025-05-09

“重大项目储备”操作指引

2024-12-20

“提级论证项目”申报操作指引

2024-03-13

“项目资料上传”及“项目转办”功能操作...

2023-12-22

“项目资料上传”及“项目转办”功能操作...

2023-12-22

待办提醒

待办(0)

已办(0)

全部(0)

更多 >

暂无数据信息

技术支持

0791-88186840

0791-88186894

(工作时间：8:30-17:30)
点击查看更多客服联系方式

QQ群

西北区— 514406718

华南区— 245372647

华北区— 243668134

西南区— 514391227

操作路径：【项目管理】

(2) 项目申报

国家重大建设项目库

[返回首页](#)

项目申报

填报区

回收站

长期未更新项目

项目名称

信用信息

建设地点

项目代码

标签

国标行业

总投资(万元)

填报状态

合规性校验

所属行业

新增

修改

报送

获取信用信息

添加标签

撤回

删除

查询

重置

更多

报表打印

刷新

☐	项目名称	项目代码	总投资(万元)	是否重复项目	合规性校验	信用信息	填报状态	标签
 暂无数据信息								

操作路径：【项目管理】》填报区》新增

(3) 项目申报——(业务分类)

项目信息填报

1.业务分类

2.项目指标

请选择您申报的业务（可多选）

- ☒ 仅填写项目信息  (如需申报具体投资业务，请勾选下方具体业务名称。若无需要，直接点击“保存并下一步”)
- ☐ 地方政府专项债券
- ☐ 提级论证
- ☐ 用地保障重大项目
- ☐ 全国重点民间投资项目
- ☐ 十四五102项重大工程项目

- ☒ 中央预算内
- ☐ 超长期特别国债
- ☐ 重大项目储备
- ☐ 重点产业常态化推荐机制
- ☐ 新型政策性金融工具

保存并下一步

关闭

(3) 项目申报——(基本信息)

1.业务分类

2.项目指标

自 基本信息

业务信息

投资情况

前期工作

地方指标

自 基本信息

* 项目名称	测试2026	投资项目代码		验证(同步)平台信息
* 建设性质	新建	总投资(万元)	4500	万元
* 国标行业	其他农业	* 所属行业	农业	
* 开工或拟开工日期	2026-11-02	* 拟竣工日期	2027-12-31	
* 项目(法人)单位(请输入单位全称)	农业农村部	* 国别	中国	
* 建设地点	北京市			
* 建设详细地址	海淀区			
* 主要建设规模	购置仪器设备100台(套)			
* (年度)主要建设内容	仪器设备购置			

自 入库依据

* 项目隶属关系	中央项目	* 所属规划	国家级-专项规划	
* 项目单位信用代码	8988989445	符合重大战略		
* 日常监管直接责任单位(请输入单位全称)	XXX部门	* 日常监管直接责任单位监管责任人	王***	
* 日常监管直接责任单位联系电话	13900000000	* 是否产业转移项目	空	

(3) 项目申报——(基本信息)

民间投资

* 民间资本参与情况

民间资本未参与

民间投资项目的范围与统计局口径保持一致，民间资本参与项目是指项目非民间投资项目，但项目参股方中包括民间资本。

项目责任人/联系人

责任人

* 姓名

李**

* 手机

13800000000

固定电话

邮箱

微信账号

联系人一

* 姓名

赵**

* 手机

13500000000

固定电话

邮箱

微信账号

选择已有联系人

联系人二

姓名

手机

固定电话

邮箱

微信账号

选择已有联系人

选填指标

+ 添加选填指标

上一步

保存

下一步

关闭

2.项目指标

业务信息

投资情况

前期工作

地方指标

中央预算内

★ 项目隶属关系

中央项目

日常监管直接责任单位
(请输入单位全称)

XXX部门

日常监管直接责任单位
监管责任人

王***

日常监管直接责任单位
联系电话

139000000000

* 所属规划

国家级-专项规划 ×

* 投资计划年度

2026

★ 政府投资方向

农业

* 专项内支持方向

现代种业

★ 解决问题和达到效果

****中央预算内投资农业建设项目****中央预算内投资农业建设项目****中央预算内投资农业建设项目****中央预算内投资农业建
设项目****中央预算内投资农业建设项目****中央预算内投资农业建设项目****中央预算内投资农业建设项目

119/400

★ 软建设

****中央预算内投资农业建设项目****中央预算内投资农业建设项目****中央预算内投资农业建设项目****中央预算内投资农业建设项目****中央预算内投资农业建设项目****中央预算内投资农业建设项目

102/400

* 部门和地方采取的资金
安排方式

直接投资

* 符合中央预算内投资支持范围的投资(万元)

3000

万元

[上一步](#)

保存

下一步

关闭

(3) 项目申报——(投资情况)

1.业务分类

2.项目指标

自 基本信息

业务信息

投资情况

前期工作

地方指标

投资情况

资金类别	总投资 (万元)	累计下达 (安排) 资金 (万元)	累计完成投资 (万元)	资金需求 (万元)				
				合计	2025年	2026年	2027年	2028年
合计	4500			4500		3500	1000	
中央预算内投资	3000			3000		2000	1000	
地方政府专项债券资金								
超长期特别国债								
新型政策性金融工具								
∨ 其他地方财政性建设资金	500			500		500		
省级财政资金	500			500		500		
市级财政资金								
县级财政资金								
∨ 自有资金	1000			1000		1000		
民营企业自有资金								
国有企业自有资金								
事业单位自有资金								
其他自有资金	1000			1000		1000		
银行贷款								

*提示：(1) 投资金额请填写8位(含)以内正整数；(2) 如果投资金额为0，则无需填写。

上一步

保存

下一步

关闭

(3) 项目申报——(前期工作)

1.业务分类

2.项目指标

自 基本信息

自 业务信息

自 投资情况

自 前期工作

自 地方指标

自 前期工作

注：“批复状态”未选择的审批事项，可 [点击此处](#) 一键设置为“不涉及”

审批事项（要件）	批复单位	批复时间	批复文件标题	批复文号	批复状态	预计取得批复时间	批复文件
▲ 建设项目用地预审与选址意见书					不涉及 ▾		点击上传
用海预审					不涉及 ▾		点击上传
▲ 选址意见书（单独进行的）					不涉及 ▾		点击上传
环境影响评价批复					不涉及 ▾		点击上传
节能评估和审查					不涉及 ▾		点击上传
社会稳定风险评估					不涉及 ▾		点击上传
▲ 项目建议书批复					不涉及 ▾		点击上传
▲ 可行性研究报告批复					不涉及 ▾		点击上传
▲ 初步设计及概算批复					不涉及 ▾		点击上传
▲ 项目核准					不涉及 ▾		点击上传
▲ 项目备案					不涉及 ▾		点击上传
资金申请报告					不涉及 ▾		点击上传
▲ 建设用地规划许可证					不涉及 ▾		点击上传
开工许可证					不涉及 ▾		点击上传
▲ 施工许可证					不涉及 ▾		点击上传
施工图审查					不涉及 ▾		点击上传

上一步

保存

下一步

关闭

(3) 项目申报——(地方指标)

项目信息填报

1.业务分类

2.项目指标

3.项目报送

自 基本信息

业务信息

投资情况

前期工作

地方指标

地方指标

地方指标省份 农业农村部

选择：中央部门—>农业农村部

(3) 项目申报——(上报项目)

项目信息填报

1.业务分类

2.项目指标

3.项目报送

审核部门：

农业农村部

内设机构：

农业农村部办公厅

农业农村部市场与信息化司

农业农村部国际合作司

农业农村部科技教育司

农业农村部农产品质量安全监管司

农业农村部种植业管理司

农业农村部畜牧兽医局

农业农村部渔业渔政管理局

农业农村部农垦局

农业农村部种业管理司

农业农村部农业机械化管理局

农业农村部农田建设管理局

农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

上一步

报送

关闭

在此，需正确选择项目归口农业农村部管理司局！

选择好审核部门和内设机构后，点“报送”按钮，即可将项目上报审核部门。

(3) 项目申报——(上报项目)

**国家重大建设项目库**

[返回首页](#)

项目申报

填报区

回收站

长期未更新项目

项目名称

项目代码

总投资(万元)

合规性校验

信用信息

标签

填报状态

所属行业

建设地点

国标行业

新增

修改

报送

获取信用信息

添加标签

撤回

删除

1

☒

2027年现代种业提升项目

2,000

不重复

合规

未查询

待报送

首页

待办提醒

全屏显示

功能菜单

[查询](#)

[重置](#)

[更多](#)

[报表打印](#)

[刷新](#)

对于填写好信息暂时未上报的项目，可在填报区中，勾选中项目后，点“报送”按进行上报操作。

(3) 项目申报——(撤回已上报项目)

国家重大建设项目库

[返回首页](#)

项目申报

填报区

回收站

长期未更新项目

项目名称

信用信息

建设地点

项目代码

标签

国标行业

总投资 (万元)

填报状态

合规性校验

所属行业

查询

重置

更多

新增

修改

报送

获取信用信息

添加标签

撤回

删除

报表打印

搜索

刷新

	☒	项目名称	项目代码	总投资 (万元)	是否重复项目	合规性校验	信用信息	填报状态
1	☒	2027年现代种业提升项目		2,000	不重复	合规	未查询	待报送

在填报区，选中未上报项目名称左侧复选框，点击修改按钮进行项目信息修改。

(3) 项目申报——(撤回已上报项目)

**国家重大建设项目库**

[返回首页](#)

项目申报

填报区

回收站

长期未更新项目

项目名称

信用信息

建设地点

项目代码

标签

国标行业

总投资(万元)

填报状态

合规性校验

所属行业

查询

重置

更多

新增

修改

报送

获取信用信息

添加标签

撤回

删除

报表打印

刷新

	☒	项目名称	项目代码	总投资(万元)	是否重复项目	合规性校验	信用信息	填报状态
1	☒	 2027年现代种业提升项目		2,000	不重复	合规	未查询	已报

对已上报、部级部门还未编制投资计划的项目可进行撤回修改等操作。

(3) 项目申报——(撤回已上报项目)

国家重大建设项目库

返回首页

项目申报

填报区

回收站

长期未更新项目

项目名称

项目代码

总投资(万元)

合规性校验

信用信息

标签

填报状态

所属行业

建设地点

国标行业

新增

修改

报送

获取信用信息

添加标签

撤回

删除

查询

重置

更多

报表打印

	☒	项目名称	项目代码	总投资(万元)	是否重复项目	合规性校验	信用信息	填报状态
1	☒	 2027年现代种业提升项目		2,000	不重复	合规	未查询	已报

提示

您确定撤回所选择的项目吗? 一个项目一天只能撤回5次。

确定

关闭

对已上报、部级部门还未编制投资计划的项目可进行撤回修改等操作。

(4) 调度报送——按月填报调度信息



国家重大建设项目库

项目管理

计划管理

项目调度



意见反馈



账号绑定

通知公告 105

更多 >

- “中央预算内投资项目”操作指引 2026-02-10
- 国家重大建设项目库培训材料 2026-02-10
- 技术支持 2026-02-10
- 重大项目库离线采集软件2025版 2025-05-09
- “重大项目储备”操作指引 2024-12-20
- “提级论证项目”申报操作指引 2024-03-13
- “项目资料上传”及“项目转办...” 2023-12-22
- “项目资料上传”及“项目转办...” 2023-12-22

待办提醒

待办(0)

已办(0)

全部(0)

更多 >



暂无数据信息

技术支持



0791-88186840
0791-88186894

(工作时间：8:30-17:30)
点击查看更多客服联系方式

 QQ群

西北区— 514406718
华南区— 245372647
华北区— 243668134
西南区— 514391227

填报时间要求：未验收项目每月都需要填报调度数据，国家发展改革委目前行周调度！

(4) 调度报送——按月填报调度信息



国家重大建设项目库

返回首页

调度填报

本期调度

往期调度

本期未确认

本期已确认

销项库

全部

我的日常监管项目

调度业务

调度任务

项目名称

项目代码

填报情况

开/竣工情况

调度图片

项目资料

承诺书

查询

重置

更多

确认本期无进展

添加标签

项目履历

审核确认

关联日常监管单位

报表打印

搜索

刷新

	☐	项目名称	项目代码	总投资(万元)	填报情况	调度图片	承诺书	项目资料	调度业务	协同监管单位
1	☐	北京市海淀区国家数字农业创新应...	2020-000403-01-01-014397	4,000	本期未填				查看	
2	☐	北京市朝阳区国家数字农业创新应...	2020-000403-01-01-014546	4,000	本期未填				查看	
3	☐	国家数字农业装备创新中心试点建...	2105-000000-20-03-412822	3,488	本期未填		查看		查看	
4	☐	农业农村部农业信息软硬件产品质...	2020-000403-01-01-009583	1,128	本期未填		查看		查看	
5	☐	农业农村部农业遥感机理与定量遥...	2019-000403-73-01-004393	1,230	本期未填		查看		查看	
6	☐	农业农村部蔬菜产后处理重点实验...	2019-000403-73-01-003739	1,248	本期未填			查看	查看	
7	☐	北京市农作物病虫害生物防治天敌繁...	2020-000403-05-01-009548	677	本期未填				查看	

(4) 调度报送——实施情况

调度反馈（项目名称：农业农村部蔬菜产后处理重点实验室建设项目 项目代码：2019-000403-73-01-003739）

本期调度重点填报内容（须每月按实际情况更新）

项目基本情况

调度填报起止时间: 2026-03-12 00:00:59至2026-04-11 00:00:00

调度期号: 202603

[\(查看详情\)](#)

本期调度填报人 + 添加填报人

姓名 未填写

工作单位 未填写

手机 未填写

民间投资

* 民间资本参与情况

民间投资项目的范围与统计局口径保持一致，民间资本参与项目是指项目非民间投资项目，但项目参股方中包括民间资本。

实施信息 施工时间修改记录

实际开工时间 自 2020-07-20

* 是否纳统

实际竣工时间 自 2022-07-20

未开工原因

* 招投标形式 公开招标

建设单位 北京市农林科学院

项目进度信息

* 形象进度 非工程类

* 中央投资到位时间

* 年度建设内容 购置相关仪器设备，配套相关土建工程。

* 进展情况、问题建议及下一步工作安排

18/100

3/100

日常监管直接责任单位 北京市农业农村局

投资计划调整情况

政府督查机构联系人

联系方式（电话）

发改部门联系人

联系方式（电话）

备注

0/200

实施情况

现场监控

项目资料

地图定位

计划下达情况

项目填报单位：
北京市农林科学院信息技术研究中心

最后更新单位：
北京市农林科学院信息技术研究中心

最后更新时间：
2025-04-16 10:55:54

项目进展可更新单位：
（农业农村部）农业农...
北京市农林科学院信息...
农业农村部
（北京市）区域处
北京市

(4) 调度报送——实施情况

调度反馈 (项目名称: 农业农村部蔬菜产后处理重点实验室建设项目 项目代码: 2019-000403-73-01-003739)

本期调度重点填报内容 (须每月按实际情况更新)

项目基本情况

实施情况

现场监控

项目资料

地图定位

计划下达情况

项目填报单位:
北京市农林科学院信息技术研究中心

最后更新单位:
北京市农林科学院信息技术研究中心

最后更新时间:
2025-04-16 10:55:54

项目进展可更新单位:
(农业农村部) 农业农村
北京市农林科学院信息...
农业农村部
(北京市) 区域处
北京市

资金类别	总投资 (万元)	资本金 (万元)	到位资金 (万元)				完成投资 (万元)			
			截至上年底累计到位资金	截至上一报告期累计到位资金	截至本报告期累计到位资金	本年已到位资金 ?	本年计划投资	截至上年底累计完成投资	截至上一报告期累计完成投资	截至本报告期累计完成投资
合计	1248		1248	1248	1248			991	991	991
中央预算内投资	1040		1040	1040	1040			991	991	991
地方预算内投资	208		208	208	208					
省级预算内投资	208		208	208	208					
地方政府专项债券资金										
超长期特别国债										
新型政策性金融工具										
其他地方财政性建设资金										
自有资金										
民营企业自有资金										
国有企业自有资金										
事业单位自有资金										
其他自有资金										
银行贷款										
其他投资										

业务分类	累计下达/发行/安排情况 (万元)	到位率(%)	完成率(%)	支付率(%)
中央预算内	1040	100%	95.29%	95.29%

申请销项

确认本期无进展

确认并保存

关闭

(4) 调度报送——现场监控

调度反馈 (项目名称: 农业农村部蔬菜产后处理重点实验室建设项目 项目代码: 2019-000403-73-01-003739)

X

本期调度重点填报内容 (须每月按实际情况更新)

项目基本情况

实施情况

现场监控

项目资料

地图定位

计划下达情况

项目填报单位:
北京市农林科学院信息技术研究中心

最后更新单位:
北京市农林科学院信息技术研究中心

最后更新时间:
2025-04-16 10:55:54

项目进展可更新单位:
(农业农村部) 农业农...
北京市农林科学院信息...
农业农村部
(北京市) 区域处
北京市

调度图片

注支持上传图片 (jpg、jpeg、png) 格式文件。

已上传 0.00M/50M



上传图片

调度视频

注支持上传音视频 (mp4、avi、mpeg、flv、mov、f4v、rmvb、mkv、m3u8) 格式文件。

已上传 0.00M/200M



上传视频

调度监控

(4) 调度报送——项目资料

调度反馈 (项目名称: 农业农村部蔬菜产后处理重点实验室建设项目 项目代码: 2019-000403-73-01-003739)

本期调度重点填报内容 (须每月按实际情况更新)

项目基本情况

实施情况

现场监控

项目资料

地图定位

计划下达情况

项目填报单位:
北京市农林科学院信息技术研究中心
最后更新单位:
北京市农林科学院信息技术研究中心
最后更新时间:
2025-04-16 10:55:54
项目进展可更新单位:
(农业农村部) 农业农...
北京市农林科学院信息...
农业农村部
(北京市) 区域处
北京市

前期工作

可行性研究报告批复文件
初步设计批复文件
投资概算表
建设工程规划许可证
施工许可证 (或开工报告)

实施过程

工程开工令
施工中标通知书
重要设备中标通知书
施工合同
重要设备采购、安装合同

资金管理

中央预算内资金到位凭证
中央预算内资金支付凭证

竣工阶段

竣工验收报告 (竣工验收单)
竣工结算报告
竣工结算审核/审计报告
竣工财务决算报告
竣工财务决算审核/审计报告

查看项目资料日志

注: 支持上传图片 (jpg、jpeg、png、gif、bmp)、文档 (pdf) 格式文件。已上传 22.30M/100M

1.可行性研究报告批复文件

(仅需上传批复文件的首页、总投资金额页、末页。)

点击上传

2.初步设计批复文件

(仅需上传批复文件的首页、总投资金额页、末页。)

点击上传

3.投资概算表

点击上传



决算审计报告-终版.pdf

20.87MB

上传时间: 2025-02-16 15:31:04



4.建设工程规划许可证

点击上传

5.施工许可证 (或开工报告)

点击上传

6.工程开工令

点击上传

7.施工中标通知书

点击上传

8.重要设备中标通知书

点击上传

9.施工合同

(仅需上传合同的正文首页、合同金额等关键内容页、签字盖章页。)

点击上传

10.重要设备采购、安装合同

确认

关闭

(4) 调度报送——地图定位

本期调度重点填报内容 (须每月按实际情况更新)

项目基本情况

实施情况

现场监控

项目资料

地图定位

计划下达情况

项目填报单位：
北京市农林科学院信息技术研究中心

最后更新单位：
北京市农林科学院信息技术研究中心

最后更新时间：
2025-04-16 10:55:54

项目进展可更新单位：
(农业农村部) 农业农...
北京市农林科学院信息...
农业农村部
(北京市) 区域处
北京市

搜索位置

标记点

标记线

标记面


编辑标记位置

取消编辑

删除标记位置

清空所有标记位置

定位标记位置

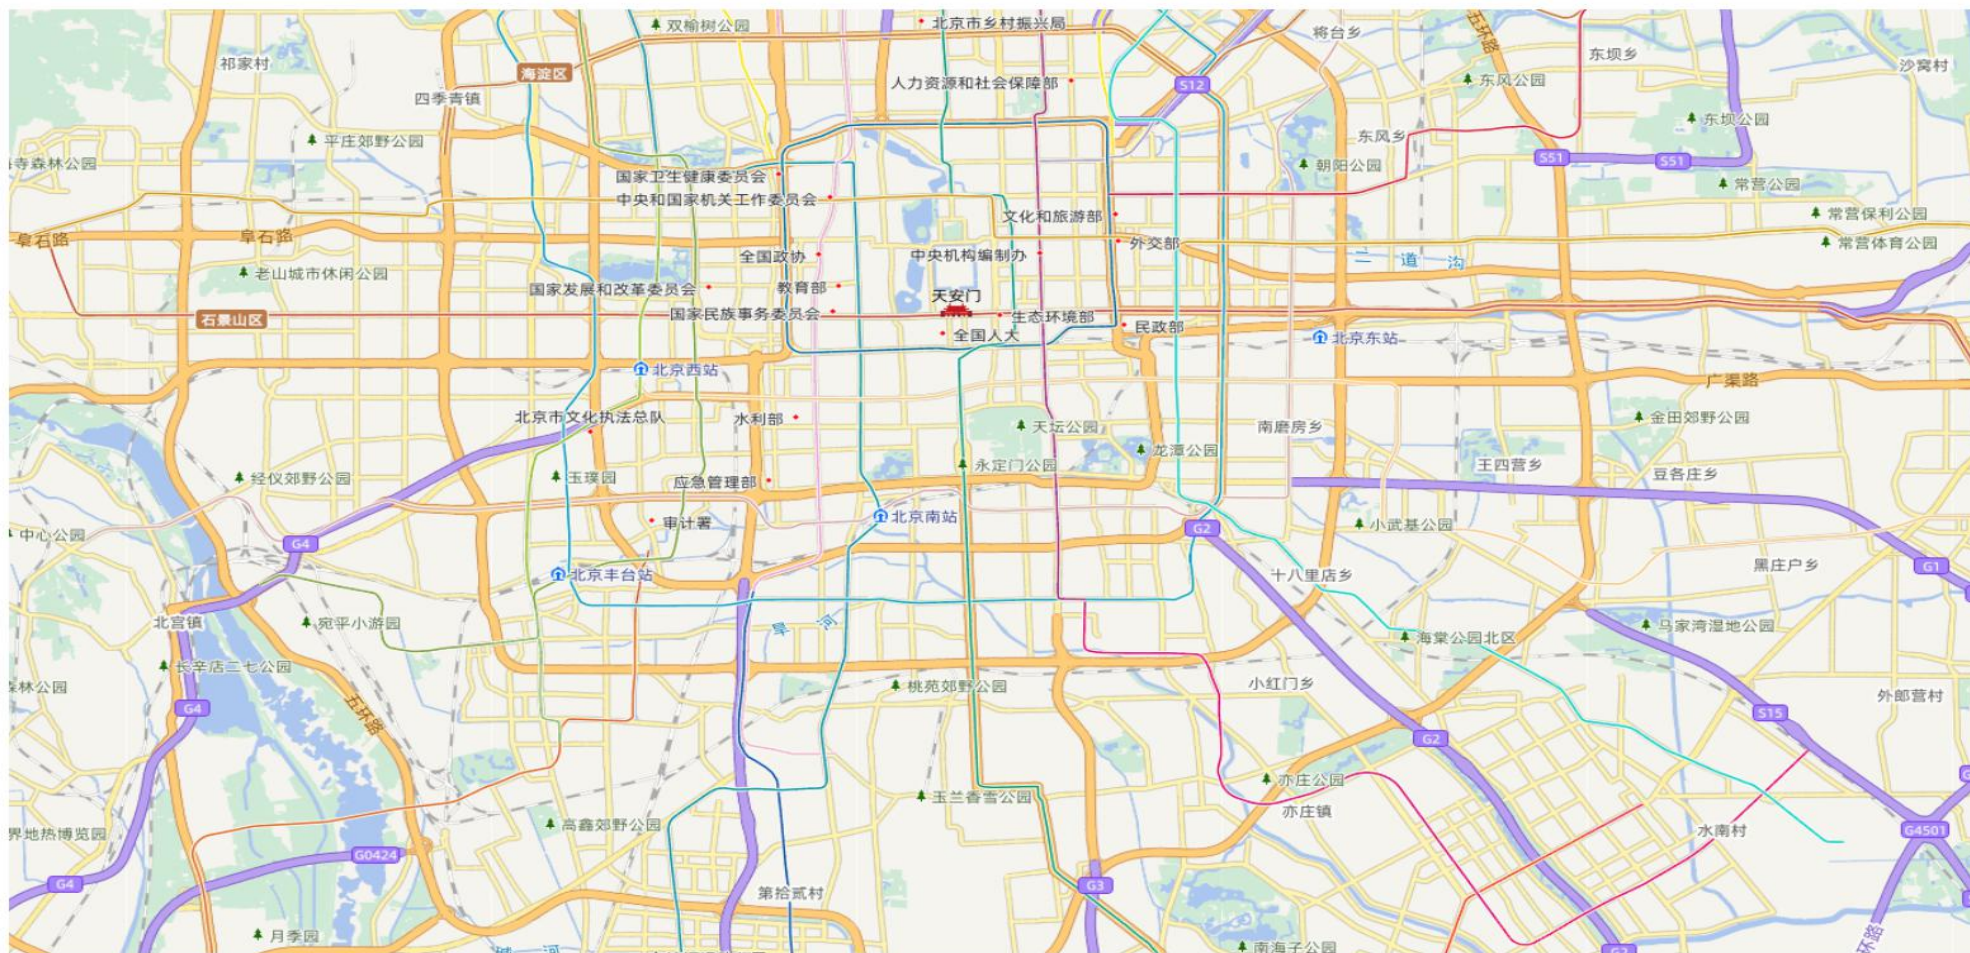


确认

关闭

第三部分 省级主管部门操作

- 1 项目申报
- 2 项目立项批复
- 3 初步设计
- 4 投资计划编制
- 5 项目实施调度
- 6 项目绩效评价
- 7 项目竣工验收

01.项目申报__ (项目申报流程)

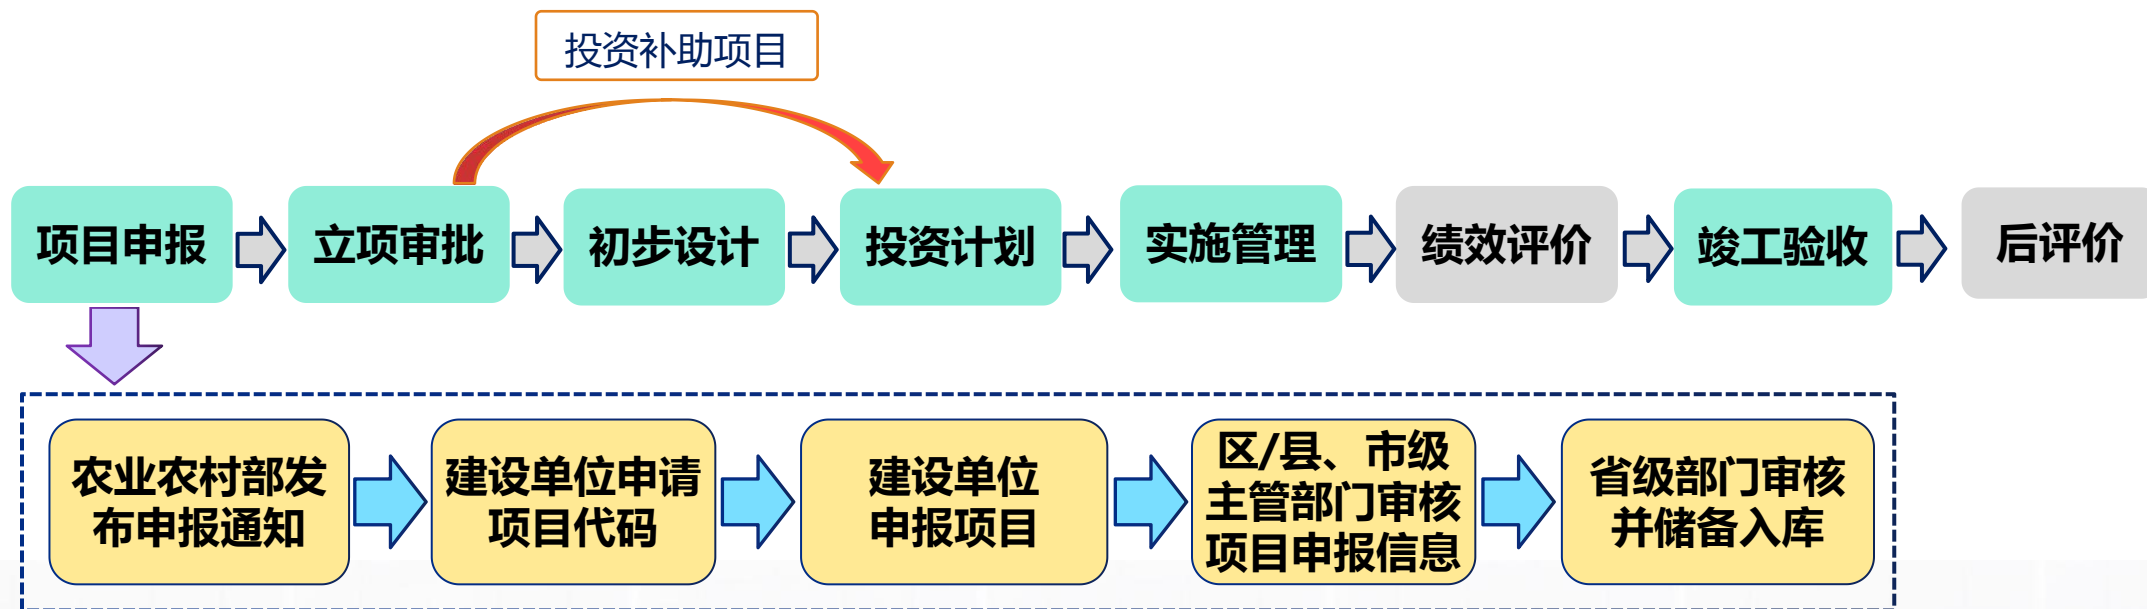

01.项目申报_查看申报通知



中华人民共和国农业农村部
Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

第一步

储备管理 | 基本建设 | 部门预算 | 转移支付 | 现代农业示范区管理 | 专家库管理 | 辅助决策 | 农业综合 | 资源共享

河北省农业农村厅 | 常见问题 | 退出

快捷入口

待办事项

已办事项

我的报表

我的用户

我的项目

问卷调查

我的通知

我的储备

我的绩效

通知公告

1. 041323234新增储备通知2020-04-29

2. 0429储备通知123123445552020-04-29

3. 专项债111232020-04-24

4. 农业科技创新能力条件提升（重点实验室）建设工程-农业农村部...2020-04-17

5. 20200416转移支付2020-04-16

更多>>

政策法规

1. 韩长赋在与农业农村部年轻的座谈中指出2018-02-04

2. 中央第十四巡视组对农业农村部的学习提出意见2018-08-31

3. 李克强主持召开国务院常务会议强调要加强对经济的领导2018-05-16

4. 国务院关于同意乌鲁木齐、包头建立自主创新自贸区2018-03-22

5. 刘鹤访问德国并出席第八届经济论坛并讲话2018-08-31

更多>>

用户信息

登录用户：河北省农业农村厅

地区：农业农村部河北省

登录时间：2020-05-11

待办工作

1. 19点35分类型多选

2. 1022dd

更多>>

在线下载

1. 2020年4月中旬上线情况说明2020-04-20

2. 储备项目填报操作手册-建设单位操作手册

3. 储备项目填报操作手册-区县级单位操作手册

4. 全国投资项目在线审批监管平台使用简要说明

5. 补短板项目和平台开放端口对应表

更多>>

操作教程

1. 2020年4月中旬上线情况说明2020-04-20（平台发布版）.pdf

2. 补短板项目和平台开放端口对应表.pdf

3. 全国投资项目在线审批监管平台使用简要说明.pdf

4. 储备项目填报操作手册-建设单位操作手册（2020-04-15发布版）.pdf

5. 储备项目填报操作手册-区县级单位操作手册（2020-04-15发布版）.pdf

6. 2019年农业建设项目投资计划信息填报工作方案.docx

更多>>

操作路径：【储备管理】》【储备通知】

01.项目申报_查看储备申报通知

农业农村投资项目管理平台

项目库管理模块

首页

储备管理

统计查询

储备管理

储备通知

未上报

已上报

待完善

通知文号：

通知标题：

发布日期：

截止日期：

序号	通知标题	通知文号	资金来源	发布时间	截止时间	阅读量
1	2022-2025年病死畜禽无害化收集处理场...	2022-2025年病死畜禽无害化收集处理场储备指南	基本建设资金	2021-07-26	2025-12-31	4223
2	2022-2025年长江生物多样性保护工程项...	农计财便函〔2021〕271号	基本建设资金	2021-07-26	2025-12-31	5167
3	2022-2025年畜禽粪污资源化利用整县推...	农计财便函〔2021〕271号	基本建设资金	2021-07-26	2025-12-31	11468
4	2022-2025重点流域农业面源污染综合治...	农计财便函〔2021〕271号	基本建设资金	2021-07-26	2025-12-31	7204

操作路径：【储备管理】》【储备通知】

01.项目申报_查看储备申报通知

54 / 42

×

储备项目通知

通知基本信息

* 通知标题：2021年畜禽粪污资源化利用整县推进储备指南

* 通知文号：农计财便函〔2020〕264号

* 发布时间：2020-07-31 * 截止时间：2020-12-31

通知正文：

2021年畜禽粪污资源化利用整县推进
储备指南

• 建设要求

突出种养结合要求，以液体粪肥就地就近还田利用为重点，整县推进畜禽粪污资源化利用。坚持政府支持、企业主体、市场化运作，培育社会化服务组织，强化技术装备支撑，完善种养主体有效对接机制，加快构建农牧循环种养结合发展新格局。

• 建设内容

重点支持规模养殖场、种植主体、社会化服务组织以及县级技术支撑单位围绕种养结合建设畜禽粪污收集、贮存、处理、利用以及检测相关设施设备。项目县根据现有基础条件，按照“填平补齐”的原则确定项目建设内容。主要包括：建设畜禽粪污密闭贮存发酵池、液体粪污（沼液）田间贮存池、还田管网等设施，购置高效适用输送和施用机具，畅通还田渠道；购置车辆定位装置、流量计、液面仪等粪污运输和施用量数据采集和传输设备，采集粪污还田量等相关数据，加强畜禽粪污流向监管；购置粪污养分快速测定仪器、凯氏定氮仪、烘箱、分光光度计、火焰光度计、高压灭菌锅等，对畜禽粪污特性数据进行检测分析，提高还田规范化水平。

文件名称	文件类型	文件大小
关于中央预算内投资部分农业建设项目的补充通知（农计财便函[2020]264号）.pdf	pdf	5.3 MB

操作路径：【储备管理】》【储备通知】

01.项目申报_省级主管部门审核市级主管部门上报的储备项目

**中华人民共和国农业农村部**
Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政务信息系统管理平台（政务管理）
农业农村投资项目管理平台

[江苏省农业农村厅](#)[常见问题](#)[退出登录](#)

[首页](#)[储备管理](#)[统计查询](#)

储备管理

储备管理流程

储备通知

待储备

已储备

项目库

本级后备库

下级后备库

通知文号：

通知标题：

项目类型：

项目名称：

储备年度：

[查询](#)[重置](#)[下载](#)

下级申报

[批量退返](#)[放开修改](#)[锁定项目](#)[列入储备库](#)[列入后备库](#)

序号	☐	项目名称	项目类型	项目单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	通知标题	通知文号	储备申报时间	推荐状态	锁定状态	操作
1	☐	涟水县2025年高标准...	高标准农田新建与改造...	江苏省淮安市涟水县农...	12679	11404	2025年...	农计财...	2025-04-...	--	已锁定	编辑 退返
2	☐	高邮市2025年高标准...	高标准农田新建与改造...	江苏省扬州市高邮市农...	19328	17392	2025年...	农计财...	2024-12-...	--	已锁定	编辑 退返
3	☐	江都区2025年高标准...	高标准农田新建与改造...	江苏省扬州市江都区农...	34836	28486	2025年...	农计财...	2024-12-...	--	已锁定	编辑 退返

审核储备项目方法：在此页面中，打开“编辑”按钮，审核项目申报信息四张报表。

操作路径：【储备管理】》【待储备】》【编辑】

01.项目申报_省级主管部门审核市级主管部门上报的项目

基本建设资金填报

保存

基本信息

建设内容

招标投标

监督管理

项目名称	2020年度河北省石家庄市元氏县中央预算内投资高标准农田建设项目2020年度河北省石家庄市元氏县中			* 项目代码	2020-000403-01-01-003647		
储备通知名称	高标准农田建设工程						
* 申报文号	冀发改投资[2020]1476号			* 申报文件名称	关于下达河北省农业生产发展专项2020年中央预算内投资计划		
专项名称	农业生产发展专项(2020)			项目名称	中央预算内投资高标准农田建设项目		
单项名称	中央预算内投资高标准农田建设						
* 建设单位	河北省石家庄市元氏县农业农村局			* 建设性质	新建		
* 项目建设地点	河北省->石家庄市->元氏县						
* 详细建设地点	河北省:石家庄市_元氏县						
* 建设年限	1 年						
* 主要建设内容及规模	土地平整、土壤改良、灌溉排水和节水设施、田间机耕道路、农田防护与生态环境保护、农田配输电和损毁工程修复、水肥一体化配套设施、土壤墒情仪器设备等。						
字数控制600字以内							
已输入 72 字, 不可超过600字							
法定代表人							
* 姓名	王生辰			通讯地址	石家庄市元氏县常山路101号		
* 手机号	13582156201			电子邮箱	ysnjzx@163.com		
以13-19开头的11位号码							
* 上传附件	浏览上传						

01.项目申报_省级主管部门审核市级主管部门上报的项目

基本建设资金填报

保存

基本信息 建设内容 招标投标 监督管理

一	项目代码	2020-000403-01-01-003647					
二	项目名称	2020年度河北省石家庄市元氏县中央预算内投资高标准农田建设项目2020年度河北省石家庄市元氏县中央预算内高标准农田建设项目					
三	申报单位	河北省石家庄市元氏县农业农村局					
四	申报文件	关于下达河北省农业生产发展专项2020年中央预算内投资计划及任务清单的通知(冀发改投资[2020]1476号)					
五	建设性质	新建					
六	建设单位	河北省石家庄市元氏县农业农村局					
七	建设年限	1					
八	建设地点	河北省->石家庄市->元氏县					
九	详细建设地点	河北省:石家庄市_元氏县					
十	主要建设内容及规模	土地平整、土壤改良、灌溉排水和节水设施、田间机耕道路、农田防护与生态环境保护、农田配输电和损毁工程修复、水肥一体化配套设施、土壤墒情仪器设备等。					
十一	* 建设内容	建设形式	规模(数量)	单位	单价(元)	投资估算(万元)	
(1)	建安工程				0	598.00	添加
1	田间机耕道路	其他	46000	平方米	130	598.00	删除
(2)	田间工程				0	540.00	添加
1	灌溉排水和节水设施	其他	80000	米	40	320.00	删除
2	农田配输电和损毁工程修复	有泵房及设施	10	座	120000	120.00	删除
3	农田防护与生态环境保护	其他	1	项	1000000	100.00	删除
(3)	仪器设备购置				0	150.00	添加
4			1		1500000	150.00	删除

操作路径：【储备管理】》【待储备】》【编辑】

01.项目申报_省级主管部门审核市级主管部门上报的项目

基本建设资金

十二	工程建设其他费	25.00 万元				添加	
1	建设单位管理费	15 万元				删除	
2	可研编制费	5 万元				删除	
3	招标代理费	5 万元				删除	
十三	预备费	12 万元					
十四	总投资	1500.00	以上数据汇总得	1475.00	万元		
十五	资金来源	* 中央预算内投资	1200 万元				
		* 地方配套投资/垦区自筹	300 万元				
		自有资金	0 万元				
		其他资金	0 万元				
十六	三年滚动计划	资金来源					
		总投资	中央预算内投资	地方政府投资	项目单位自筹资金	其他资金	
总计	1500.00	1200.00	300.00	0.00	0.00		
第一年	1050.00	1000	50	0	0		
第二年	450.00	200	250	0	0		
第三年	0.00	0	0	0	0		
备注		无					

操作路径：【储备管理】》【待储备】》【编辑】

01.项目申报_省级主管部门审核市级主管部门上报的项目

基本建设资金填报

保存

基本信息

建设内容

招标投标

监督管理

项目招标投标事项申请表

	招标范围	招标组织形式	招标方式
设计	无	无	无
建安工程	全部招标	委托招标	公开招标
监理	无	无	无
主要设备	无	无	无
重要材料	无	无	无
其他	无	无	无

01.项目申报_省级主管部门审核市级主管部门上报的项目

54 · 56

基本建设资金填报

保存

基本信息

建设内容

招标投标

监督管理

项目监督管理单位情况表

建设单位名称	河北省石家庄市元氏县农业农村局		
项目负责人信息			
* 姓名	* 职务	* 手机号	其他
王生辰	主任	13582166201	无
日常监管直接责任单位信息为（项目填报单位上级主管部门）			
* 单位名称	* 监管负责人姓名	* 监管负责人职务	* 监管负责人手机号
河北省石家庄市农业农村局	仇雪梅	处长	18032070156
省级日常监管负责人信息			
* 部门名称	* 监管负责人姓名	* 监管负责人职务	* 监管负责人手机号
河北省农业农村厅	用户填报	用户填报	用户填报

审核项目信息时，具有项目批复权限的部门务必将“省级日常监管负责人信息”补充完整！

01.项目申报_省级主管部门退返市级主管部门上报的项目

**中华人民共和国农业农村部**
Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政务信息系统管理平台（政务管理）
农业农村投资项目管理平台

江苏省农业农村厅
常见问题
退出登录

首页

储备管理

统计查询

储备管理

储备管理流程

储备通知

待储备

已储备

项目库

本级后备库

下级后备库

通知文号：

通知标题：

项目类型：

项目名称：

储备年度：

查询

重置

下载

下级申报

批量退返

放开修改

锁定项目

列入储备库

列入后备库

序号	☐	项目名称	项目类型	项目单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	通知标题	通知文号	储备申报时间	推荐状态	锁定状态	操作
1	☐	涟水县2025年高标准...	高标准农田新建与改造...	江苏省淮安市涟水县农...	12679	11404	2025年...	农计财...	2025-04-...	--	已锁定	编辑退返
2	☐	高邮市2025年高标准...	高标准农田新建与改造...	江苏省扬州市高邮市农...	19328	17392	2025年...	农计财...	2024-12-...	--	已锁定	编辑退返
3	☐	江都区2025年高标准...	高标准农田新建与改造...	江苏省扬州市江都区农...	34836	28486	2025年...	农计财...	2024-12-...	--	已锁定	编辑退返

点击“退返”或“批量退返”按钮，可将不符合要求或需要修改信息的储备项目退返至市级主管部门
操作路径：【储备管理】》【待储备】》【退返】

01.项目申报_省级主管部门解锁项目信息修改

- 如项目信息不完善，需要由建设单位进行修改，可在主工作区使用【放开修改】功能，在“退返”项目的情况下，允许建设单位完善项目信息。

**中华人民共和国农业农村部**
Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政务信息系统管理平台（政务管理）
农业农村投资项目管理平台

江苏省农业农村厅 常见问题 退出登录

首页

储备管理

统计查询

储备管理

储备管理流程

储备通知

待储备

已储备

项目库

本级后备库

下级后备库

通知文号：

通知标题：

项目类型：

项目名称：

储备年度：

查询 重置 下载

下级申报

批量退返

放开修改

锁定项目

列入储备库

列入后备库

序号	☐	项目名称	项目类型	项目单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	通知标题	通知文号	储备申报时间	推荐状态	锁定状态	操作
1	☐	涟水县2025年高标准...	高标准农田新建与改造...	江苏省淮安市涟水县农...	12679	11404	2025年...	农计财...	2025-04-...	--	已锁定	编辑 退返
2	☐	高邮市2025年高标准...	高标准农田新建与改造...	江苏省扬州市高邮市农...	19328	17392	2025年...	农计财...	2024-12-...	--	已锁定	编辑 退返
3	☐	江都区2025年高标准...	高标准农田新建与改造...	江苏省扬州市江都区农...	34836	28486	2025年...	农计财...	2024-12-...	--	已锁定	编辑 退返

操作路径：【储备管理】》【待储备】》【放开修改】

01.项目申报——省级主管部门关闭项目信息修改权限（锁定项目）

**中华人民共和国农业农村部**
Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政务信息系统管理平台（政务管理）
农业农村投资项目管理平台

江苏省农业农村厅
常见问题
退出登录

首页

储备管理

统计查询

储备管理

储备管理流程

储备通知

待储备

已储备

项目库

本级后备库

下级后备库

通知文号：

通知标题：

项目类型：

项目名称：

储备年度：

[查询](#)[重置](#)[下载](#)

下级申报

[批量退返](#)[放开修改](#)[**锁定项目**](#)[列入储备库](#)[列入后备库](#)

序号	☐	项目名称	项目类型	项目单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	通知标题	通知文号	储备申报时间	推荐状态	锁定状态
1	☒	涟水县2025年高标准...	涟水县2025年高标准农田建设项目（超长期国债）	江苏省淮安市涟水县农...	12679	11404	2025年...	农计财...	2025-04...	--	已锁定
2	☐	高邮市2025年高标准...	高标准农田新建与改造...	江苏省扬州市高邮市农...	19328	17392	2025年...	农计财...	2024-12...	--	已锁定
3	☐	江都区2025年高标准...	高标准农田新建与改造...	江苏省扬州市江都区农...	34836	28486	2025年...	农计财...	2024-12...	--	已锁定

项目单位修改完项目信息后，主管部门点击“锁定项目”关闭项目信息修改权限。
操作路径：【储备管理】》【待储备】》【锁定项目】

01.项目申报_省级主管部门项目储备入库操作

**中华人民共和国农业农村部**
Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政务信息系统管理平台（政务管理）
农业农村投资项目管理平台

江苏省农业农村厅

常见问题

退出登录

首页

储备管理

统计查询

储备管理

储备管理流程

储备通知

待储备

已储备

项目库

本级后备库

下级后备库

通知文号：

通知标题：

项目类型：

项目名称：

储备年度：

查询

重置

下载

下级申报

批量退返

放开修改

锁定项目

列入储备库

列入后备库

序号	☐	项目名称	项目类型	项目单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	通知标题	通知文号	储备申报时间	推荐状态	锁定状态
1	☒	涟水县2025年高标准...	高标准农田新建与改造...	江苏省淮安市涟水县农...	12679	11404	2025年...	农计财...	2025-04...	--	已锁定
2	☐	高邮市2025年高标准...	高标准农田新建与改造...	江苏省扬州市高邮市农...	19328	17392	2025年...	农计财...	2024-12...	--	已锁定
3	☐	江都区2025年高标准...	高标准农田新建与改造...	江苏省扬州市江都区农...	34836	28486	2025年...	农计财...	2024-12...	--	已锁定

完成信息项目审核和“监督管理”表中的省级日常监督责任人信息填写后，点击上图中的“列入储备库”按钮，即可完成项目储备入库操作。 操作路径：【储备管理】》【待储备】》【列入储备库】

01.项目申报_省级主管部门撤销已储备入库项目



中华人民共和国农业农村部

Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政务信息系统管理平台（政务管理）

农业农村投资项目管理平台

江苏省农业农村厅

常见问题

退出登录

首页

储备管理

统计查询

储备管理

储备管理流程

储备通知

待储备

已储备

项目库

本级后备库

下级后备库

项目类型：

项目名称：

储备年度：

通知标题：

通知文号：

查询

重置

下载

下级申报

批量取消储备

委托审批

自行审批

序号	☐	项目名称	项目类型	项目单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	通知标题	通知文号	评估单位	审批单位	审批类型	是否下级退回	退回原因	操作
22	☐	2025年度江苏省盐城...	高标准农田改造提升项...	江苏省盐城市射阳县农...	12925	11990	2025年...	农计财...	--	--	直接投资类	否	--	取消储备
23	☐	2025年度江苏省盐城...	高标准农田新建与改造...	江苏省盐城市射阳县农...	13674	12124	2025年...	农计财...	--	--	直接投资类	否	--	取消储备
24	☐	2025年度江苏省盐城...	高标准农田新建与改造...	盐都区楼王镇人民政府...	5350	3962	2025年...	农计财...	--	--	直接投资类	否	--	取消储备

操作路径：【储备管理】》【已储备】》【取消储备】》/【批量取消储备】
可将已储备入库尚未立项批复的项目从已储备项目中撤回至待储备项目状态。

01.项目申报_注意事项

项目储备审核注意事项


①

- 1.按时在平台中完成项目申报、入库储备、立项批复。
- 2.可研报告或实施方案等相关附件要上传平台。
- 3.项目申报前，要到国家发展改革委在线监管平台申请项目代码并填入农业农村投资项目管理平台。
- 4.项目法人、日常监管单位名称，项目法人代表、日常监管单位责任人姓名和手机号必须填写，且项目法人代表和项目日常监管责任人、项目法人代表和项目责任人不能为同一人。
- 5.续下投资项目不用重新申报。

②

- 6.项目建设内容需填写明细情况。
- 7.项目总投资、资金来源（中央资金、地方配套、自筹资金等）必需正确填写，且不允许有小数。
- 8.项目名称必需规范有辨识度，并与项目申报公文名称一致，如**省**区/县**年***建设项目。
- 9.根据项目申报指南选择正确的项目类型。
- 10.部里计划下达后，项目计划需调整的，应及时和部里沟通报备，并及时在平台中录入批复调换的项目。

02.项目立项批复_立项审核流程

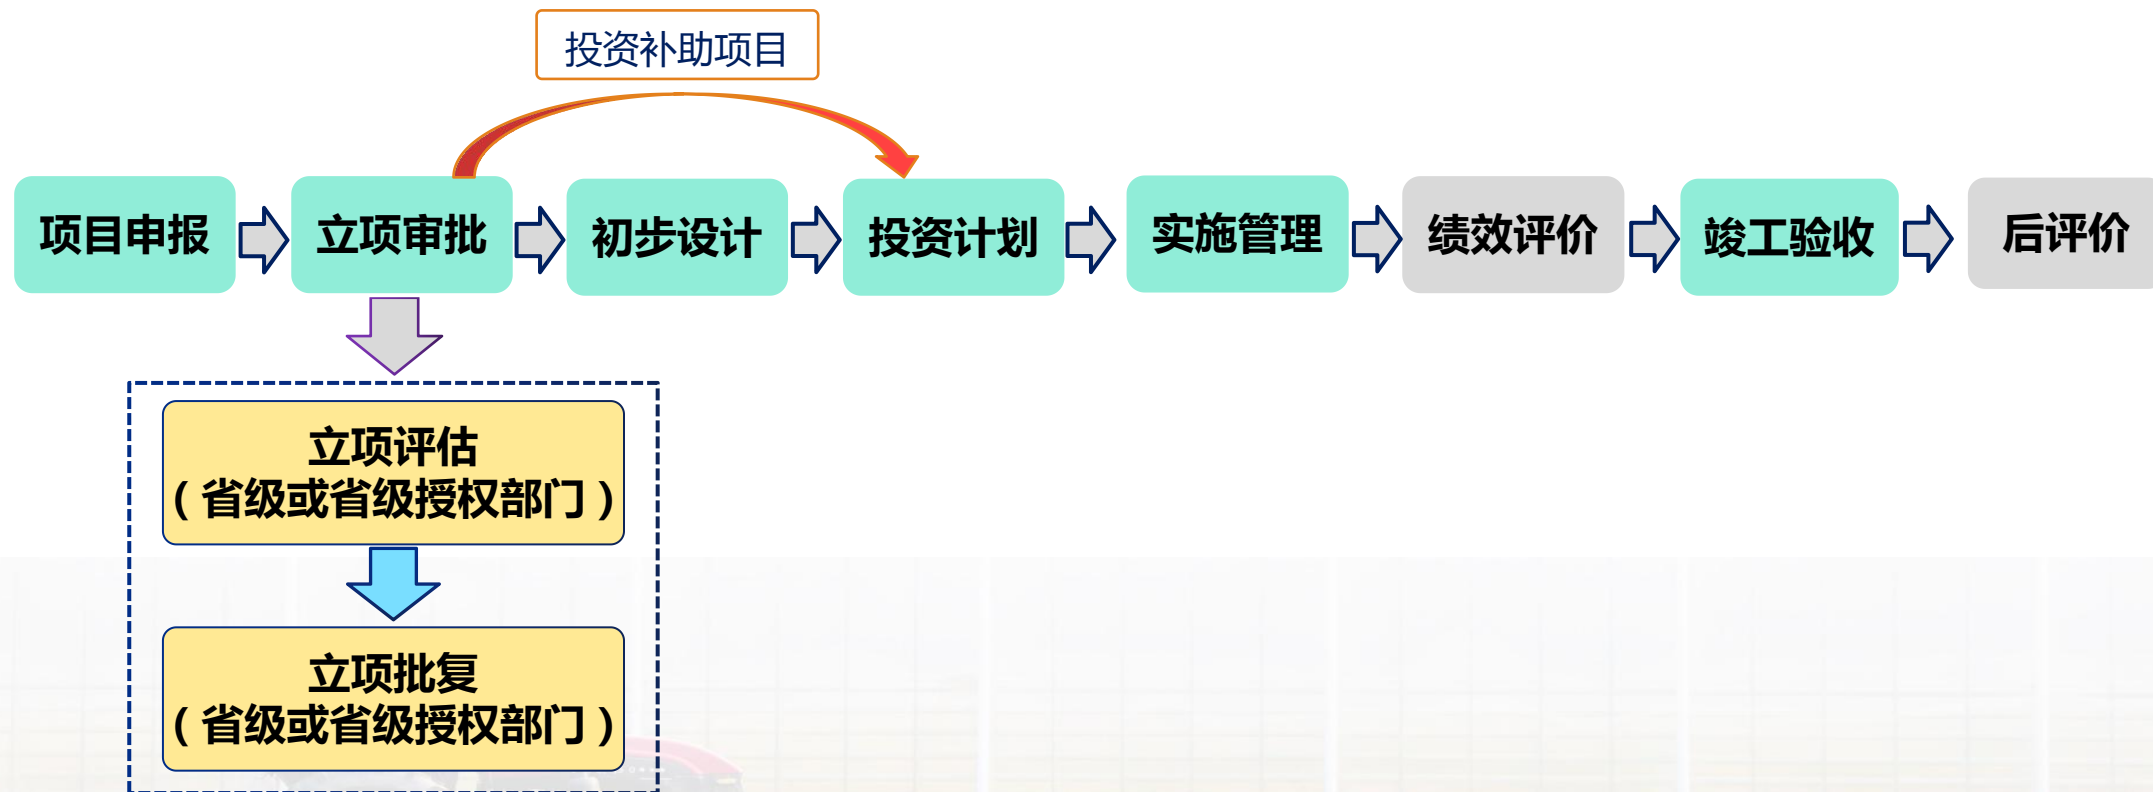

02.项目立项批复_省级主管部门委托行业处室或市级主管部门批复项目

中华人民共和国农业农村部
Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政务信息系统管理平台（政务管理）

农业农村投资项目管理平台

甘肃省农业农村厅

常见问题

退出登录

首页

储备管理

统计查询

储备管理

储备管理流程

储备通知

待储备

已储备

项目库

本级后备库

下级后备库

第一步

项目类型：

项目名称：

储备年度：

通知标题：

通知文号：

查询

重置

下载

第二步

下级申报

序号	☐	项目名称	项目类
1	☐	舟曲县长江上游生物多...	长江生物多样
2	☐	碌曲县长江流域生物多...	长江生物多样
3	☐	民乐县2025 年油菜良...	农作物良种工
4	☐	陇南市重点水域水生生...	长江生物多样
5	☒	2025年甘肃省天祝县...	重点流域农业
6	☐	2025年甘肃省农业环...	农作物良种工

第五步：选择项目是：委托下级单位审批（市级部门）还是委托省级部门行业处室审批。

委托审批

请选择委托方式：

下级单位审批

下级单位审批

行业处室审批

下级单位审批指该项行业部门审批指该项行业处室审批

点击确认后，请在审批管理->未评估->委托审批中查看到您所选的项目。

确认

第四步

批量取消储备

委托审批

自行审批

通知标题	通知文号	评估单位	审批单位	审批类型	是否下级
2025年...	农计财...	--	甘肃省农业农村厅	直接投资类	否
2025年...	农计财...	--	甘肃省农业农村厅	直接投资类	否
2025年...	农计财...	--	甘肃省农业农村厅	直接投资类	否
2025年...	农计财...	--	甘肃省农业农村厅	直接投资类	否
2025年...	农计财...	--	--	投资补助类	否
2025年...	农计财...	--	甘肃省农业农村厅	投资补助类	否

操作路径：【储备管理】》【已储备】》【委托审批】

1. “行业处室审批”：省级主管部门（计财处）委托行业处室审批；

2. “下级单位审批”：省级主管部门（计财处）委托市级农业农村主管部门审批。

02.项目立项批复_省级主管部门或具有立项批复权限的主管部门自行审批项目

首页

储备管理

统计查询

储备管理

储备通知

待储备

已储备

项目库

本级后备库

下级后备库

项目类型：

项目名称：

储备年度：

通知标题：

通知文号：

查询

重置

下级申报

批量取消储备

委托审批

自行审批

序号	☐	项目名称	项目类型	项目单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	通知标题	通知文号	评估单位	审批单位
1	☒	2022年度垫江县中央...	2022年度垫江县中央预算内高标准农田建设项目	重庆市垫江县农业农村...	4500	3209	2022-2...	农计财...	--	--
2	☐	重庆市万州区国家农作...	农作物良种工程	重庆三峡农业科学院	2639	2111	2022-2...	农计财...	--	重庆市农业农村...
3	☐	重庆镇阳农牧科技有限...	生猪规模化养殖场建设...	重庆镇阳农牧科技有限...	299.99	80	生猪规...	无	--	重庆市农业农村...
4	☐	重庆市江津区“四大家...	水产良种	重庆江洲渔业有限公司	1115	1000	2022-2...	农计财...	--	重庆市农业农村...

操作路径：【储备管理】》【已储备】》【自行审批】；建议选择：自行审批！

选择“自行审批”后，项目流转至【建设项目】/【立项审批】/【立项评估】模块的“未评估”菜单，等待进行立项评估操作。

02.项目立项批复_省级主管部门或具有立项批复权限的主管部门退返项目

农业农村投资项目管理平台

建设项目管理系统

河北省农业农村厅

常见问题

退出登录

首页

立项审批

投资计划

初步设计

项目实施

竣工验收

监督管理

统计查询

绩效管理

立项评估

未评估

评估中

立项审批

待批复

已批复

未委托

委托单

评审退回

委托评审

项目类型：

项目名称：

储备年度：

通知标题：

储备通知文号：

查询

重置

委托评估

自行评估

序号	□	项目名称	项目类型	项目单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	评估单位	审批类别	操作
1	□	2020年度河北省石家...	中央预算内投资高标准农田建设		1500.00	1200		直接投资类	退回待储备 退回下级 退回已储备

操作路径：【建设项目】》【立项审批】》【立项评估】》【未评估】》【自行评估】

点击【自行评估】按钮后，项目流转至【待批复】模块，等待录入评估结果。

此外，平台新增了几项可减少用户操作程序的退返功能：（1）退回待储备：将项目退返至待储备状态以修改信息；（2）“退回下级”：将项目直接退返至下级单位修改信息；（3）“退回已储备”：将项目直接退返至已储备状态。

02.项目立项批复_省级主管部门或具有立项批复权限的主管部门批复项目(委托评估)

首页

立项审批

立项评估

未评估

评估中

立项审批

待批复

已批复

投资计划 初步设计 项目实施 竣工验收 监督管理 统计查询 绩效管理

未委托 委托单 评审退回 委托评审

项目类型： 项目名称： 储备年度：

通知标题： 储备通知文号：

序号	☐	项目名称	项目类型	项目单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	评估单位	审批类别	操作
1	☒	2020年度河北省石家...	中央预算内投资高标准农田建设		1500.00	1200		直接投资类	退回待储备 退回下级 退回已储备

如果主管部门有专门进行项目评估的咨询服务机构，可选择“委托评估”，评估机构须先在平台中完成注册，此处不赘述！建议采取自行评估方式。

创建委托单

委托单位：

* 委托业务：

* 评审内容：

* 任务标题：

* 委托批次：

* 工作时间：☐ 1周 ☐ 2周 ☐ 20天 ☐ 30天 ☐ 35天 ☐ 60天 ☐ 90天 ☒ 特殊时间约定

* 工作内容：

委托备注：

* 选择项目：

操作路径：【建设项目】》

【立项审批】》【立项评估】》

【未评估】》【委托评估】

02.项目立项批复_省级主管部门或具有立项批复权限的主管部门批复项目

首页

立项审批

投资计划

初步设计

项目实施

竣工验收

监督管理

统计查询

绩效管理

立项评估

未评估

评估中

立项审批

待批复

已批复

河北省农业农村厅

常见问题

退出登录

自行审批

委托审批

项目类型：

项目名称：

储备年度：

通知标题：

储备通知文号：

查询

重置

放开修改

锁定

批量退回未评估

批量退回下级

批量退回待储备

批量重新评估

批量批复

录入立项批复结果

序号	项目名称	项目类型	项目单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	评估单位	评估意见	锁定状态	操作
1	2022年度平泉市农作物...	农作物良种工程	河北省承德市平泉市农业农村局	3000.00	1200	--	可行	已锁定	立项批复 退回未评估 重新评估 退回待储备 退回下级
2	邢台市任泽区蔬菜良种...	农作物良种工程	河北省邢台市任县农业农村局	2800.00	1100	--	可行	已锁定	立项批复 退回未评估 重新评估 退回待储备 退回下级
3	2021年度平泉市农作物...	农作物良种工程	河北省承德市平泉市农业农村局	7000.00	2800.00	--	可行	已锁定	立项批复 退回未评估 重新评估 退回待储备 退回下级

操作路径：【立项审批】》【立项批复】》【待批复】》【立项批复】（第一步）

此外，平台新增了几项可减少用户操作程序的退返功能：（1）退回未评估：将项目退返至“未评估”状态；（2）“重新评估”：将项目退回至评估机构重新评估；（3）“退回待储备”：将项目直接退返至待储备状态；（4）“退回下级”：将项目直接退回下一级部门进行修改。

02.项目立项批复_省级主管部门或具有立项批复权限的主管部门批复项目

51:04

项目基本信息表

1.基本信息 2.批复审核 3.招标核准 4.监督管理

批复 保存

项目建设内容投资批复审核表

一	项目名称	2020年度元氏县中央预算内投资高标准农田建设项目													
二	申报单位	农业农村部->河北省->石家庄市->元氏县 石家庄市元氏县农村农业局农业技术服务中心->石家庄市元氏县农业农村局->农业技术服务中心													
三	申报文件	关于报送2020年中央预算内投资农业项目投资计划													
四	建设性质	新建													
五	建设单位	河北省石家庄市元氏县农业农村局													
六	建设年限	1													
七	建设地点	农业农村部->河北省->石家庄市->元氏县													
八	详细建设地点	项目区位于元氏县苏阳乡、北正乡、赵同乡和黑水河乡涉及东城角村、野鹿头村、杨家寨村和黑水河村；共4个乡4个行政村													
九	主要建设内容及规模	主要建设内容：灌溉排水和节水措施、田间机耕道路、农田防护与生态环境保护保持等。建设规模1万亩。													
十	建设内容	单位	储备申报				评审结论			可研批复				备注	
			建筑形式	规模数量	单价(元)	投资估算(万元)	规模数量	单价(元)	投资(万元)	规模数量	单价(元)	投资(万元)	中央预算内建设内容		
(一)	建安工程					0.00			0.00			0.00			添加
1				0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
(二)	田间工程					1204.47			0.00			1204.47			添加
1	灌溉排水和节水措施	亩	其他	10000	576.65	576.65				10000	576.65	576.65			
2	田间机耕道路	平方米	水泥路	48721	128.86	627.82				48721	128.86	627.82			

操作路径：【立项审批】》【立项批复】》【待批复】》【立项批复】（第二步：填写项目建设内容批复审核表）

02.项目立项批复_省级主管部门或具有立项批复权限的主管部门批复项目

十三	总投资	3000.00		3000.00	3000.00		
十四	资金来源	*中央预算内投资	1200	1200	1200	比例(%)	40.00
		*地方配套投资	0	0	0	比例(%)	0.00
		*自有资金	1800	1800	1800	比例(%)	60.00
		*其他资金	0	0	0	比例(%)	0.00
十五	三年滚动计划	资金来源					
		总投资	中央预算内投资	地方政府投资	项目单位自筹资金		
可研申报							
第一年		3000.00	1200	0	1800		
第二年		0.00	0	0	0		
第三年		0.00	0	0	1800		

操作路径：【立项审批】》【立项批复】》【待批复】》【立项批复】（第二步：填写项目建设内容批复审核表）

注：“十四 资金来源”及“三年滚动计划”中的“中央预算内投资”“地方配套资金”“自有资金”“其他资金”中不允许填小数！！

02.项目立项批复_省级主管部门或具有立项批复权限的主管部门批复项目

保存

批复

1.基本信息

2.批复审核

3.招标核准

4.监督管理

项目招标投标事项申请表

	可研申报			评审结论			储备批复		
	招标范围	招标组织形式	招标方式	招标范围	招标组织形式	招标方式	招标范围	招标组织形式	招标方式
设计	无	无	无	无	无	无	无	无	无
建安工程	全部招标	委托招标	邀请招标	无	无	无	全部招标	委托招标	邀请招标
监理	无	无	无	无	无	无	无	无	无
主要设备	全部招标	委托招标	邀请招标	无	无	无	全部招标	委托招标	邀请招标
重要材料	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他	无	无	无	无	无	无	无	无	无

操作路径：【立项审批】》【立项批复】》【待批复】》【立项批复】（第三步：填写招标事项核准表）

02.项目立项批复_省级主管部门或具有立项批复权限的主管部门批复项目

保存批复

1.基本信息2.批复审核3.招标核准4.监督管理

项目监督管理单位情况表

建设单位名称	河北省承德市平泉市农业农村局		
项目负责人信息			
*姓名	*职务	*手机号	其他
邹立国	站长	15903144455	用户填报
日常监管直接责任单位信息（项目填报单位上级主管部门）			
*单位名称	*监管负责人姓名	*监管负责人职务	*监管负责人手机号
河北省承德市农业农村局	霍宗全	种子管理站站长	13903144129
省级日常监管负责人信息			
*单位名称	*监管负责人姓名	*监管负责人职务	*监管负责人手机号
河北省农业农村厅种子总站	赵磊	科长	18633946688

操作路径：【立项审批】》【立项批复】》【待批复】》【立项批复】（第四步：校核监督管理单位情况表）

02.项目立项批复_省级主管部门或具有立项批复权限的主管部门批复项目

保存 批复

1.基本信息 2.批复审核 3.招标核准 4.监督管理

建设单位名称 河北

项目负责人信息

*姓名

邹立国

日常监管直接责任单位信息 (项目填报单位上级主管部门)

*单位名称

河北省承德市农业农村局

省级日常监管负责人信息

*单位名称

项目批复

批复文件名称:

批复文号:

批复时间:

批复建设年限: 自投资计划下达之日起 1 年

批复文件 选择文件

文件名称	文件类型	文件大小	操作
确认			

其他

用户填报

*监管负责人手机号

13903144129

*监管负责人手机号

操作路径：【立项审批】》【立项批复】》【待批复】》【立项批复】（第五步：录入批复文件名称、批复文号、批复时间、批复建设年限，并上传批复文后点击“确认”按钮）

02.项目立项批复_取消批复功能

首页

立项审批

投资计划

初步设计

项目实施

竣工验收

监督管理

统计查询

绩效管理

立项评估

未评估

评估中

立项批复

待批复

已批复

重庆市农业农村委员会

常见问题

退出登录

建设项目管理系统

自行审批 委托审批

项目类型：

项目名称：

储备年度：

查询

重置

序号	☐	项目名称	项目类型	项目单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	评估单位	评估意见	是否与计划下达投资相同	操作
1	☐	重庆市万州区国家农作...	重庆市万州区国家农作物品种测试评价站	重庆三峡农业科学院	2639.00	2111	--	可行	否	修改批复 取消批复
2	☐	重庆镇阳农牧科技有限...	生猪规模化养殖场建设补助	重庆镇阳农牧科技有限公司	300.00	80	--	可行	否	修改批复 取消批复
3	☐	石柱县长江生物多样性...	长江生物多样性保护工程建设	重庆市石柱土家族自治县农村委员会	1760.00	1056	--	可行	否	修改批复 取消批复
4	☐	北碚区长江生物多样性...	长江生物多样性保护工程建设	重庆市北碚区农村委员会	170	102	--	可行	否	修改批复 取消批复

取消批复：可将尚未编制或下达投资计划项目批复撤销退返至“待批复”状态，已下达过投资计划的项目禁止进行“取消批复”操作！

操作路径：【立项审批】》【立项批复】》【已批复】》【取消批复】

02.项目立项批复_修改批复功能

首页

立项审批

立项评估

未评估

评估中

立项审批

待批复

已批复

投资计划 初步设计 项目实施 竣工验收 监督管理 统计查询 绩效管理

重庆市农业农村委员会

常见问题

退出登录

自行审批 委托审批

项目类型：

项目名称：

储备年度：

查询 重置

序号	☐	项目名称	项目类型	项目单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	评估单位	评估意见	是否与计划下达投资相同	操作
1	☒	重庆市万州区国家农作...	农作物良种工程	重庆三峡农业科学院	2639.00	2111	--	可行	否	修改批复 取消批复
2	☐	重庆镇阳农牧科技有限...	生猪规模化养殖场建设补助	重庆镇阳农牧科技有限公司	300.00	80	--	可行	否	修改批复 取消批复
3	☐	石柱县长江生物多样性...	长江生物多样性保护工程建设	重庆市石柱土家族自治县农村委员会	1760.00	1056	--	可行	否	修改批复 取消批复
4	☐	北碚区长江生物多样性...	长江生物多样性保护工程建设	重庆市北碚区农村委员会	170	102	--	可行	否	修改批复 取消批复
5	☐	重庆市黔江区丹白公路...	动物保护能力提升工程	重庆市黔江区农业综合行政执法支队	55.00	45	--	可行	否	修改批复 取消批复

修改批复：对于2020年后批复的项目，可直接修改已批复项目的批复内容，具体操作同立项批复。


操作路径：【立项审批】》【立项批复】》【已批复】》【修改批复】

至此，项目储备审核、立项批复操作介绍完毕！

02.项目立项批复____注意事项

- 1.省级主管部门内部各行业处室、市级农业农村主管部门如需要批复项目，须由省级主管部门计财处账号通过委托审批功能进行授权。
- 2.各主管部门在农业农村项目管理平台中评估项目，目前建议选择自行评估的方式。
- 3.项目储备申报和主管部门审核项目进行储备入库操作时，投资类型“直资投资类”“投资补助类”不能选错。
- 4.批复项目时，应录入批复文件名称、批复文号、批复时间和批复建设年限。
- 5.批复项目时，必须上传项目批复文件扫描件。

03.项目初步设计——操作流程

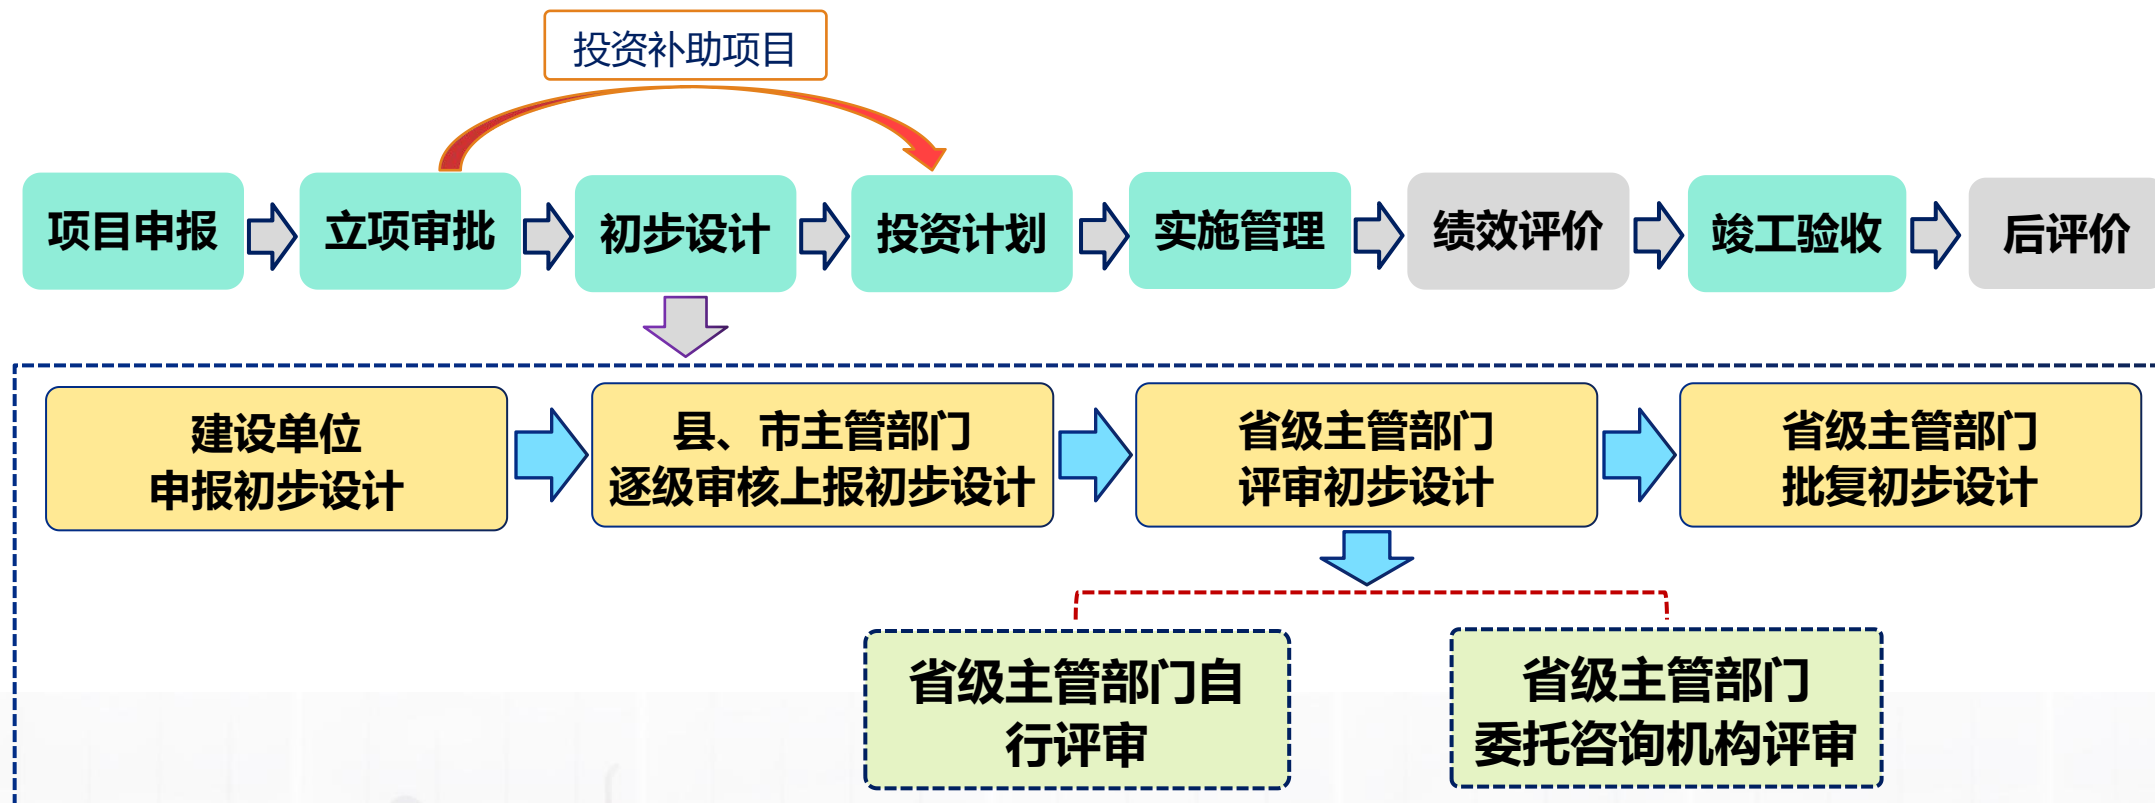

说明：平台中项目初步设计由项目批复主管部门进行评审和批复，投资补助类项目不需要做初步设计。

如果省级计财处委托行业处室或市级农业农村主管部门批复了项目，则系统自动将项目初步设计评审和批复分配给省级主管部门行业处室或市级农业农村主管部门来完成！

03.项目初步设计__省级主管部门审核初设

初步设计批复部门，在右图所示“初设审核”菜单中，点击项目名称右侧“审核”按钮，打开审核页面，对建设单位填报的初步设计信息进行审核，审核后点击“提交评审”按钮，将项目初步设计发送至右图中的“未委托”页签中进行初设评审操作。

农业农村投资项目管理平台

建设项目管理系统

重庆市农业农村委员会

常见问题

退出登录

首页

立项审批

投资计划

初步设计

项目实施

竣工验收

监督管理

统计查询

绩效管理

初设申报

初设审核

初设评审

初设批复

待审核

未委托

委托单

评审退回

项目类型：

项目名称：

项目主管单位：

查询

重置

全部

批量返回

序号	☐	项目名称	项目类型	发送单位	总投资	中央投资	状态	操作
1	☒	北碚区长江生物多样性保护工程建...	长江生物多样性保护工程建设	重庆市农业农村委员会	170	102	可研批复	审核
2	☐	巫溪县2020年高标准农田建设项目	高标准农田建设项目	重庆市农业农村委员会	4598	3678	项目完工	审核
3	☐	2021年大足区渝蓉高速公路动物...	动物保护能力提升工程	--	50.00	45	可研批复	审核
4	☐	2021年度巴南区中央预算内高标...	中央预算内投资高标准农田建设	重庆市农业农村委员会	1321.00	1057	项目开工	审核

操作路径：【建设项目】》【初步设计】》【初设审核】》【待审核】》【审核】

03.项目初步设计_省级主管部门审核初设

1.初步设计批复部门，在右图中依次审核完初步设计《仪器工具》《总体概算》《编制单位》三张报表后，点击“提交评审”，将项目发送至上一级页面中的“未委托”页签中进行评审操作。

2.点击“退返”按钮，可项目初步设计退返至申报单位。

3.主管部门初设审核页面和建设单位填报初步设计页面相同。

1.基本信息				2.仪器工具	3.总体概算	4.编制单位	保存 提交评审 退返	
项目名称	北碚区长江生物多样性保护工程建设项目			申报编码	2021-500109-016223			
申报文号	1			申报文件名称	1			
申报年份	--			申报指南名称	2021年长江生物多样性保护工程建设项目申报指南			
投资方向	长江生物多样性保护工程建设项目			行业方向	农业绿色发展			
项目类型	渔政执法能力建设			品种类型	--			
建设单位	重庆市北碚区农村委员会							
项目建设地点	重庆市->北碚区							
详细建设地点	重庆市北碚区缙云大道6号							
建设年限	1年		批复建设年限	自投资计划下达之日起1年				
建设内容	采购执法快艇1艘							
建设性质	新建			建设单位是否属于农垦系统	否			
立项年度	2021							
填报人:	重庆市北碚区农业农村委员会			填报日期:	2021-09-10			
上传附件:	选择文件 保存							

操作路径：【建设项目】》【初步设计】》【初设审核】》【待审核】》【审核】

03.项目初步设计_省级主管部门（或授权部门）评审初设

农业农村投资项目管理平台 建设项目管理系统

重庆市农业农村委员会 常见问题 退出登录

首页 立项审批 投资计划 初步设计 项目实施 竣工验收 监督管理 统计查询 绩效管理

初设申报 初设审核 初设评审 初设批复

待审核 未委托 委托单 评审退回

项目类型： 项目名称： 项目主管单位：

查询 重置

全部 委托评审 自行评审 批量退返

序号	项目名称	项目类型	发送单位	总投资	中央投资	状态
1	重庆市荣昌区国家生猪测定站建设项目	重庆市荣昌区国家生猪测定站建设项目	重庆市荣昌区国家生猪测定站	1250.00	1000	可研批复

信息

您是否自行评审所选择项目？点击确定后，请在初设批复->待批复中查看到您所选择的项目。

确定 取消

1.批量退返：可将选中的多个项目初步设计退返至下一级单位；

2.委托评审：可将项目初步设计委托给评审机构进行评审。

3.自行评审：将项目发送至“初设批复”菜单中的“待批复”页签中录入评审结果，进行初设批复操作。建议采取自行评审方式！！

操作路径：【建设项目】》【初步设计】》【初设审核】》【未委托】

03.项目初步设计_省级主管部门（或授权批复部门）批复初步设计

农业农村投资项目管理平台

建设项目管理系统

重庆市农业农村委员会

常见问题

退出登录

首页

立项审批

投资计划

初步设计

项目实施

竣工验收

监督管理

统计查询

绩效管理

初设申报

初设审核

初设评审

初设批复

待批复

已批复

项目类型：

项目名称：

项目主管单位：

查询

重置

全部

批量退回

序号	☐	项目名称	项目类型	发送单位	总投资	中央投资	状态	操作
1	☒	重庆市荣昌区国家生猪测定站...	畜禽良种工程	重庆市农业农村委员会	1250.00	1000	可研批复	初设批复

操作路径：【建设项目】》【初步设计】》【初设批复】》【待批复】》【初设批复】

说明：点击“初设批复”按钮，录入初设评审结果，并进行初设批复操作。

▶03.项目初步设计_省级主管部门（或授权批复部门）批复初步设计

保存

批复

1.基本信息

2.仪器工具

3.仪器核定

4.概算批复

项目仪器及工器具核定表

序号	名称	申报情况				备注
		功能、参数及规格	数量(台/套)	单价(元)	投资(万元)	
总计			66.00	3250906.25	577.10	
一	实验室仪器设备		66.00	3250906.25	577.10	
1	全自动生产性能测定	测定系统 1.1、开放	32	70906.25	226.90	无
2	自动料线	1、料塔3个：中转料	2	110000.00	22.00	无
3	B型超声波测定仪	1、彩色B超,便携式。	1	180000.00	18.00	无
4	电子笼称	种猪个体称量器技术	2	12000.00	2.40	无

项目批复

批复文件名称：

批复文号：

批复时间：

批复建设年限：自投资计划下达之日起 1 年

确认

删除

操作路径：【建设项目】》【初步设计】》【初设批复】》【待批复】》【初设批复】

在上图中，先在《基本信息》中上传初设评审、初设批复文件等，再完成《仪器工具》和《概算批复》表填写；最后点击“批复”按钮，录入批复文件名称、批复文号、批复时间和批复建设年限后，点击“确定”完成初设批复操作。

03.项目初步设计（主管部门查看已完成初设批复项目）

农业农村投资项目管理平台

建设项目管理系统

重庆市农业农村委员会

常见问题

退出登录

首页

立项审批

投资计划

初步设计

项目实施

竣工验收

监督管理

统计查询

绩效管理

初设申报

初设审核

初设评审

初设批复

待批复

已批复

项目类型：

项目名称：

项目主管单位：

查询

重置


全部

序号	☐	项目名称	项目类型	发送单位	总投资	中央投资	状态	操作
1	☐	铜梁区2020年高标准农...	高标准农田建设项目	--	1278	1022	项目完工	进度查询
2	☐	重庆市荣昌区畜禽粪污...	畜禽粪污资源化利用整县推进	--	9103.30	4500	验收批复	进度查询
3	☐	重庆市国家重点区域畜...	畜禽良种工程	重庆市农业农村委员会	3340	2800	项目完工	进度查询

操作路径：【建设项目】》【初步设计】》【初设批复】》【已批复】

至此，初步设计申报、审批操作介绍完毕！！

04投资计划编制_操作流程

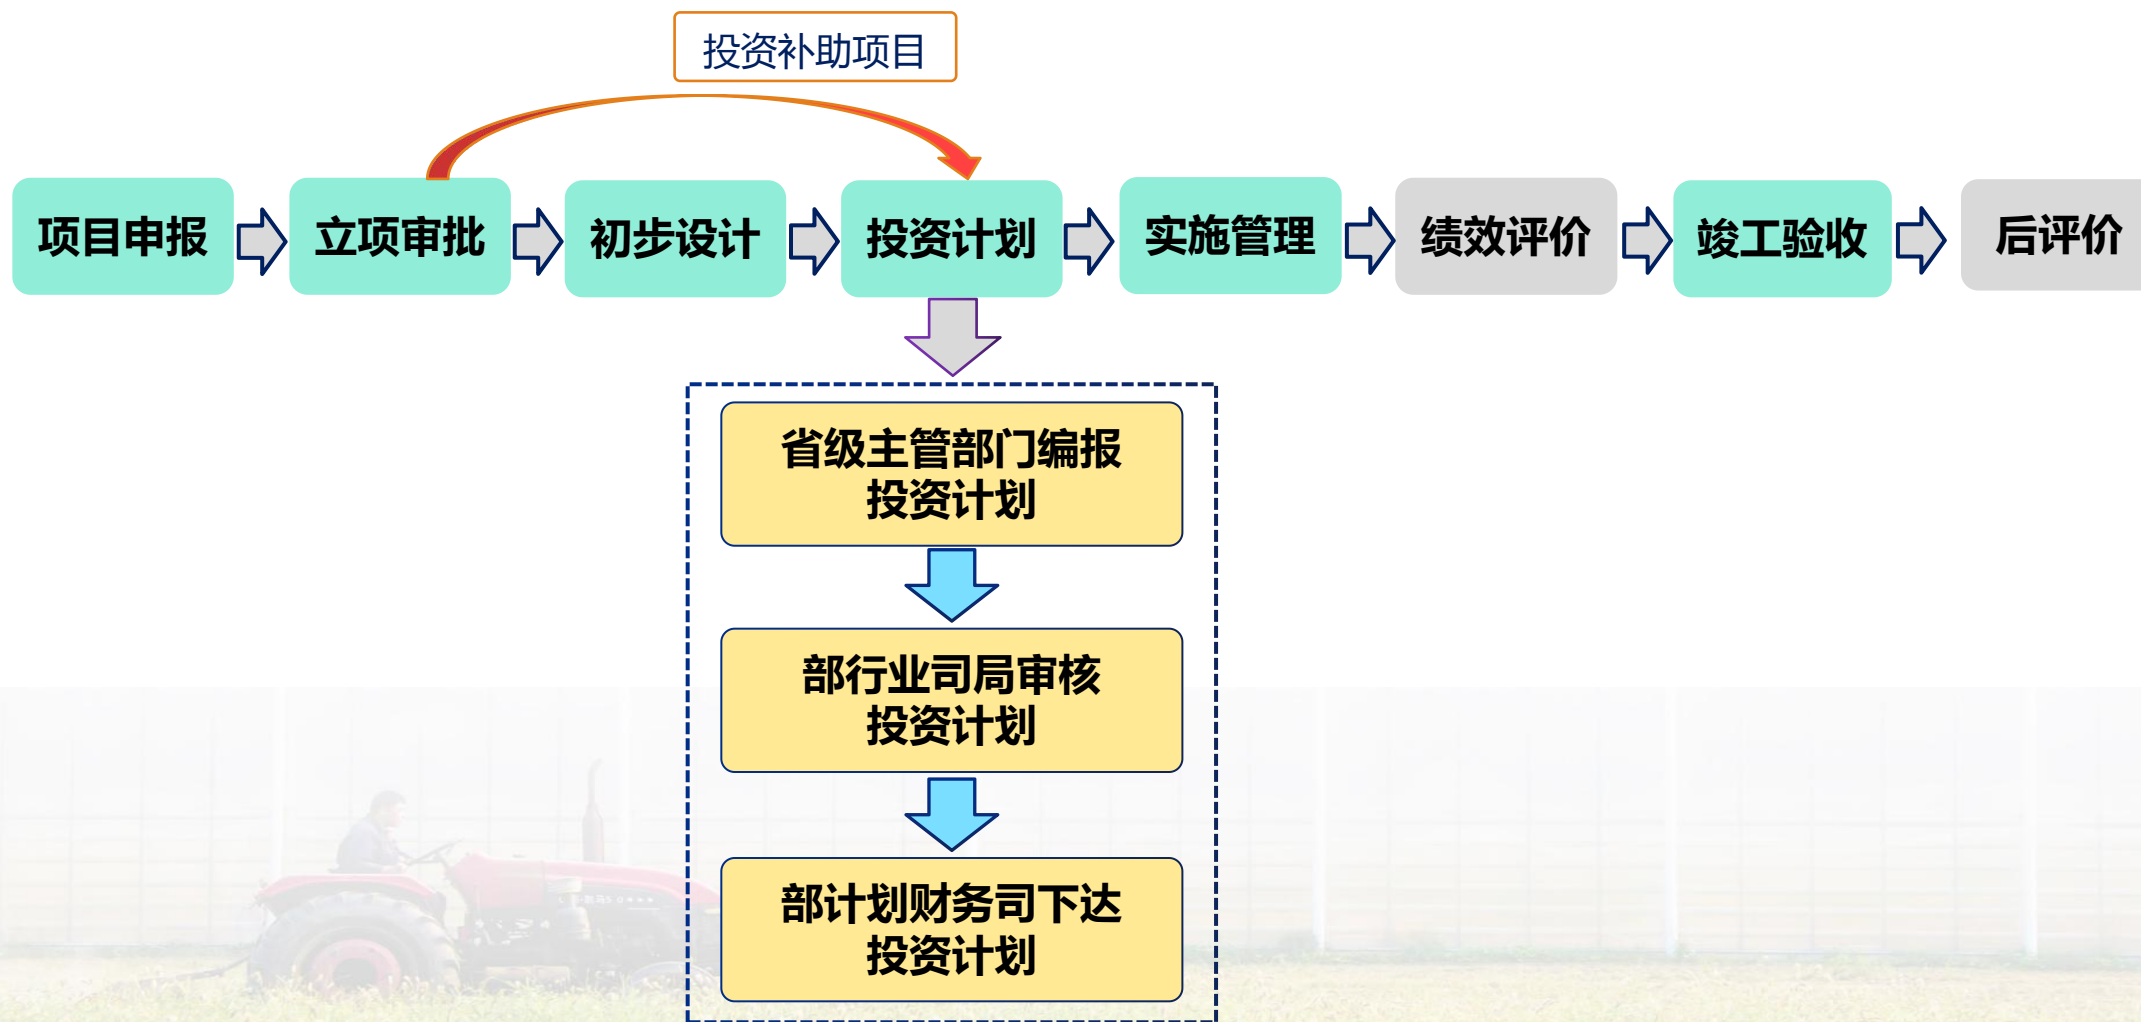

04投资计划编制__编报投资计划

投资计划编报操作要点

- (1) 投资计划编报页面自动显示允许申报投资计划的项目，在“本次申请投资”栏录入本年度拟申请的投资；不需要申请投资的多余项目，必须将“本次申请投资”栏中的各项投资数全部填为0，投资计划上报后，系统会自动将这些项目从计划中删除；
- (2) 计划未录完时，只可点“保存”按钮保存录入结果，勿点“上报投资计划”按钮；
- (3) 在确保项目投资情况全部录入完毕、审核无误后，点击“上报投资计划”按钮，将计划上报至农业农村部各行业司局。计划上报后如需修改，须向农业农村部行业司局申请退回；
- (4) 拟开工年份、拟建成年份、投资安排方式等要与分解下达的投资计划公文一致！

04投资计划编制__省级计划财务处编制投资计划

农业农村投资项目管理平台

建设项目管理系统

重庆市农业农村委员会

常见问题

退出登录

首页

立项审批

投资计划

初步设计

项目实施

竣工验收

监督管理

统计查询

绩效管理

投资管理

计划编报

计划下达

待编报

已编报

通知文号：

通知标题：

发布日期：

截止日期：

查询

重置

计划编报列表

序号	通知标题	通知文号	项目类型	发布时间	截止时间	是否行业司局退返	操作
1	东北黑土地保护建设、中央预算内投...	无	藏粮于地藏粮于技	2021-11-08	2022-06-30	否	申报
2	重点流域农业面源污染治理-国家发...	无	农业绿色发展	2021-11-08	2022-06-30	是	申报
3	农业科技创新能力条件建设-国家发...	无	藏粮于地藏粮于技	2021-11-08	2022-06-30	否	申报

操作路径：【投资计划】》【计划编报】》【申报】

进入主菜单栏中【投资计划】》【计划编报】，点击投资计划通知右侧的【申报】按钮，打开投资计划编报页面，详情见下一页截图（注意：平台中只有批复立项的项目才可编报投资计划，未立项批复项目不予编报投资计划）。

04投资计划编制_省级计划财务处编制投资计划

1.在投资计划编报页面中，须认真填写：建设规模、建设内容、拟开工年份、拟建成年份，本次申请投资，项目法人、监管部门信息等。

2.计划填报无误后，点击“上报投资计划”按钮即可完成投资计划上报。

申请投资计划

编辑投资计划金额

投资计划申请表

项目名称：

项目类型：

投资下达情况：

全部

查询

重置

1、如果您在本页面使用了查询功能，在项目上报前，请将本页面的查询条件清空，并且再次点击查询按钮，查询完毕后会显示所有待上报项目，然后点击上报。

拟开工年份	拟建成年份	投资类别	总投资 (万元)	已下达投资 (万元)	累计完成投资 (万元)	本次申请投资 (万元)	项目(法人)单位	项目责任人 (姓名、职务及电话)	日常监管直接表
2021年度垫江县龙溪河流域农业面污染源综合治理项目		合计	7595	0	0	0	重庆兴垫实业有限责任公司	周川 董事长 13996809898	重庆市垫江县农业委员会
		中央预算内投资	3850	0	0	0			
		地方预算内投资	1000	0	0	0			
		企业自有投资	2745	0	0	0			
		银行贷款	0.00	0	0	0			
2021年度大足区濑溪河流域农业面污染源综合治理试点项目		合计	5626.72	0	0	0	重庆市大足区农业生态和农村能源站	刘兴兰 站长 18108374877	重庆市大足区农业委员会
		中央预算内投资	2810	0	0	0			
		地方预算内投资	900.00	0	0	0			
		企业自有投资	0.00	0	0	0			
		银行贷款	0.00	0	0	0			

上报投资计划

保存

不需要安排投资的项目，将本次申请投资栏全部填为0即可！

04投资计划编制__查看已下达投资计划



中华人民共和国农业农村部

Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政务信息系统管理平台（政务管理）
农业农村投资项目管理平台

首页 | 储备管理 | **建设项目** | 部门预算 | 专家库 | 在线培训

快捷入口

第一步

待办事项

我的用户

我的通知

已办事项

我的项目

我的储备

我的报表

我的预警

我的绩效

通知公告 系统公告 | 储备通知

更多>>

1.关于邀请加入中国勘察设计协会农业农村分会的函

2023-05-26

2.关于举办农业建设项目管理实务培训班的通知（ ...

2023-05-25

3.关于举办2023年农业建设项目全过程管理咨询培...

2023-03-27

4.农业农村部计划财务司关于2021年度中央预算内...

2022-12-16

5.农业农村部计划财司关于2022年11月农业建设项...

2022-12-16

6.关于做好农业行业基础能力建设项目2023年中央...

2022-12-15

7.农业农村部计划财务司关于做好2023—2025年中...

2022-12-15

8.关于举办2022年度农业建设项目管理(高标准农田...

2022-10-27

04投资计划编制__查看已下达投资计划



中华人民共和国农业农村部

Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政务信息系统管理平台（政务管理）
农业农村投资项目管理平台

中国热带农业科学
院农业机械研究所

常见问题

退出登录

首页 投资计划 初步设计 项目实施 竣工验收 监督管理 统计查询

投资管理

计划下达

投资计划名称：


投资计划文号：

查询 重置

第二步

序号	投资计划名称	下达中央投资	计划下达时间	投资计划文号	投资计划状态
1	2020年部直属单位和中央所属高校投资计划	434854	2020-10-20	农办计财[2020]42	查看投资计划
2	农业农村部关于下达2019年部门自身建设项目中央预算内投...	692460	2019-03-02	农计财发[2019]*号	查看投资计划
3	2018年部门自身建设项目中央预算内投资计划	726373	2018-01-17	农计发【2018】号	查看投资计划
4	2017年部门自身建设项目中央预算内投资计划	735443	2017-02-14	农计发【2017】*号	查看投资计划

05项目实施调度_工作流程

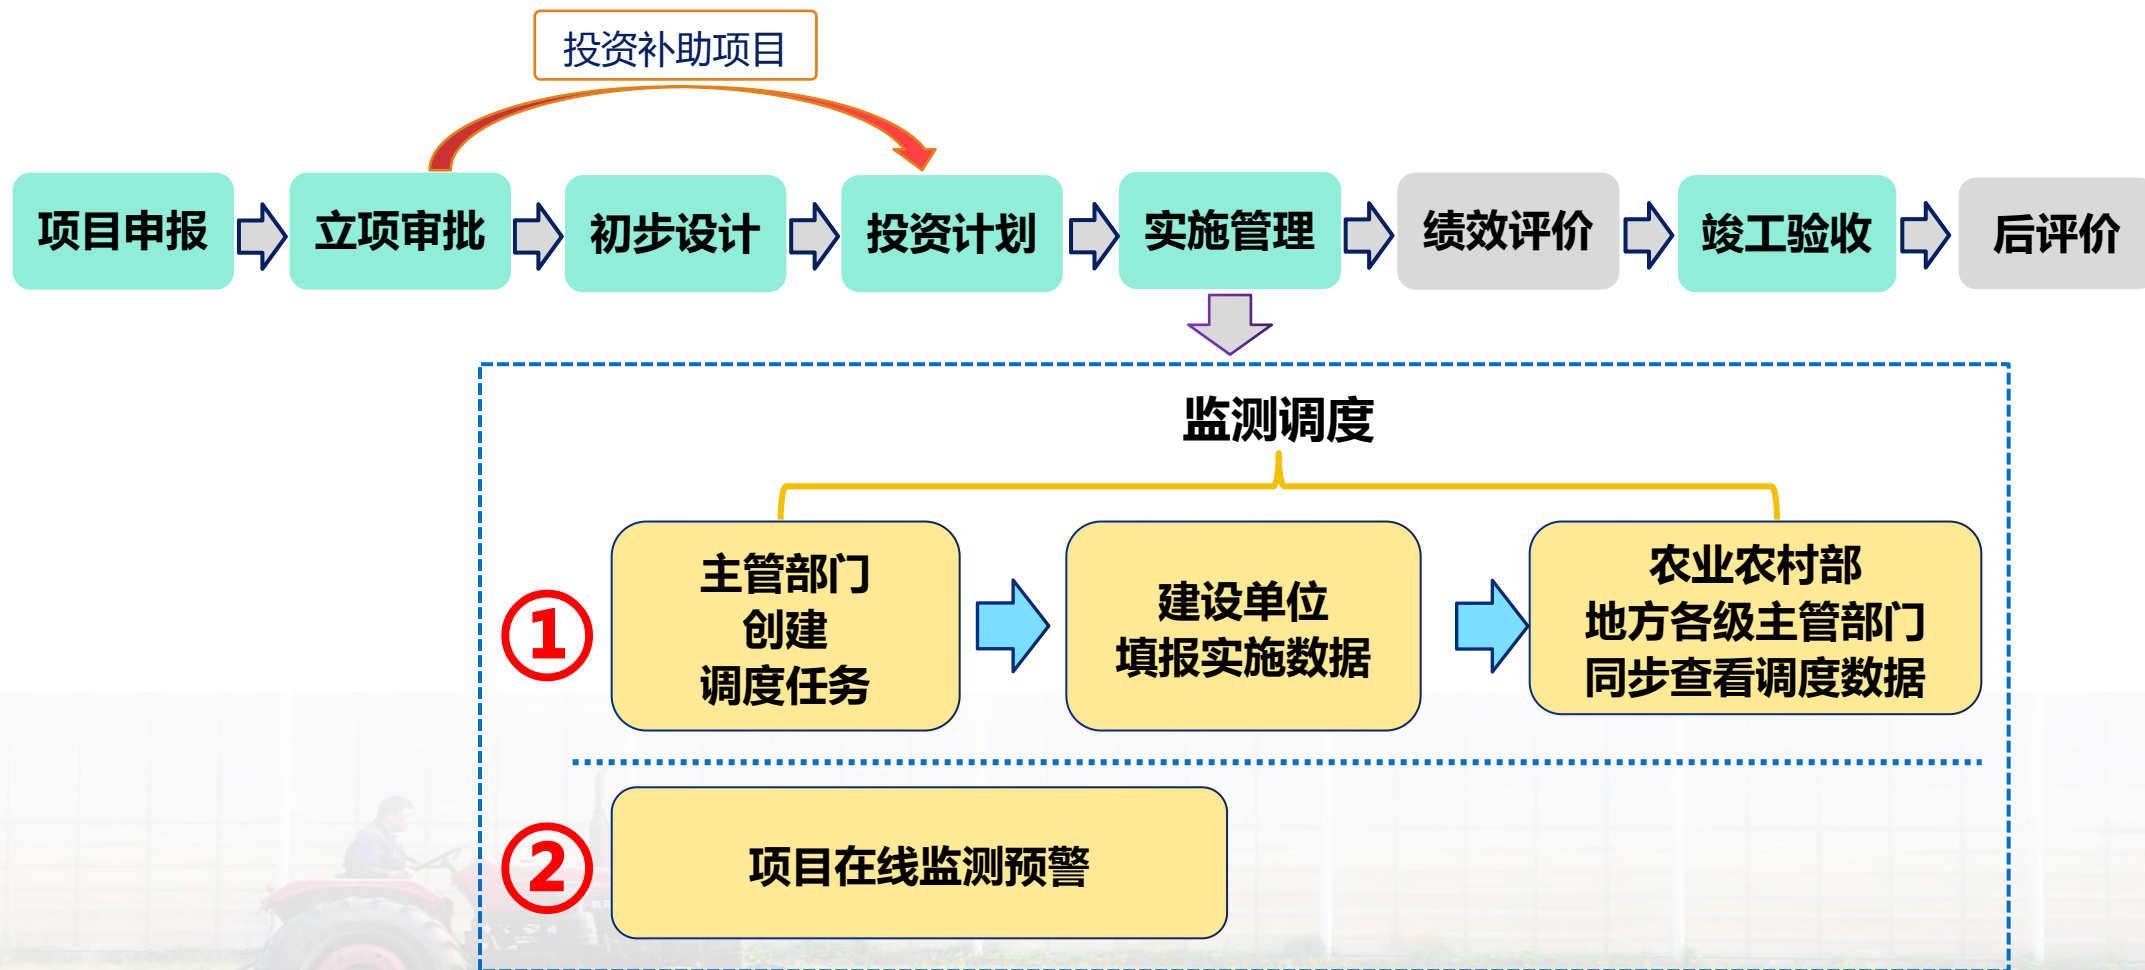

05项目实施调度_农业农村部发布调度任务

**中华人民共和国农业农村部**
Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政务信息系统管理平台（政务管理）
农业农村投资项目管理平台


常见问题 退出登录

首页 立项审批 投资计划 初步设计 项目实施 竣工验收 **监督管理** 统计查询 绩效管理

预警项目

日常调度

重点督查

日常调度 本月调度项目

调度任务标题：

创建单位：

查询 重置

调度任务列表

创建调度任务

序号	调度任务标题	调度项目数	创建单位	操作
1	2025年05月份调度统计（2024年安排投资项目）	1272	计财司建设项目处	查看 下载
2	2025年05月份调度统计（2023年安排投资项目）	1648	计财司建设项目处	查看 下载
3	2025年05月份调度统计（2022年安排投资项目）	1540	计财司建设项目处	查看 下载

操作路径：【建设项目】》【监督管理】》【日常调度】》【创建调度任务】

说明：项目在平台中下达投资计划后，才可填报实施调度信息。

05项目实施调度（地方各级主管部门查看被调度项目）

**中华人民共和国农业农村部**
Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政务信息系统管理平台（政务管理）
农业农村投资项目管理平台

广西壮族自治区农业农村厅

常见问题

退出登录

首页 立项审批 投资计划 初步设计 项目实施 竣工验收 监督管理 统计查询 绩效管理

预警项目

日常调度

重点督查

日常调度

本月调度项目

项目名称：

主管单位：

调度单位：

投资计划时间段：

上报情况：

建设进度：

调度数据修正:调度资金问题需要填写项目实施计划执行表，存在问题解决方案与总体形象进度描述需要填写项目实施建设进度表填写

查询 重置

调度项目列表（本月调度项目96个）

导出

序号		项目名称	上报时间	调度单位	预警类型	主管单位	项目类型
1	●	广西灵山县国家数字畜...	未上报	广西壮族自治区农业农村厅,计财司建设项目处	超批复建设年限未完工	广西壮族自治区农业农村厅	国家数字农业创新应用基
2		2024年度融安县高标...	未上报	计财司建设项目处		广西壮族自治区农业农村厅	高标准农田新建与改造提升项目-
3		广西壮族自治区来宾市...	未上报	广西壮族自治区农业农村厅,计财司建设项目处		广西壮族自治区农业农村厅	畜禽粪污资源化利用整县推进
4		广西壮族自治区来宾市...	未上报	计财司建设项目处		广西壮族自治区农业农村厅	畜禽粪污资源化利用整县推进

操作路径：【建设项目】》【监督管理】》【日常调度】》【本月调度项目】

说明：1、每月25日前，建设单位应完成调度项目数据报送！！

2、部、省、市、县各级主管部门可在此查看辖区内被调度项目数据报送情况。

05项目实施调度_地方各级部门查看辖区被预警项目

预警项目情况

计划财务司每月初通过项目管理平台，对未按时开工（下达第一次投资计划六个月内未开工）、资金支付率低（中央投资到位一年支付率不足50%）、资金长期闲置（中央投资到位超两年未支付）、资金沉淀（项目已竣工验收但中央投资未全部支付）、超批复建设年限未完工等问题项目进行预警。

**中华人民共和国农业农村部**
Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政务信息系统管理平台（政务管理）
农业农村投资项目管理平台

内蒙古自治区农
林厅

常见问题 退出登录

首页 立项审批 投资计划 初步设计 项目实施 竣工验收 监督管理 统计查询 绩效管理

预警项目

日常调度
重点督查

预警项目

项目名称：

投资计划年
度：

预警类型：

预警级别：

调度项目列表

序号	项目名称	项目类型	预警类型	预警级别	预警时间	投
1	2022年度内蒙古自治区马铃薯育种...	育种创新	资金支付率低(2022)	●	2023-07-13 03:00:11	投资计划年份202
2	内蒙古自治区阿拉善盟草原防火基础...	草原防火	资金长期闲置(2018)	●	2022-07-11 20:57:54	投资计划年份201
3	内蒙古自治区包头市草原防火基础设...	草原防火	资金长期闲置(2018)	●	2022-07-11 20:58:00	投资计划年份201
4	内蒙古自治区锡林郭勒盟草原防火基...	草原防火	资金支付率低(2017)	●	2022-07-11 20:58:07	投资计划年份201

操作路径：【建设项目】》【监督管理】》【预警项目】

农业农村部根据《中央预算内投资农业建设项目在线监测管理暂行办法》，按季度对预警项目进行通报。

05项目实施调度

建设单位报送实施调度数据

实施调度数据必须使用申报项目的账号才能填报！

首页

初步设计

项目实施

竣工验收

监督管理

统计查询

基建项目

未开工

在建

完工

待验收

已验收

项目类型: 请选择项目类型

项目名称: 项目名称

项目主管单位: 项目主管单位

查询

全部 / 农业农村部 / 华中农业大学

点击“数据填报”按钮填完项目实施管理报表后, 应再回到此页面点击“上报”按钮, 上报本月调度数据!

序号	项目名称	项目类型	发送单位	总投资(万元)	中央投资(万元)	项目状态	项目信息	进度查询
1	农业农村部马铃薯生物学与生物技术重点实...	专业性/区域性...	农业农村部发展...	1483	1483	完工	数据填报 上报	进度查询
2	蛋制品加工技术集成科研基地建设项目	专业性农业科学...	农业农村部发展...	1400	1400	完工	数据填报 上报	进度查询
3	农业农村部长江中下游农业装备重点实验室...	专业性/区域性...	农业农村部发展...	1679	1679	完工	数据填报 上报	进度查询
4	农业部油菜遗传育种重点实验室建设项目	专业性/区域性...	湖北省农业农村厅	1429	1429	完工	数据填报 上报	进度查询

操作路径：【建设项目】》【项目实施】》点项目名称右侧【数据填报】

1.在上图中，点击项目名称右侧的“数据填报”按钮，进入项目实施调度数据填报页面。

2.填写完实施调度数据后，务必要返回此页面，点击“上报”按钮，将实施调度数据上报主管部门。

05项目实施调度_问题项目预警

监测结果预警应用

①

1、计划财务司根据平台月度监测情况，对未按时开工、资金支付率低、资金长期闲置、超批复建设年限未完工等问题进行预警（黄色、橙色、红色），并以短信形式告知项目单位责任人和项目日常监管单位责任人。


2、计划财务司根据平台月季度监测情况，对项目开工率、资金支付率等指标，分别按项目类型、项目管理部门进行综合排序在全国范围内予以通报。

②

3、对于黄色预警超过3个月未完成整改的项目，升级为橙色预警，省级农业农村主管部门应当开展现场督导，督促建设单位限期整改。对于橙色预警超过3个月仍未完成整改的项目，升级为红色预警，计划财务司、各相关司局应当约谈省级农业农村主管部门，省级农业农村主管部门应当根据约谈要求和项目具体问题，采取调整或撤销项目、暂缓安排后续投资、一定期限内停止安排新建设农业建设项目等措施。

4、项目调度数据填报率等将被列为2023年绩效考评扣分内容。

06项目绩效评价_操作流程

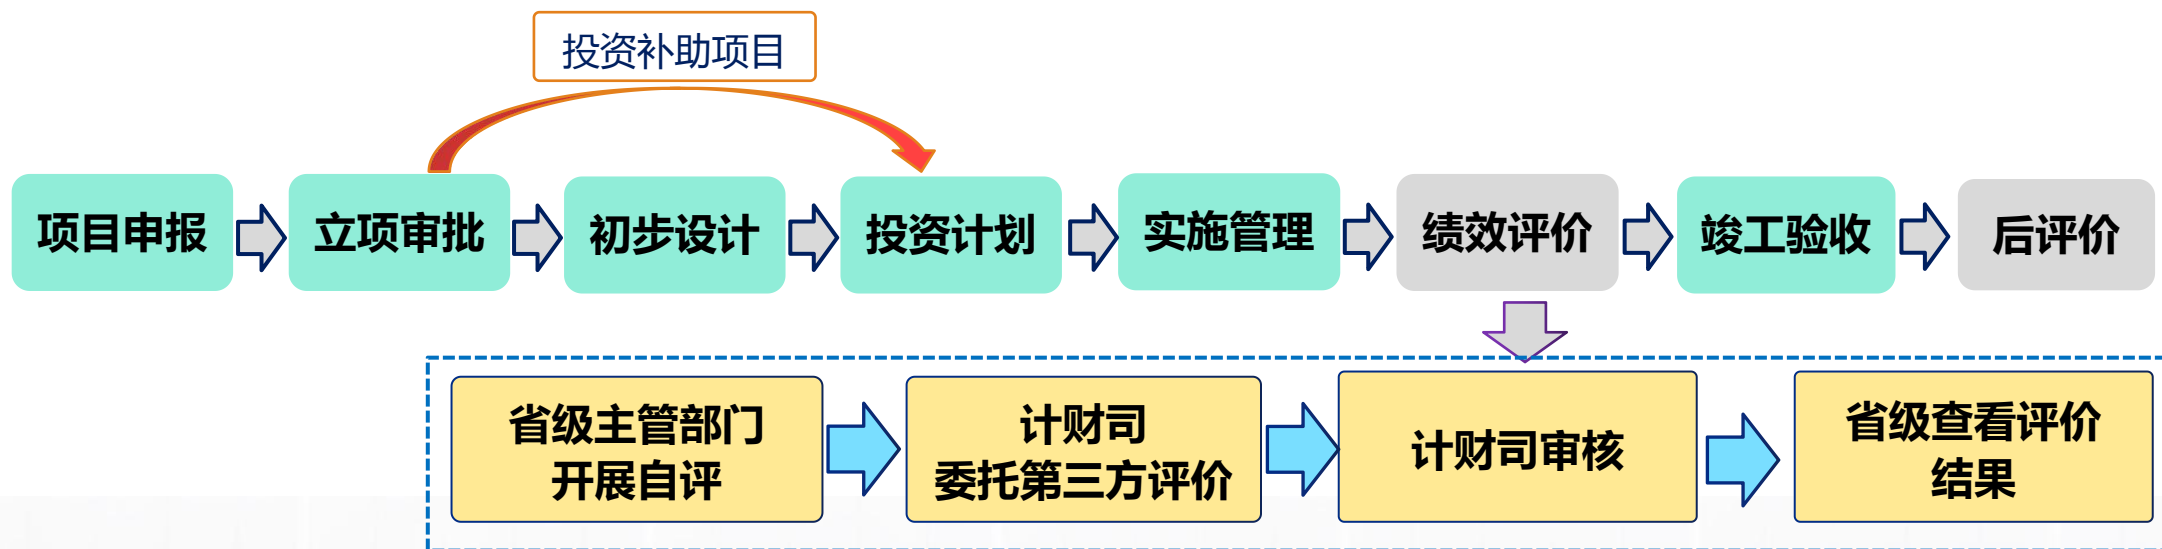

06项目绩效评价_省级主管部门操作



中华人民共和国农业农村部

Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政务信息系统管理平台（政务管理）

农业农村投资项目管理平台

 河北省农业农村厅

 常见问题

 退出登录

首页

立项审批

投资计划

初步设计

项目实施

竣工验收

监督管理

统计查询

绩效管理

监管及验收考核项目

填报中

已完成（历史）

项目监管责任落实项目清单

竣工验收情况项目清单

主管单位名称：

查询

重置

项目监管责任落实项目清单

序号	主管单位名称	项目名称	建设单位名称	投资计划文号
1	河北省农业农村厅	农业农村部华北节水农业重点实验室建设项目	河北农业大学	农计财发〔2024〕13号

06项目绩效评价_省级主管部门操作



中华人民共和国农业农村部
Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政务信息系统管理平台（政务管理）
农业农村投资项目管理平台

 青海省农业
农村厅

 常见问题

 退出登录

首页 立项审批 投资计划 初步设计 项目实施 竣工验收 监督管理 统计查询 **绩效管理**

填报中

已完成（历史）

填报中 已上报 上级退回

通知名称： 通知下达日期： 通知截止日期：

序号	通知标题	通知绩效年度	通知下发日期	开始扣分日期	到期预警	操作
1	农业农村部计划财务司关于开展2021 - 202...	2021	2023-07-21	2023-10-22		填报

操作路径：【建设项目】》【绩效管理】》【填报中】》【填报】

06项目绩效评价_省级主管部门操作

在右侧页面中填写自评得分情况，上传评价报告和佐证材料，完成上述工作后，点击上报按钮，将绩效评价情况上报农业农村部

通知年度: 2021

项目类型: 农垦公用基础设施建设,农垦天然橡...

截止日期: 2022-04-06

绩效自评报告: [选择文件](#)

[下载](#) [保存](#) [上报](#)

2020年农业建设项目延伸绩效管理考核指标表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评分	自评说明	佐证材料
决策 (10分)	项目立项 (5分)	1.项目储备	开展项目常态化储备,当年储备项目(省级储备库,下同)及投资额度不低于上年度投资计划下达项目量及投资额的120%;储备项目已完成立项审批或审核。 (1) 储备项目个数≥上年度投资计划下达项目个数的120%,得1分;每少10%扣0.2分,不足10%按10%计,扣完为止;未储备项目不得分。 (2) 储备项目投资额度≥上年度投资计划下达投资额度的120%,得1分;每少10%扣0.2分,不足10%按10%计,扣完为止;未储备项目不得分。 (3) 储备项目均已完成立项审批或审核,得1分;未全部完成立项审批或审核的,按已完成立项审批或审核项目所占比例折算得分。	3	0	系统自动评分。	
		2.立项审批(审核)	立项审批或审核前经过专家论证评审;审批或审核的建设内容、建设标准、投资规模、建设主体、建设地点、资金来源等内容明确;立项审批或审核结果在本部门网站公示。 (1) 立项审批或审核经过专家论证评审,有专家论证证明材料,得0.5分,否则不得分。 (2) 立项审批或审核的各项内容明确,得1分,每有一项内容未明确扣0.2分,扣完为止;未提供相关证明材料不得分。 (3) 立项审批或审核结果在本部门网站进行公示,并提供网页截图等证明材料,得0.5分,否则不得分。	2	0	请填写自评说明!	选择文件
			制定项目个性化绩效目标;绩效目标有明确数值;绩效目标与实际建设内容紧密承接;绩效目标与投资规模相互匹配。 (1) 根据农业农村部下达的专项绩效目标表和基础性绩效指标表制			请填写自评说明!	

07 项目竣工验收_验收流程

项目竣工验收流程

验收申请



验收审核

一、验收申请

建设单位进行先进行完工操作，再进行验收申请操作。


二、验收申请审核

区/县、地市主管部门逐级审核建设单位验收申请。

三、验收审核

省、直辖市、自治区、计划单列市、直属垦区主管部门进行验收批复审核。

07 项目竣工验收_验收流程

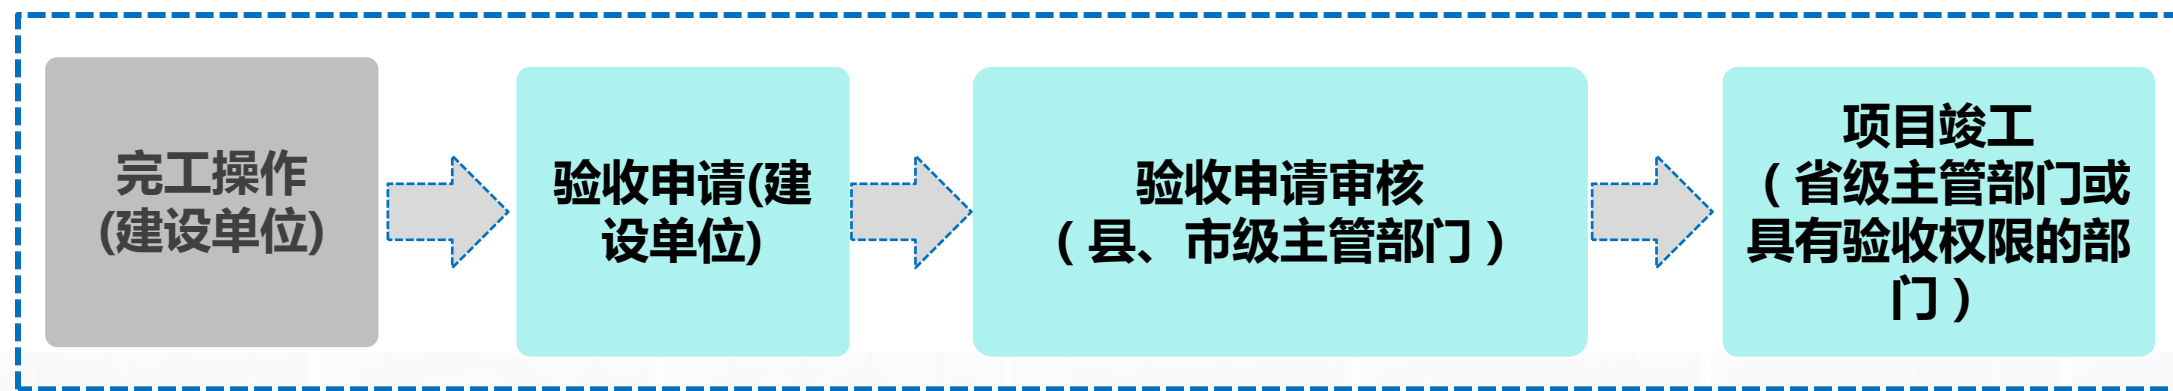

07 验收审核_验收审核

**中华人民共和国农业农村部**
Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

政务信息系统管理平台（政务管理）
农业农村投资项目管理平台

 内蒙古自治区农牧厅
 常见问题
 退出登录

首页 立项审批 投资计划 初步设计 项目实施 **竣工验收** 监督管理 统计查询 绩效管理

验收申请

验收审核

待审核 已审核

项目类型： 项目名称： 项目主管单位：

查询 重置

全部

序号	☐	项目名称	项目类型	发送单位	总投资	中央投资	状态	操作
1	☐	华明农牧业有限公司2020年生...	生猪规模化养殖场建设补助	--	220	50	验收申报	验收审核
2	☐	内蒙古自治区扎鲁特旗畜禽粪...	畜禽粪污资源化利用整县推进	--	12377	6000	项目完工	验收审核
3	☐	内蒙古海拉尔农垦谢尔塔拉农...	其他公益性设施	--	1450	1160	完成验收	验收审核
4	☐	内蒙古自治区突泉县标准粮田...	标准粮田建设项目	--	852	600	验收申报	验收审核

操作路径：【竣工验收】》【验收审核】》【验收审核】

省级或具有验收权限的主管部门在上图所示的页面中点按“验收审核”开始审核操作。

07 验收审核

操作路径：【竣工验收】》
【验收审核】

说明：1、县、市主管部门在上图所示的页面中进行验收申请审核操作，审核通过后，点击“验收审核”，将项目验收上报至上级主管部门；省级主管部门在此页面中点击“验收审核”按钮，项目在平台即完成了竣工验收操作。

2、主管部门审核和填写的七张验收表参见前页“建设单位填写验收申请5张表”表样，《验收意见》和《验收人员表》参见下页。

3、“退返”按钮可将项目退返至“验收申请”状态。

1.基本信息				2.基本情况				3.内容完成				4.管理情况				5.资金使用				6.文件管理				7.验收意见				8.验收人员				保存				验收审核				退返			
项目名称				(资金整合)辛集市2020年中央预算内高标准农田建设项目								申报编码				2020-130181-011835																											
申报文号				农计财便函〔2019〕326号								申报文件名称				农业农村部计划财务司关于报送2020年中央预算内投资农业项目投资计划的通知																											
申报年份				--								申报指南名称				高标准农田建设工程																											
投资方向				中央预算内投资高标准农田建设								行业方向				藏粮于地藏粮于技																											
项目类型				中央预算内投资高标准农田建设								品种类型				--																											
建设单位				河北省石家庄市辛集市农业农村局																																							
项目建设地点				河北省->辛集市																																							
详细建设地点				辛集市马庄乡、王口镇、天宫营乡																																							
建设年限				1年								批复建设年限				自投资计划下达之日起1年																											
建设内容				建设规模3.0万亩，水泵配套51套，井台井盖396个，防渗管道铺设572.48公里，出水口及保护装置19076个，井首装置308套，地上软管150公里，3米涵洞1个，4米涵洞2个，机耕路硬化31.425公里。																																							
建设性质				新建								建设单位是否属于农垦系统				否																											
立项年度				2020																																							
填表人：				河北省辛集市农业农村局								填报日期：				2020-09-19																											
上传附件：				选择文件								保存																															

07 项目竣工验收_验收审核

农业建设项目（初步/竣工）验收表

项目名称： _____

建设单位名称： _____

建设项目省级主管部门： _____

验收组织单位（公章）： _____

填报时间： 年 月 日

竣工验收表封面

一、项目基本情况表			
建设项目名称：			
建设单位：			
建设单位法定代表人：		电话：	
建设单位联系地址：		邮编：	
项目立项审批文号、时间：			
初步设计审批部门、文号、时间：			
是否组织初验：		项目初验时间：	
建设单位申请竣工验收时间：		竣工验收日期：	
竣工验收组织单位：		联系人：	电话：
(初步/竣工)验收组组长：		单位：	职务： 电话：

1、项目基本情况

07 项目竣工验收_验收审核

二、建设内容完成情况	
批复建设地点：	实际建设地点：
批复建设期限：	实际建设期限：
初步设计（或可研）批复的建设内容及规模：	
完成的建设内容及规模：	
未完成的建设内容及规模：	
重大变更：	
非重大变更：	
履行基本建设程序情况：	
（初步/竣工）验收组评价：	
专家签字：	

2、建设内容完成情况表

07 项目竣工验收_验收审核

三、建设项目管理情况	
初步设计	初步设计单位: 资质:
	设计范围和内容是否完整:
	设计是否规范:
	初步设计对可研批复的调整是否符合规定:
施工图设计	施工图设计单位: 资质:
	设计范围和内容是否完整:
	设计是否规范:
	施工图设计对初步设计批复的调整是否符合规定:
施工承包	土建工程单位: 资质:
	田间工程单位: 资质:
	设备安装单位: 资质:
	有无工程肢解发包、转包、违法发包问题:
建设质量	建筑工程验收评定结果:
	田间工程验收评定结果:
	设备安装与运行验收评定结果:
	竣工图完成情况:
	土建工程质量备案情况:
	土建工程是否符合规划报建程序:
	工程有无重大质量问题:



法人责任制	项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）：	
合同制	应签而未签订合同情况：	
	合同文本规范情况：	
	合同执行情况：	
招投标制	招投标制执行情况：	
监理制	监理单位：	资质：
	监理范围：	
	监理内容：	
执行法规	环保：	消防：
	劳动安全卫生：	抗震设防：
	其他国家强制性法规执行情况：	
（初步/竣工）验收组评价：		
专家签字：		

3、项目建设管理情况表

07 项目竣工验收_验收审核

4、资金使用情况表

四、资金使用情况		
立项批复情况	总投资：	中央投资： 地方配套： 自筹资金： 建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 其他：
初步设计批复	总计：	建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他：
资金到位情况	总计：	中央投资： 省财政： 地、县级财政： 自有资金： 其他（请注明）：
投资完成情况	总计：	建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他：
形成资产	固定资产： 其他资产： 核销支出：	
竣工决算审计	类型	社会中介审计： 内部审计： 政府审计部门：
	单位	资质：
	委托审计内容是否规范：	
	审计结论是否规范：	
概算调整和审批程序是否符合规定：		
财务制度建立及会计行为规范情况：		
资金单独核算、专款专用情况：		
截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：		
(初步/竣工) 验收组评价：		
专家签字：		

07 项目竣工验收_验收审核

五、项目文件管理情况		
文件类型		管理情况
项目前期产生的资料	项目立项申请报告	
	项目建议书或可研报告	
	项目立项批准文件	
	有关决议、领导讲话、会议记录	
	征用土地、拆迁、补偿等文件	
	工程地质（水文、气象）勘察报告	
	初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件	
	向地方报建的批准文件	
	仪器设备采购合同及招投标文件	
	土建发包合同、协议、招投标文件	
	规划、消防、环保、劳动等部门审核文件	
执行阶段产生的资料	开工报告（大型项目）	
	工程测量定位记录	
	图纸会审、技术交底	
	施工组织设计等	
	基础处理、基础工程施工文件材料	
	设备试运转报告	
	隐蔽工程验收记录	
	建材、仪器设备质量、试验记录	
	设备安装施工纪录	
	工程质量事故报告及处理纪录	
	分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表	
	其他	

竣工阶段产生的资料	竣工图	
	施工单位报送甲方的竣工验收申请报告	
	工程结算及审核材料	
	初验报告	
	初验会议文件、会议决定	
	竣工决算	
	竣工决算审计报告	
	工程建设总结和工作报告	
其他	竣工项目验收申请报告	
(初步/竣工)验收组对资料归档情况的评价:		
专家签字:		

5、项目文件管理情况表

07 验收审核_验收审核

注：具有项目验收权限的主管部门填写《竣工验收意见》、《参加竣工验收人员名单及签名》两张表。

七、参加（初步/竣工）验收人员名单及签名				
姓名	单位	职务、职称	电话	签名
验收组成员签字				
组长				
成员				
其他参加验收工作人员签字				

7、参加竣工验收人员名单及签名



请大家批评指正，谢谢！

<<<<<<
